



MINISTERIO DE
**OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**
PARAGUAY

PARAGUAY
**TETÁ REMBIAPO
HA MARANDU**
MOTENONDEHA

arrieva

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU N° 43898/2025

FECHA / HORA 24/10/2025 07:22:00

Datos del Documento

TITULAR: CCC S.A

Nombre y Apellido

Número Telefónico

Correo electrónico

VIA WEB

ccc@cccsa.com.py

Referencia

EJECUCION DE OBRAS - DIFICULTADES - REF: LLAMADO MOPC N° 38/2024.

Se remite a:

DIRECCION DE VIALIDAD

Procesado por: SERGIOD

Fecha: 24/10/2025

Hora: 07:22:00

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.U.

Jefe/Encargado

Dpto. Mesa de Entrada Unica

Nota N° 055

Asunción, 22 de octubre de 2025

Señor
Alejandro Bordón Bogado. Director
Dirección de Vialidad.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 38/2024 CONTRATO SG MINISTRO N° 204/2024. "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO" AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID DE LICITACIÓN N° 449.369

Asunto: Ejecución de las obras – Dificultades

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a usted, con relación a la ejecución de las obras objeto del contrato de la referencia, a fin de elevar a vuestra consideración las siguientes causales que dificultan el normal avance de ejecución de los trabajos.

- a. Mora en el pago por parte de la contratante que supera los 60 días, según detalle en anexo, situación que altera la ecuación económica - financiera del contrato, generando un perjuicio económico – financiero importante a esta contratista, afectando el normal avance de ejecución de los trabajos que genera atrasos según lo previsto en el cronograma.

Por lo expuesto precedentemente solicitamos la suspensión de la ejecución del contrato (suspensión del plazo de ejecución, según los términos de las condiciones contractuales).

- b. Atraso en el avance de los trabajos causada por la situación atípica de las continuas lluvias, exceso de humedad y condiciones del lugar. A continuación, factores que justifican el atraso:

- La ciudad de Cnel. Oviedo, se caracteriza por presentar niveles freáticos elevados y la presencia de múltiples nacientes naturales a lo largo del trazado del proyecto. Estas condiciones geotécnicas e hidrológicas particulares han incidido de manera directa en la disminución del ritmo de avance de las obras. Durante la ejecución de los trabajos en el tramo Troncal, se identificaron dos


Ing. Mauricio J. Cordero Cotas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.



Compañía de Construcciones Civiles S.A.


Manuel Domínguez 1057 - Tel. 492.913 - 202.001 - Fax: 201.042 E-MAIL: ccc@cccsa.com.py .Asunción - Paraguay

nacientes activas que aportan un caudal constante de agua subterránea hacia la zona de intervención. Esta situación se puede observar en Ilustración 1, en una excavación realizada para colocación de alcantarilla, que el nivel freático se encuentra a escasos metros del nivel superficial.



Ilustración 1 Excavación para colocación y alcantarillas Zona Troncal Prog. 0+400

- En el sector de las colectoras, el terreno se ve afectado por cauces y nacientes de agua de importancia que generan de niveles freáticos muy altos que reducen significativamente la capacidad de infiltración del suelo. Esto se puede observar en las siguientes figuras:


 Ing. Mauricio J. Cordero Cotas
 Representante Legal
 Compañía de Construcciones Civiles S.A.



Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Manuel Domínguez 1057 - Tel. 492.913 - 202.001 - Fax: 201.042 E-MAIL: ccc@cccsa.com.py .Asunción - Paraguay

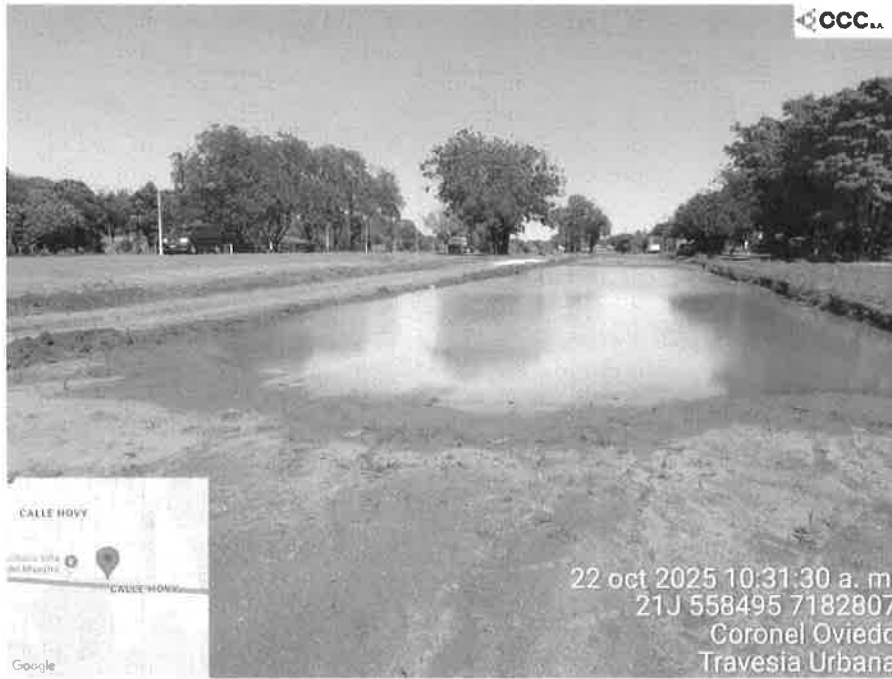


Ilustración 2 Corte para la ejecución de Paquete Estructural. Prog 2+100. Imágenes Tomadas 4 días después de la precipitación ocurrida en fecha 18-10-2025.



Ilustración 3 Corte para la ejecución de Paquete Estructural. Prog 2+150. Tomadas 4 días después de la precipitación ocurrida en fecha 18-10-2025.

Ing. Mauricio J. Cordero Coda
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.



Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Manuel Domínguez 1057 - Tel. 492.913 - 202.001 - Fax: 201.042 E-MAIL: ccc@cccsa.com.py .Asunción - Paraguay



Ilustración 4 Naciente ubicado en la Prog 3+050 Longitudinal a la calzada actual y proyectada.

- En el sector del parque lineal, existe una cantidad importante de árboles de gran tamaño que dificultan el secado del suelo.

Por lo mencionado precedentemente, incluso en periodos sin precipitaciones o con lluvias de baja intensidad, el terreno presenta niveles de humedad elevados y una condición de sobresaturación que impide la ejecución de actividades en condiciones adecuadas. En numerosos casos, la pista se encuentra no apta para trabajos de movimiento de suelo, compactación o pavimentación, prolongando los plazos de intervención y generando atrasos en el avance de los trabajos, resultando insuficiente los días de prórroga previsto según el contrato

A tal efecto solicitamos tengan a bien estudiar la consideración de los días totales sin actividad por lluvias y sus consecuencias según el registro adjunto, sin descontar los 8 días por mes previsto.

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, aprovechamos la ocasión para saludarles muy cordialmente.

Ing. Mauricio J. Cordero Códas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.
