

CORDILLERA



Wilson Leguizamón
Wilson Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.

Marco Leguizamón
Marco Leguizamón
Socio Gerente

Arq. Tania Obelar Núñez
Arq. Tania Obelar Núñez
Dip. Prof. del MOPC N° 3.664



29 may. 2025 5:03:38 p. m.
Adela Speratti
Santa Elena
Tetãvore Cordillera



19 jun 2025 15:03:53
Aguaity
Eusebio Ayala
Cordillera


Wilson Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.


Marco Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.


Arq. Yanina Obelar Núñez
Reg. Prof. del MOPC. N° 2.664



20 jun 2025 16:08:22
Santa Rosa
Isla Pucu
Cordillera
#Juan Pereira



26 jun 2025 07:34:27
Santa Rosa
Isla Pucu
Cordillera
#Juan Pereira


Wilson Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.


Marco Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.


Arq. Tania Obelgr Núñez
Reg. Prof. del MOPC. N° 2.664

CAAZAPA

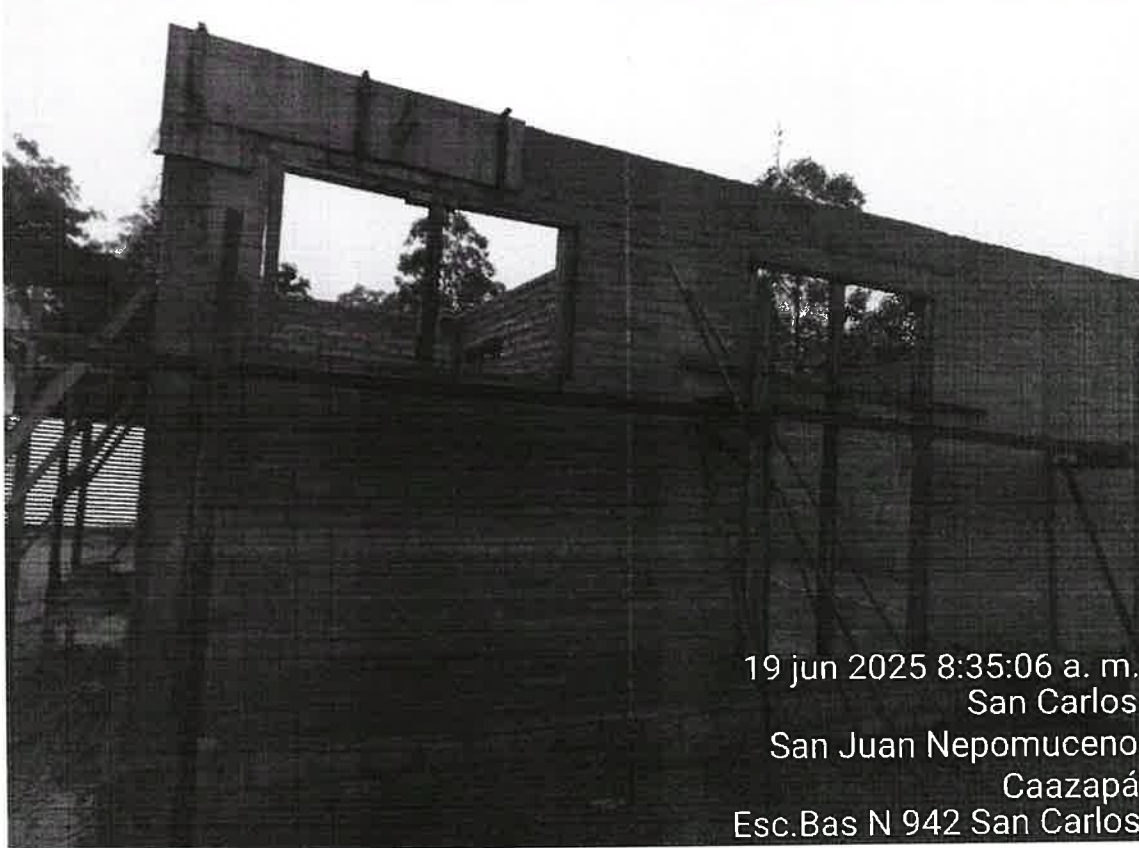


KAPITINE
HICOL
CADO

18 jun 2025 16:33:05



19 jun. 2025 11:25:09
555 Teniente Rojas Silva
Barrio Santa Teresita
Caazapá



19 jun 2025 8:35:06 a. m.
San Carlos
San Juan Nepomuceno
Caazapá
Esc.Bas N 942 San Carlos

Wilson Leguizamón

Wilson Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.

Marco Leguizamón

Marco Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.

Arq. Tania Obelar Núñez

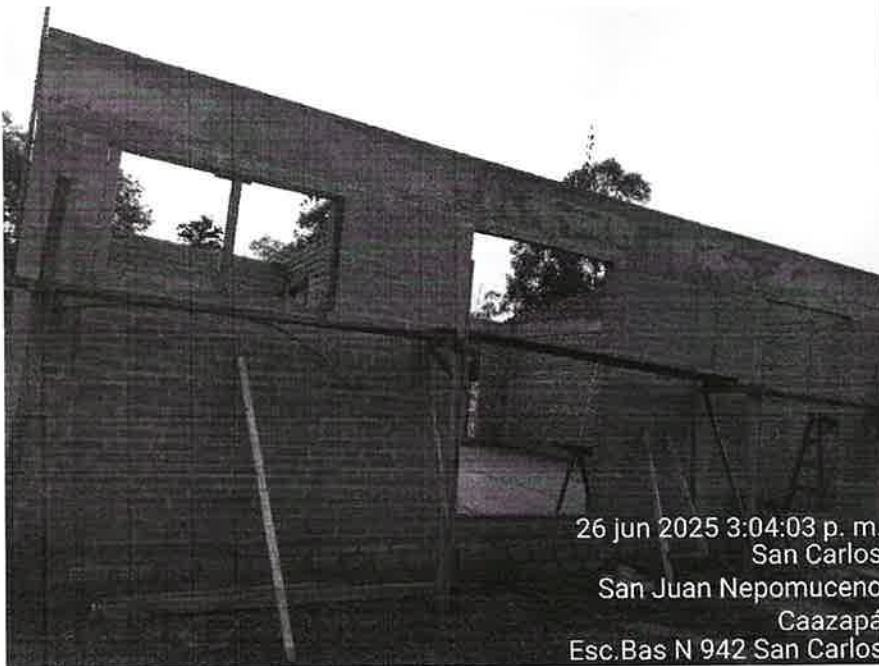
Arq. Tania Obelar Núñez
Reg. Prof. del MOPC. N° 2.664



19 jun 2025 8:33:28 a. m.
San Carlos
San Juan Nepomuceno
Caazapá
Esc.Bas N 942 San Carlos



26 jun 2025 3:03:49 p. m.
San Carlos
San Juan Nepomuceno
Caazapá
Esc.Bas N 942 San Carlos



26 jun 2025 3:04:03 p. m.
San Carlos
San Juan Nepomuceno
Caazapá
Esc.Bas N 942 San Carlos

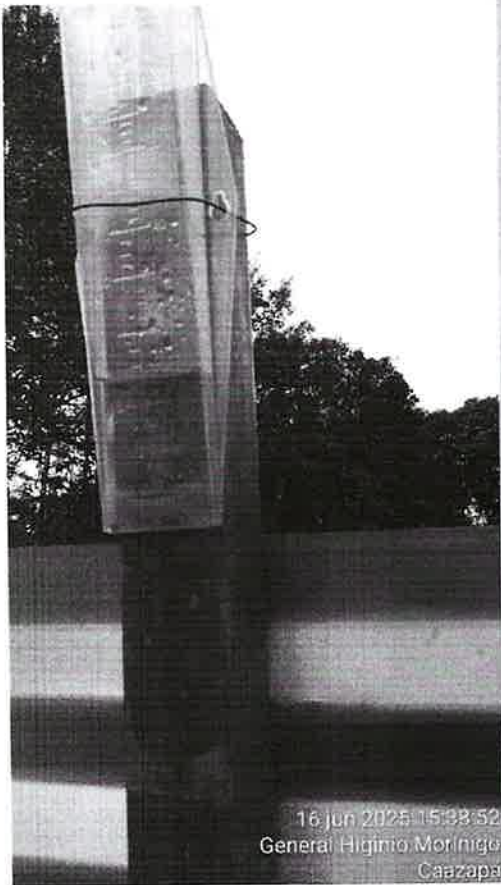
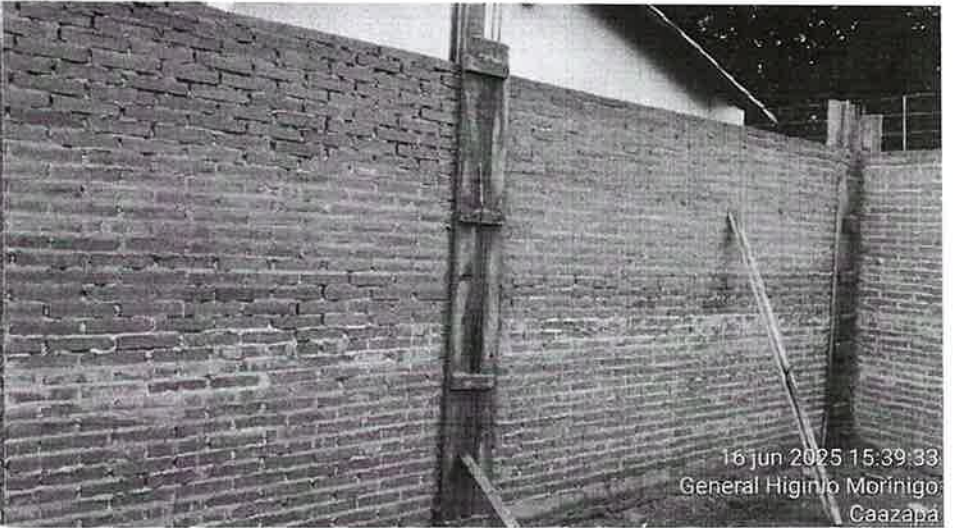
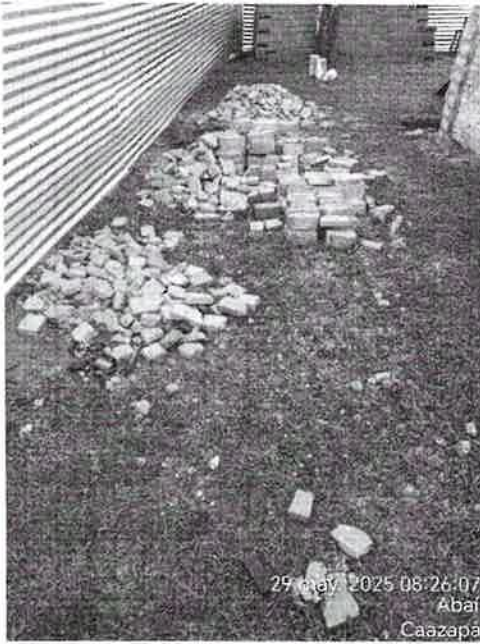


2 jun. 2025 16:39:06
Escuela Ireneo Lopez


Wilson Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.


Marco Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.


Arq. Tanya Obelar Núñez
Reg. Prof. del MOPC. N° 2.664



Wilson Leguizamón
Wilson Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.

Marco Leguizamón
Marco Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.

Arq. Tanya Obelar Núñez
Arq. Tanya Obelar Núñez
Reg. Prof. del MOPC. N° 2.664



19 jun. 2025 17:51:22
Abai
Caazapá
Escuela Irene Lopez



20 jun 2025 10:08:49
Torres Kue
Buena Vista
Caazapá


Wilson Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.


Marco Leguizamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.


Arq. Fania Obelar Núñez
Reg. Prof. del MOPC. N° 2.664

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA



26 jun 2025 07:34:27
 Santa Rosa
 Isla Pueli
 Cordillera
 #Juan Pereira



4 jun 2025 9:24:27
 Aguaity
 Eusebio Ayala
 Cordillera



4 jun 2025 9:30:04
 Aguaity
 Eusebio Ayala
 Cordillera



20 jun 2025 16:08:22
 Santa Rosa
 Isla Pueli
 Cordillera
 #Juan Pereira



20 jun 2025 17:36:14
 Aguaity
 Eusebio Ayala
 Cordillera



19 jun 2025 09:39:25
 #Juan Pereira

Arq. Tania Obelar Nuñez
 Reg. Prof. del MOPC N° 2.664

J. Pereira



26 jun. 2025 8:08:47 a. m.
Chile
Itacurubi de la Cordillera



26 jun. 2025 07:33:54
Santa Rosa
Isla Pucú
Cordillera
#Juan Pereira



1 jul. 2025 8:26:40 a. m.
Ruta Itacurubi
Santa Elena
Tetóvora Cordillera



26 jun. 2025 07:34:27
Santa Rosa
Isla Pucú
Cordillera
#Juan Pereira



26 jun. 2025 07:35:43
Santa Rosa
Isla Pucú
Cordillera
#Juan Pereira



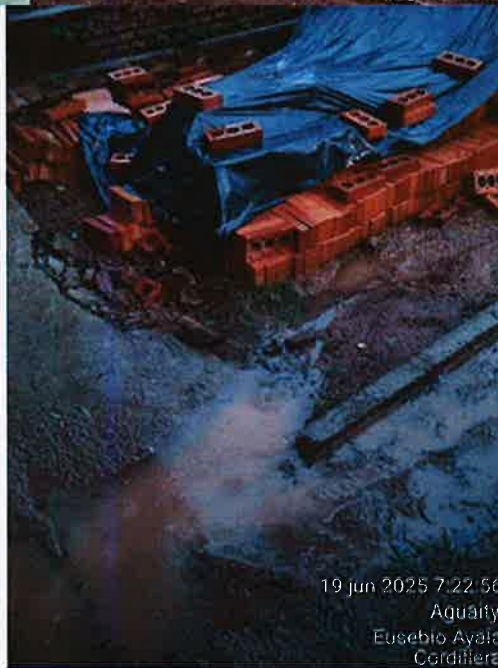
13 jun. 2025 5:41:34 p. m.
Adela Sperotti
Santa Elena
Tetóvora Cordillera



26 jun. 2025 07:33:54
Santa Rosa
Isla Pucú
Cordillera
#Juan Pereira

Arq. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664

Juan A. Pallarés M.
Arquitecto
Pat. Prof. 15.089



[Handwritten signature]

Arq. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664


[Handwritten signature]

Juan A. Pallarés M.
Arquitecto
Pat. Prof. 15.089

DEPARTAMENTO DE CAAZAPA




Juan A. Pallarés M.
Arquitecto
Pat. Prof. 15.089


Arq. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC Nº 2.664



19 jun 2025 3:06:53 p.m.
13° N
Altitud: 74.3m
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 14



16 jun. 2025 14:56:58
Abaj
Caazapá
Escuela Ireneo Lopez



20 jun 2025 10:09:01
Torres Kue
Buena Vista
Caazapá



17 jun. 2025 09:25:34
Abaj
Caazapá



17 jun. 2025 09:25:15
Abaj
Caazapá



16 jun. 2025 14:56:51
Escuela Ireneo Lopez

Juan A. Pallarós M.
Juan A. Pallarós M.
Arquitecto
Pat. Prof. 15.089

Arq. Tania Obelar Nuñez
Arq. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC Nº 2.664



19 jun. 2025 11:25:09
555 Teniente Rojas Silva
Barrio Santa Teresita
Caazapá



19 jun. 2025 11:24:50
555 Teniente Rojas Silva
Barrio Santa Teresita
Caazapá



20 jun 2025 11:11:31
75° E
General Higinio Morínigo
Caazapá
Altitud: 163.0m
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 143



19 jun 2025 3:07:10 p.m.
63° NE
Altitud: 73.2m
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 15



19 jun 2025 3:06:41 p.m.
348° E
Altitud: 163.0m
Número de índice: 13




Arq. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC Nº 2.664


Juan A. Pallarós M.
Arquitecto
Pat. Prof. 15.089



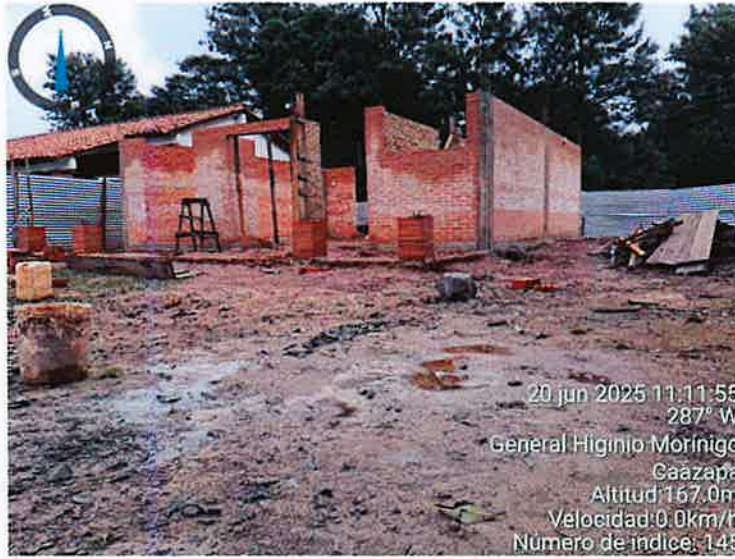
19 jun 2025 08:03 p.m.
244° W
Altitud: 156.8m
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 17



17 jun 2025 09:26:38



30 jun 2025 01:42:03



20 jun 2025 11:11:55
287° W
General Higinio Morfínigo
Caazapa
Altitud: 167.0m
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 145



20 jun 2025 11:21:53
287° W
Escuela Higinio Morfínigo
Caazapa
Altitud: 167.0m
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 145

Arg. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC Nº 2.664

Juan A. Pallarés M.
Arquitecto
Pat. Prof. 15.089



30 Jun 2025 07:28:47
iada
C6939D9



20 Jun 2025 10:09:07
Torres Kue
Buena Vista
Caazapá



19 Jun 2025 3:07:52 p.m.
69° NE
Altitud: 21.770
Velocidad: 0.00 km/h
Número de Índice: 144




20 Jun 2025 10:09:28
Torres Kue
Buena Vista
Caazapá



20 Jun 2025 11:11:43
312° NW
General Higinio Morínigo
Caazapá
Altitud: 158.0m
Velocidad: 0.0 km/h
Número de Índice: 144



20 Jun 2025 10:08:49
Torres Kue
Buena Vista
Caazapá


Arg. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664


Juan A. Pallarés M.
Arquitecto
Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/62

INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"

EMPRESA CONTRATISTA

MW INGENIERIA S.A.

LOTE

LOTE 2

DEPARTAMENTO

SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CONTRATO

N° 8/2024

FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP

SUPERVISIÓN

DÍA *lunes*

02/06/2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

No se trabajó por ser día lluvioso



CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Se suspenden los trabajos de fabricación de armaduras y la excavación de la cámara séptica y pozo.

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRASITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Arq. Tania Obelar Núñez
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664

Juan A. Pallares M.
Supervisor - Fiscalización Arquitecto
Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/65

INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"

EMPRESA CONTRATISTA

MW INGENIERIA S.A.

LOTE

LOTE 2

DEPARTAMENTO

SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CONTRATO

N° 8/2024

FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP

SUPERVISIÓN

DÍA *Jueves*

05/06/2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

No se trabajó por día de lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No se puede terminar el cargado de la viga superior.

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

[Firma]
Arq. Tania Obispo Núñez
Residente N° 2.664
Firma y sello

[Firma]
Juan A. Pallares M.
Supervisor - Fiscalización Arquitecto
Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

**LPN Nº 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094**

00/00/66

LIBRO DE OBRAS

Nº

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA Nº 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	Nº 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA <i>Viernes</i>	<i>06/06/2025</i>

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
<i>No se trabaja por incidencia de lluvia</i>	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No se puede avanzar con la carga de Hº de la viga superior.


FUERZA MAYOR

CAMINOS
INTRANSITABLES
CORTES DE RUTA
OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES


Arq. Tania Obelar Núñez
 Reg. Profesional MOPC Nº 2.664
 Firma y sello


Juan A. Pallarès M.
 Supervisor - Fiscalización Arquitecto
 Pat. Prof. 15.089
 Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/67

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Sábado 07/06/2025

CONTRATISTA: TRabajos Ejecutados/NOVEDADES	FISCAL: TRabajos Verificados/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabajó por día lluvioso ✓	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


No podemos avanzar con la carga de la viga superior.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	


 Arq. Yanis Obelar Núñez
 Residente OPC. N° 2.664
 Firma y sello


 Juan A. Pallares M.
 Supervisor - Fiscalización Arquitecto
 Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/68

INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"

EMPRESA CONTRATISTA

MW INGENIERIA S.A.

LOTE

LOTE 2

DEPARTAMENTO

SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CONTRATO

N° 8/2024

FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP

SUPERVISIÓN

DÍA Domingo

8/06/2025

CONTRATISTA:

FISCAL:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

Tenemos incidencia de lluvia de día anterior

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No podemos trabajar en la carga de la viga superior.

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES



Residente
Firma y sello

Arq. Tania Obelar Nuñez.



Supervisor - Fiscalización
Firma y sello

Juan A. Pallares M.
Arquitecto
Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

**LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094**

LIBRO DE OBRAS

N° **00/00/73**

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA <i>Viernes</i>	<i>13/06/2025</i>

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
<i>No se trabajó por día lluvioso</i>	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

<i>No se puede avanzar con la construcción de la pared sobre la viga superior.</i>	


FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	


Arq. Tania Obispo Núñez
 Reg. Prof. Residente N° 2.664
 Firma y sello


Juan A. Pallares M.
 Supervisor - Fiscalización Arquitecto
 Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
 PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
 GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/74

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Sábado
	14/06/2025

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabajó por día de lluvia en zona de obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS
Se suspenden los trabajos de mampostería sobre la viga.


FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES


 Arq. Tatiana Obelar Núñez
 Reg. Residente C. N° 2.664
 Firma y sello


 Juan A. Pallarés M.
 Arquitecto
 Supervisor - Fiscalización Prof. 15.089
 Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/75

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Domingo 13/06/2025.

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
Incidencia de lluvia en los días anteriores	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


Se suspenden los trabajos de mampostería sobre la viga superior	

FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	


Residente
Firma y sello
Arg. Tania Obelar Nuñez


Supervisor - Fiscalización Arquitecto
Firma y sello Pat. Prof. 15.089
Juan A. Pallarés M.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/80

INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"

EMPRESA CONTRATISTA

MW INGENIERIA S.A.

LOTE

LOTE 2

DEPARTAMENTO

SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CONTRATO

N° 8/2024

FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP

SUPERVISIÓN

DÍA Viernes

20/06/2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

No se trabaja por ser día de lluvia.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No se puede avanzar con la construcción de paredes sobre la viga.

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Arq. Yanina Gómez Nuñez
Residente
Reg. Prof. Firmas y sellos 2664

Juan A. Pallares M.
Supervisor - Fiscalización
Firma y sello
Arquitecto
Mat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/87

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Sábado 21/06/2025

CONTRATISTA: TRabajos Ejecutados/NOVEDADES	FISCAL: TRabajos Verificados/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabajó por ser día de lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


No se avanza con las paredes sobre la viga superior.	


FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	


 Arq. Residente Tatiana Obelar Niñez
 Reg. Prof. N° 2.664
 Firma y sello


 Juan A. Pallarés M.
 Supervisor - Fiscalización Arquitecto
 Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/82

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Domingo 22/06/2025

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
Día de lluvia en la obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


No podemos avanzar en (sobre) pared sobre la viga superior	

FUERZA MAYOR


CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	


Residente
Firma y sello

Arq. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664


Juan A. Pallares M.
Supervisor - Fiscalización Arquitecto
Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/83

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Lunes 23/06/2025

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabajó por ser día de lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Aún no pudo avanzar con los trabajos de mampostería sobre la viga superior	

FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

[Signature]
 Arq. Tania Chelín Núñez
 Residente
 Reg. Prof. N° 14664
 Firma y sello

[Signature]
 Juan A. Pailan C.S.M.
 Supervisor - Fiscalización Arquitecto
 Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/86

INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"

EMPRESA CONTRATISTA

MW INGENIERIA S.A.

LOTE

LOTE 2

DEPARTAMENTO

SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CONTRATO

N° 8/2024

FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP

SUPERVISIÓN

DÍA Jueves

26/06/2025

CONTRATISTA:

FISCAL:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

No se trabajó por ser día de lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No podemos avanzar con los trabajos de cortes y soldaduras de la estructura de techo.

FUERZA MAYOR

CAMINOS



INTRANSITABLES


CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Residente
Arq. 
Firma y sello
Reg. Prof.  C. N° 2.664


Juan A. Pallarés M.
Supervisor - Fiscalización Arquitecto
Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/88

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Sábado
	28/06/2025

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabajó por ser día lluvioso	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


No podemos avanzar con los trabajos de la estructura de techo.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	


Arq. Residente Juan A. Nuñez
Firma y sello
Reg. Prof. del MOPC. N° 2.664


Supervisor - Fiscalización Arquitecto Juan A. Pallares M.
Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444084

LIBRO DE OBRAS

N°

00/00/89

INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA BASICA N° 48 "DOCTOR VICTOR BOETTNER"

EMPRESA CONTRATISTA

MW INGENIERIA S.A.

LOTE

LOTE 2

DEPARTAMENTO

SANTA ELENA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CONTRATO

N° 8/2024

FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP

SUPERVISIÓN

DÍA Domingo

29/06/2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

Día de lluvia.

SE REALIZA EN LA FECHA EL ACTA DE MEDICION DE OBRA PARA LA CERTIFICACION.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Arq. Residente Edwin Nájera Núñez
Reg. Firma y Sello MONG. N° 2.664

Juan A. Pallares M.
Supervisor - Fiscalización Arquitecto
Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 100/00/62

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA <i>Lunes</i>	<i>02/06/2025</i>

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
<i>No se trabajó por día lluvioso</i>	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

<i>Se suspenden los trabajos de fabricación de armaduras y la excavación de la cámara óptica y pozo ciego.</i>	

FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

[Signature]
Arq. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664

Residente
Firma y sello

[Signature]
Juan A. Pallarés M.

Supervisor - Fiscalización Arquitecto
Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 100/00/64

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Miércoles 04/06/2025

CONTRATISTA: TRabajos EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRabajos VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
---	---

No se trabajó por día lluvioso

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No se puede avanzar con la cámara séptica y el pozo ciego ni culminar la carga de la viga superior

FUERZA MAYOR

CAMINOS
INTRANSITABLES
CORTES DE RUTA
OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES


Arq. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664
Residente
Firma y sello


Juan A. Pallares M.
Arquitecto
Supervisor - Fiscalización Prof. 15.089
Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/65

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/JEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA <i>Jueves</i>	<i>05/06/2025</i>

CONTRATISTA:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES
No se trabajó por día lluvioso

FISCAL:
TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No se puede terminar el cargado de la viga superior


FUERZA MAYOR

CAMINOS
INTRANSITABLES
CORTES DE RUTA
OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES


Arq. Tatiana Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664
Residente
Firma y sello


Juan A. Pallares M.
Supervisor - Fiscalización Arquitecto
Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/66

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DIA <i>viernes</i>	<i>06/06/2025</i>

CONTRATISTA:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES
No se trabaja por incidencia de lluvia

FISCAL:
TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No se puede avanzar con la carga de H₂O de la viga superior.

FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

[Firma]
Arq. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664
Residente
Firma y sello

[Firma]
Juan A. Pallares M.
Arquitecto
Supervisor - Fiscalización
Reg. Prof. 15.089
Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

**LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094**

LIBRO DE OBRAS

N° 100/00/67

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Sábado 07/06/2025

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabajó por día lluvioso	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No podemos avanzar con la carga de la viga superior	

FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRASITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	


Arq. Tania Obelar Nuñez
 Reg. Prof. del MOPC N° 2.664
 Firma y sello


Juan A. Pallares M.
 Supervisor - Fiscalización Arquitecto
 Pat. Prof. 15.089
 Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N°

00/00068

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	<i>Domingo 08/06/2025.</i>

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES
Incidencia de lluvia en obra

FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS
INTRANSITABLES
CORTES DE RUTA
OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

[Handwritten Signature]

Residente
Firma y sello
Arg. *Tania Obelar Nuñez*
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664

[Handwritten Signature]

Supervisor - Fiscalización
Firma y sello
Arg. *A. Pallarés M.*
Arquitecto
Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/73

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Viernes 13/06/2025

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabajó por día lluvioso	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


No se puede avanzar con la pared sobre la viga superior


FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	


 Residente
 Firma y sello
 Ara. Tania Obelar Nuñez


 Juan A. Pallares M.
 Arquitecto
 Supervisor - Fiscalización Prof. 15.089
 Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/74

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Sábado 14/06/2025

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabajó por día lluvioso.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


Se suspenden los trabajos de mampostería sobre viga.


FUERZA MAYOR

CAMINOS
INTRANSITABLES
CORTES DE RUTA
OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES


 Arq. Taffar Obelar Nuñez
 Reg. Prof. UEPYOPC N° 2.664


 Juan A. Pallarés M.
 Arquitecto
 Supervisor - Fiscalización Prof. 15.089
 Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N°

00/00/75

INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"

EMPRESA CONTRATISTA

MW INGENIERIA S.A.

LOTE

LOTE 2

DEPARTAMENTO

EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CONTRATO

N° 8/2024

FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP

SUPERVISIÓN

DÍA Domingo

15/06/2025.

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

Incidencia de lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No se avanza en la mampostería sobre la xiga.

FUERZA MAYOR

CAMINOS


INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES



Residente
Firma y sello



Juan A. Pallares M.
Arquitecto
Supervisor - Fiscalización Pat. Prof. 15.089
Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/79

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Jueves 19/06/2025

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
No se trabajó por ser día lluvioso	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

No se puede trabajar con las paredes sobre viga.


FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES


Residente
Arq. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664


Juan A. Pallarés M.
Supervisor - Fiscalización Arquitecto
Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/82

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA	Domingo 22/06/2025

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
Día de lluvia en la Obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


No podemos avanzar en la mampostería sobre la viga superior	


FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	


Residente
Firma y sello
Arq. Tania Obelar Nuñez


Supervisor - Fiscalización
Arquitecto
Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/86

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA <i>Jueves</i>	<i>26/06/2025</i>

CONTRATISTA:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES
NO se trabajó por ser día lluvioso

FISCAL:
TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


No podemos trabajar con los cables y soldaduras de la estructura del techo.

FUERZA MAYOR

CAMINOS	
INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES


Residente
Firma y sello
Arq. Tania Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664


Juan A. Pallarès M.
Arquitecto
Pat. Prof. 15.089
Supervisor - Fiscalización
Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/89

INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"
EMPRESA CONTRATISTA	MW INGENIERIA S.A.
LOTE	LOTE 2
DEPARTAMENTO	EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO	N° 8/2024
FISCALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP
SUPERVISIÓN	
DÍA Domingo	29/06/2025

CONTRATISTA:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES

Día de lluvia, 1

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES
SE REALIZA EN LA FECHA EL ACTA DE MEDICION DE G3R1 PARA LA CERTIFICACION.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS


FUERZA MAYOR

CAMINOS
INTRANSITABLES
CORTES DE RUTA
OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES


Arq. Yanja Obelar Nuñez
Reg. Prof. del MOPC N° 2.664
Residente
Firma y sello


Juan A. Pallares M.
Supervisor - Fiscalización Instructo
Firma y sello Pat. Prof. 15.089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2004 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID 444094

LIBRO DE OBRAS

N° 00/00/90

INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA BASICA N° 191 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"

EMPRESA CONTRATISTA

MW INGENIERIA S.A.

LOTE

LOTE 2

DEPARTAMENTO

EUSEBIO AYALA - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CONTRATO

N° 8/2024

FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/UEPP

SUPERVISIÓN

DÍA *Lunes*

30/06/2025.

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES

*No se trabaja por inafinidad
de día de lluvia.*

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Residente
Firma y sello

Juan A. Pallarés M.
Supervisor - Fiscalización Arquitecto
Firma y sello Pat. Prof. 15.089
