Adecuación De Cocina y Comedor pata La Esc. Básica N° 4617 Divino Niño Jesús- ID 476389

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

DEPARATAMENTO DE OBRAS

Inicio del proyecto: mié, 2025-11-19

Semana para mostrar: 1

ITEMS	DETALLE	PROGRESO	INICIO	FIN	DÍAS
1	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO	100%	19-11-25	20-11-25	2
2	VALLADO PERIMETRAL DE OBRA	100%	19-11-25	20-11-25	2
3	REPLANTEO Y MARCACIÓN	100%	19-11-25	19-11-25	1
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CARTEL DE OBRA 2,5 X1,5	100%	19-11-25	19-11-25	1
5	DEMOLISIÓN SIN RECUPERACIÓN DE PAREDES INTERNAS	100%	19-11-25	21-11-25	3
6	DEMOLISIÓN SIN RECUPERACIÓN DE CUBIERTAS DE CHAPA	100%	19-11-25	21-11-25	3
7	DEMOLISIÓN SIN RECUPERACIÓN DE REVESTIMIENTO DE MESA Y PARED	100%	19-11-25	21-11-25	3
8	DESTRONQUE DE ARBOL MEDIANO	100%	19-11-25	20-11-25	2
9	DESMONTE DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN GENERAL	100%	19-11-25	21-11-25	3
10	DESMONTE DE INSTALACIÓN SANITARIA	100%	19-11-25	21-11-25	3
11	EXCAVACIÓN Y CARGA PARA DADOS DE H°A° DE 40X40 CM PARA FIJACIÓN DE PILARES METALICOS	100%	22-11-25	25-11-25	4
12	PILARES METÁLICOS 20X20X0,90"X6M	100%	24-11-25	27-11-25	4
13	VIGAS METALICAS TIPO DOBLE PERFIL C, SOLDADO DE 150MM	100%	26-11-25	1-12-25	6
14	PERFIL METALICO TIPO C DE 100MM PARA ESTUCTURA TIPO TIJETA	100%	2-12-25	8-12-25	7
15	PERFIL METALICO TIPO C DE 75MM PARA CLAVADORES	100%	4-12-25	12-12-25	9
16	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA TRAPEZOIDAL N°26, SOBRE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE AISLANTE TERMICO	100%	12-12-25	17-12-25	6
17	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELORASP PVC, TIPO SIMIL MADERA PARA INTERIOR	100%	15-12-25	20-12-25	6
18	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA TERMOACUSTICA PRE PINTADA PARA EXTERIOR	100%	18-12-25	22-12-25	5
19	MUROS DE ELEVACIÓN DE 0,15M CON LADRILLO HUECO PARA REVOCAR	100%	25-11-25	2-12-25	8
20	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 ø 8 POR HILADA (2 HILADAS)	100%	29-11-25	4-12-25	6
21	CENEFA DE CHAPA N°26 CON DESARROLLO 40	100%	16-12-25	20-12-25	5

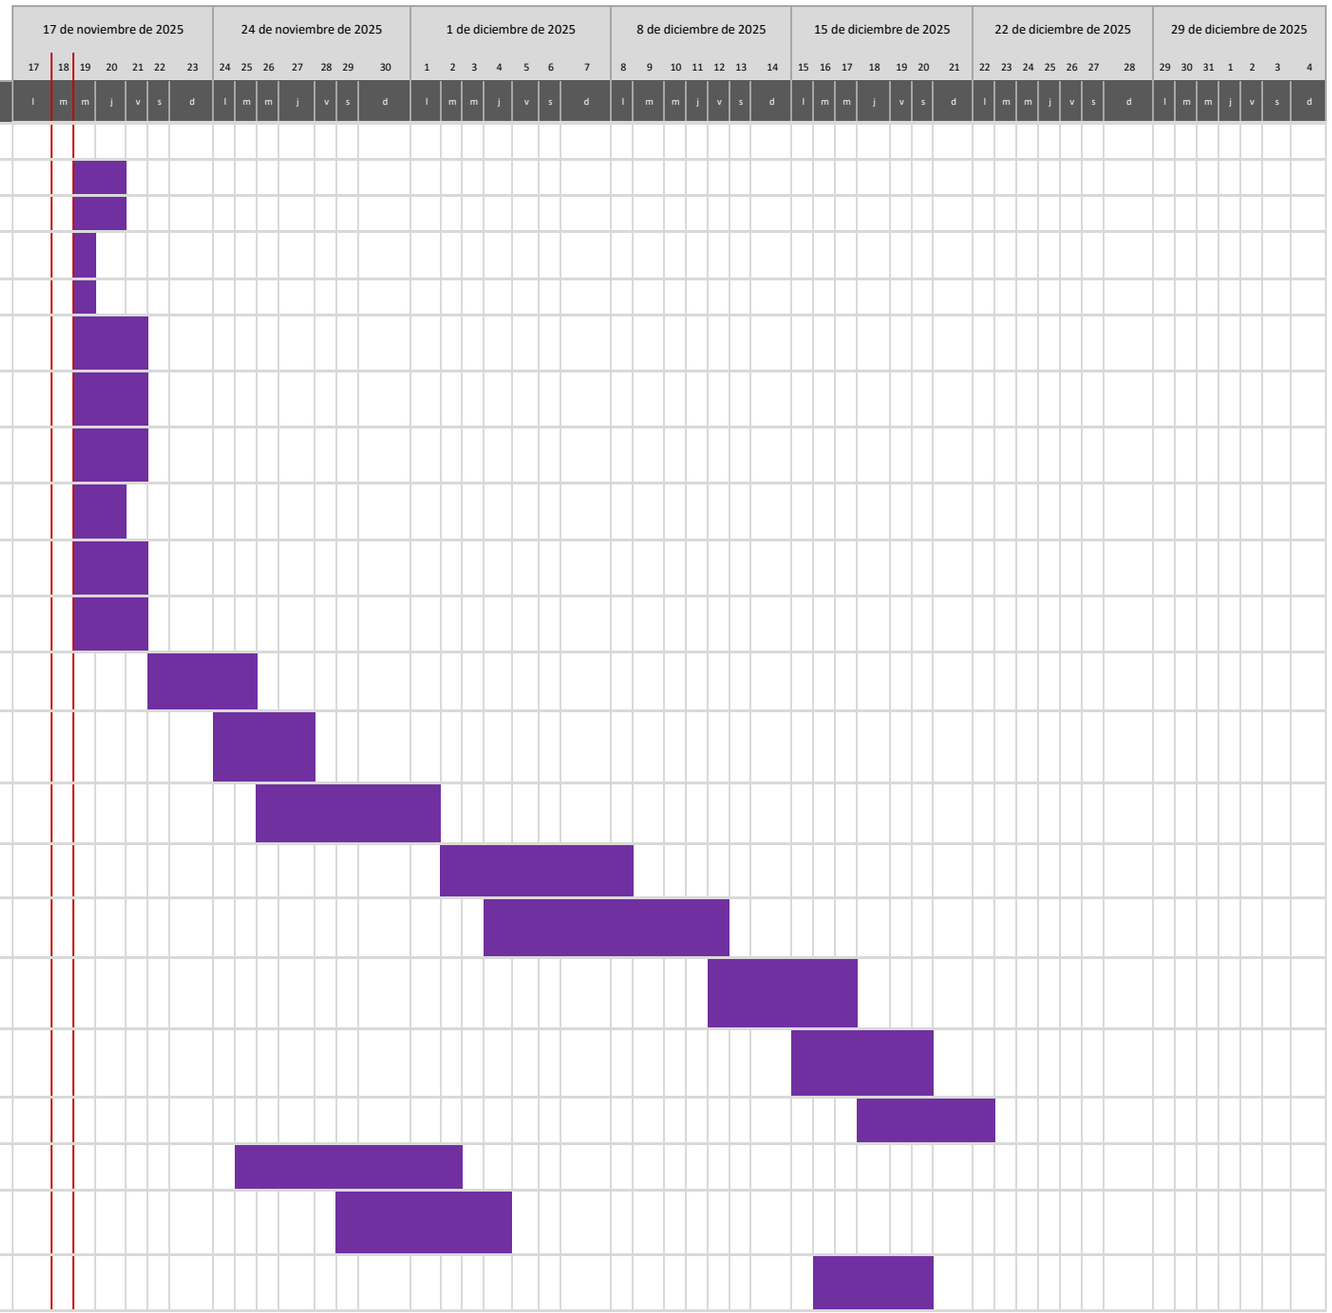

22	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETAS CON DESARROLLO 50 Y BAJADAS	100%	16-12-25	19-12-25	4	
23	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	100%	17-12-25	22-12-25	6	
24	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE 10CM	100%	22-11-25	27-11-25	6	
25	PISO CERAMICO 45X45 CM	100%	27-11-25	30-11-25	4	
26	ZOCALO DE CERAMICO 10X30CM	100%	30-11-25	4-12-25	5	
27	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS METALICAS LISA DOBLE HOJA DE 2X0,55X2,1, INCLUYE MARCOS, HERRAJES Y PINTURAS	100%	2-12-25	6-12-25	5	
28	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS METALICAS LISA DOBLE HOJA DE 2X0,8X2,1, INCLUYE MARCOS, HERRAJES Y PINTURAS	100%	2-12-25	5-12-25	4	
29	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 4MM, TIPO EXISTENTE PARA VENTANAS TIPO BALANZIN	100%	2-12-25	3-12-25	2	
30	PINTURAS DE PAREDES REVOCADOS LATEX (DOS MANOS) INTERIOR/EXTERIOR	100%	20-12-25	23-12-25	4	
31	PINTURAS DE CANALETA Y CAÑO DE BAJA CON PINTURA SINTETICA	100%	19-12-25	22-12-25	4	
32	PINTURA DE CENEFA CON BASE ANTIOXIDO/PINTURA AL LATEX	100%	19-12-25	22-12-25	4	
33	REVESTIDO DE AZULEJOS PARA COCINA	100%	25-12-25	27-12-25	3	
34	REGISTRO PLUVIAL CON REJILLA METALICA 40X40 CM	100%	19-12-25	22-12-25	4	
35	CAÑO DE PVC 100MM PARA DESAGÜE PLUVIAL	100%	18-12-25	20-12-25	3	
36	INSTALACIÓN DE TABLERO TS10 DE 15AG	100%	24-12-25	27-12-25	4	
37	INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS DE COMANDO TCV	100%	24-12-25	27-12-25	4	
38	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	100%	24-12-25	27-12-25	4	
39	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	100%	24-12-25	27-12-25	4	
40	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS PARA TCV	100%	24-12-25	27-12-25	4	
41	ALIMENTACIÓN 2 X 10 MM. NYY al tablero existente	100%	22-12-25	25-12-25	4	
42	ALIMENTACIÓN PARA EXTRACTOR	100%	24-12-25	27-12-25	4	
43	ARTEFACTOS ELECTRICOS: PANEL LED DE 24W	100%	21-12-25	24-12-25	4	
44	ARTEFACTOS ELECTRICOS: PANEL LED DE 24W C/FOTOCELULA DE GALERIA	100%	26-12-25	29-12-25	4	
45	TABLERO TS10 DE 20AG. CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	100%	24-12-25	27-12-25	4	
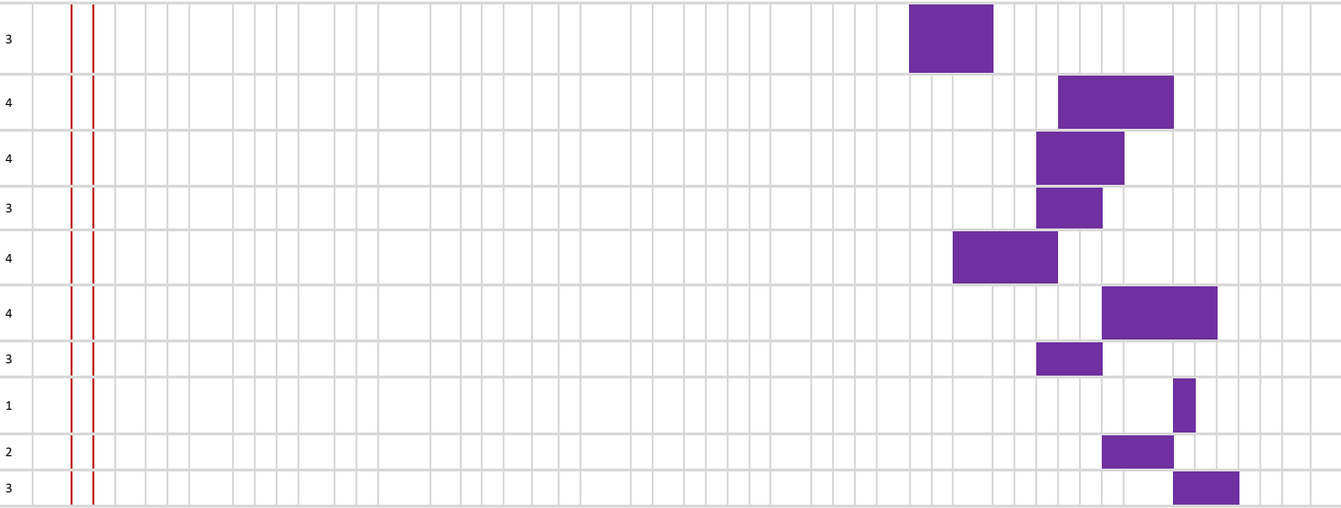
46	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CM	100%	19-12-25	21-12-25	3	
47	INSTALACIÓN SANITARIA: INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE Y DESAGÜES CLOACALES	100%	25-12-25	28-12-25	4	
48	CAMARA SEPTICA 2 X 1 METROS	100%	24-12-25	27-12-25	4	
49	CAMARA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM DOBLE TAPA	100%	24-12-25	26-12-25	3	
50	INSTALACIÓN DE TANQUE TIPO COPA ELEVADO METALICO DE 10000 LITROS Y ALTURA DE 10M, INCLUYE BOMBA DE ELEVACIÓN Y ACCESORIOS	100%	21-12-25	24-12-25	4	
51	REVESTIMIENTO DE MESADA Y PARED DE COCINA CON CERAMICA ESMALTADA	100%	27-12-25	30-12-25	4	
52	INSTALACIÓN DE FONTANERIA SANITARIA DE 50 CM	100%	24-12-25	26-12-25	3	
53	BACHA DOBLE INOX	100%	29-12-25	29-12-25	1	
54	EXTRACTOR DE AIRE DE METAL 30 CM, 1/4 HP, 220V PARA CAMPANA EXISTENTE CON PULSADOR	100%	27-12-25	28-12-25	2	
55	LIMPIEZA FINAL	100%	29-12-25	31-12-25	3
