✓OK! 1er memo
- 24/6/2017

Caacupé, 23 de mayo de 2017

Señor

Diego Riveros

Intendente de la Ciudad de Caacupé

En nombre de la Escuela Básica N°5079 Don Juan Antonio Quiñonez Gómez de la Compañía Cerro Real Km 57 ½, me dirijo a Ud. a fin de solicitar la demolición de un bloque de cuatro salas de clases, ya que una de ellas se ha derrumbado el día viernes 19 de mayo, y a consecuencia de ello corre el riesgo las demás salas de clases en derrumbarse en cualquier momento poniendo en riesgo la vida de los/as niños/as y de todo el plantel docente.

Además solicito la reconstrucción del bloque dañado para una mejor convivencia con los/as niños/as apostando a la calidad educativa.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, me despido deseándole buenos augurios y éxitos en sus funciones.

Atentamente

Prof. Sara Diana Daiub Fatecha

Encargada de Despacho

Matricula N°26.436

Adjunto evidencias de lo acontecido.

Municipalidad de Caacupe
Mesa de Entrada

Exp. N° R-020 Folio: 800

Caacupé: 23 MAY 2017

Firma: Hora: 09:56

Aclaración: Rosa Jara

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

ACTA DE RELEVAMIENTO

En la ciudad de Caacupé, República del Paraguay a los veinte y tres días del mes de mayo del año dos mil diez y siete, siendo las 09:30 horas, me constituí en la Esc. Bas. N° 5079 "**Don Juan Antonio Quiñónez**" situada en Compañía Cerro Real de este distrito, a fin de verificar el derrumbe de un aula dentro de un bloque, denunciada por Sra. Virginia Trigo, Secretaria de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencia. ----------

Al llegar al sitio se pudo observar que el aula derrumbada se encuentra ubicada en el medio de un bloque que consta de cinco aulas, el techo de toda el aula se encontraba totalmente derrumbado, posiblemente la viga cumbrera colapsó y arrastró todos los tirantes, tejas, tejuelones y artefactos eléctricos. Además cayó toda la mampostería de elevación ubicada hacia el Sur, hasta altura de antepecho, arrastrando consigo todas las aberturas ubicadas en la misma.

La mampostería contraria a ésta también ha sufrido graves daños, se puede pudo observar numerosas grietas, especialmente la parte que se encuentra más cerca de la mampostería transversal a ésta.

La galería que da al Norte del aula, si bien no cayó el techo, ha sido dañada también en su estructura sostén. Los pilares se encuentran totalmente agrietadas y con los ladrillos movidos en la base de apoyo de la viga.

Acompañan a éste relevamiento de datos, fotografías obtenidas en el lugar.--

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

González

Arq. ANALIA V. GONZÁLEZ A.
Directora de Obras y Servicios

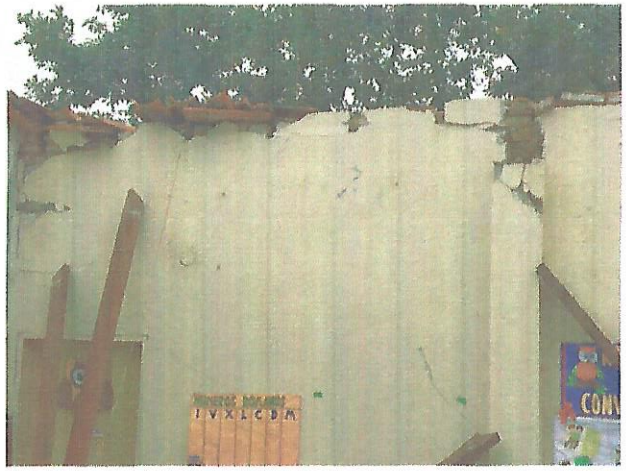
NUMEROS ROMANOS
I V X L C D M
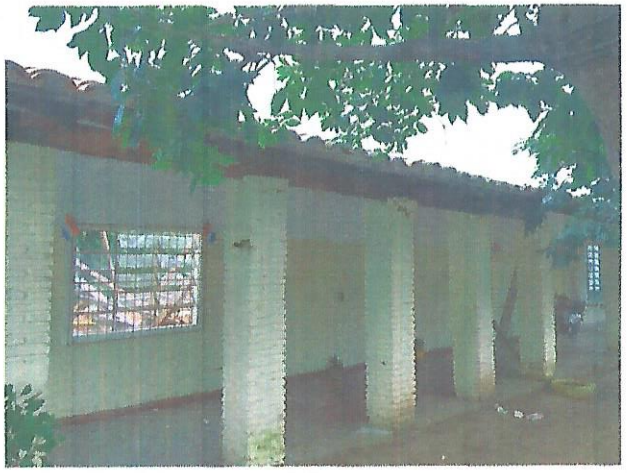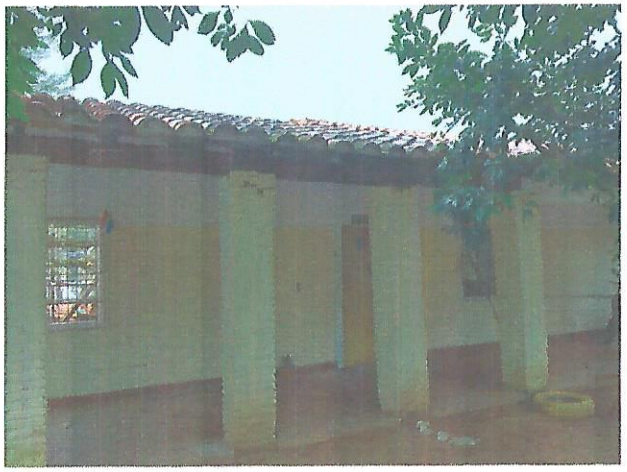
NUMEROS ROMANOS
I V X L C D M
