MUNICIPALIDAD DE KATUETE
DPTO. CANINDEYU

INFORME FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Objeto: REMITIR INFORME TECNICO

Lugar verificado: Calle Yby Cui partiendo desde la Ruta Internacional N°3 con dirección al local del Refugio de maquinarias de la Municipalidad.

Situación: Canal de desagüe existente con falta de señalización y/o protección del mismo.

Fecha: 31/10/2022

En la fecha me he constituido en la calle denominada Yby Cui que dirige a Refugio de Maquinarias de la Municipalidad, la citada calle consta de una doble avenida de gran dimensión de anchura y en el centro de la calle existe el canal de desagüe que sirve como uno de los principales puntos de desagote para raudales de la Ciudad de Katuete.

Mi presencia in situ se originó por la caída de un automóvil al canal días atras, por lo que considere necesaria la visita a modo de otorgar solución a la problemática.

Una vez verificado el lugar he constatado que el lugar no cuenta con ningún tipo de baranda protectora, tapa o por lo menos señalización y atendiendo a la anchura y profundidad del canal lo convierte en un sitio riesgoso.

Cabe mencionar que el automóvil cayo al mismo debido a la nula visibilidad ya que en ese momento el canal estaba totalmente cubierto por las aguas.

Dicha situación no es común ya que anteriormente nunca hemos observado las aguas hasta el nivel de altura de los últimos días, situación que se debe a las reiteradas lluvias lo que ocasiona que el ambiente húmedo no pueda absorber normalmente el agua ocasionando la acumulación y el aumento del nivel en las mismas.

Ante esta situación considero pertinente la intervención inmediata de la Municipalidad, procediendo primeramente al vallado provisorio, y posteriormente y de acuerdo a la disponibilidad de la institución proceder a la construcción de una tapa de Hormigón para el mismo, ya que una baranda no asegura la seguridad total del lugar ya que es vulnerable.

La tapa de Hormigón a ser construida será transitable para cualquier tipo de vehículos. Por lo expuesto recomiendo la construcción de tapa de hormigón para el canal de desagüe.

Adjunto remito imágenes del canal actual.

Ana Carolina B.

Ana Carolina Bourschcid
ARQUITECTA
Reg Prof N° 4 385

Arq. Ana Carolina Boursheid
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE KATUETE · OBRAS ·

MUNICIPALIDAD DE KATUETE
DPTO. CANINDEYU

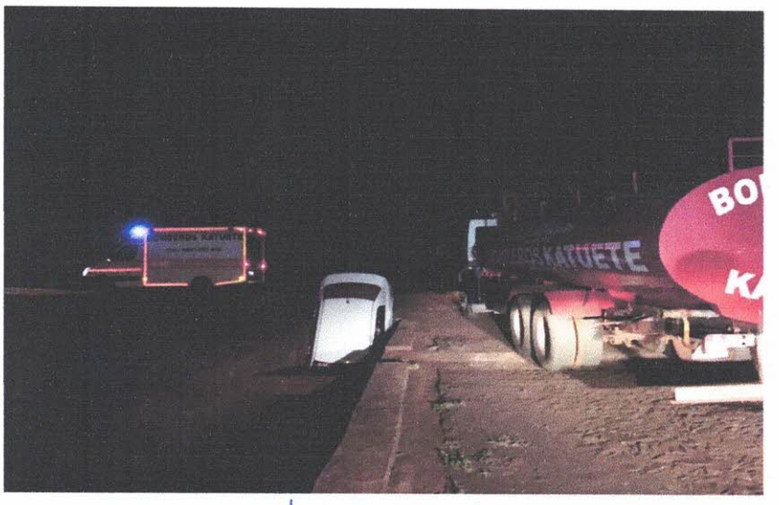

Ana Carolina B.-
Ana Carolina Bourscheid
ARQUITECTA
Reg Prof N° 4 385

Arq. Ana Carolina Boursheid
Fiscal de Obras
