MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

ACTA DE VERIFICACIÓN VIAL Y RELEVAMIENTO DE AFECTACIONES A CONSECUENCIA DE INCLEMENCIA DE ALCANTARILLADO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CARRERIA'I EN EL MUNICIPIO DE ITAKYRY.

En el distrito de Itakyy, Departamento de Alto Paraná, a los 24 días del mes de febrero del 2023, siendo las 09:00 horas, yo Arq. PERLA QUIROGA, en mi carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad de Itakyry, me constituyo in situ en la localidad de **CARRERIA'I,** de este municipio, procediendo a constatar daños sufridos por una estructura de paso – PUENTE DE ROLLOS DE MADERA CON REFUERZO DE HORMIGON, que ha quedado en una situación de desmantelamiento, con la rotura de los pilares de la estructura y el desplazamiento de los tubos, interrumpiendo la circulación pública vehicular y constituyendo un enorme peligro para los peatones.

Según reportes, durante el mes de febrero se ha registrado una seguidilla de lluvias (entre ellos la copiosa lluvia de fecha 24 de febrero del corriente), los cuales fueron afectando ostensiblemente la estructura del Puente de Madera con Alcantarillado en el tramo señalado, hasta que finalmente las embestidas de los raudales del día 24 de febrero del corriente ha terminado de desmoronar y desmantelar la estructura existente.

Conforme a lo verificado y la evidencia fotográfica agregada se puede observar los daños que ha sufrido la estructura, que incluso presenta derrumbe casi total de vigas principales (rollos) de la base de la estructura y la dispersión del entubado, como resultado de la envestida frenética de fuertes raudales desplazados en los cauces de los arroyos, superando la capacidad de drenaje de la estructura existente de antaño sin la solidez para resistir los altos volúmenes de lluvias que suelen registrarse en la actualidad

Además de la interrupción de la circulación pública en el tramo señado, la falta de un trayecto alternativo para el paso de transeúntes, y la asidua utilización del tramo por agricultores en este tiempo con vehículos de gran porte, en el traslado de granos, generándose una gran preocupación respecto al peligro enorme que representa para los pobladores que aún circulan a pie sobre la estructura de paso, debido a los graves deterioros observados en el puente.

Los daños alarmantes requieren la urgente intervención de la Institución Municipal, mediante un mecanismo de contratación abreviada tendiente a la ejecución en la brevedad de reparación del alcantarillado defenestrado de tal manera a regularizar el tránsito.

Adjunto a la presente acta evidencias fotográficas que reflejan a las claras los sucesos ocurridos por acción de la naturaleza y que requieren urgente solución.

ARQ. PERLA QUIROGA
Fiscal de Obras
Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC Nº 3.538

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
R.U.C. N° 80044947-9 Telef N°: 021-3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE OBRAS

FOTOGRAFIAS

COMUNIDAD INDIGENA- CARRERIA´I

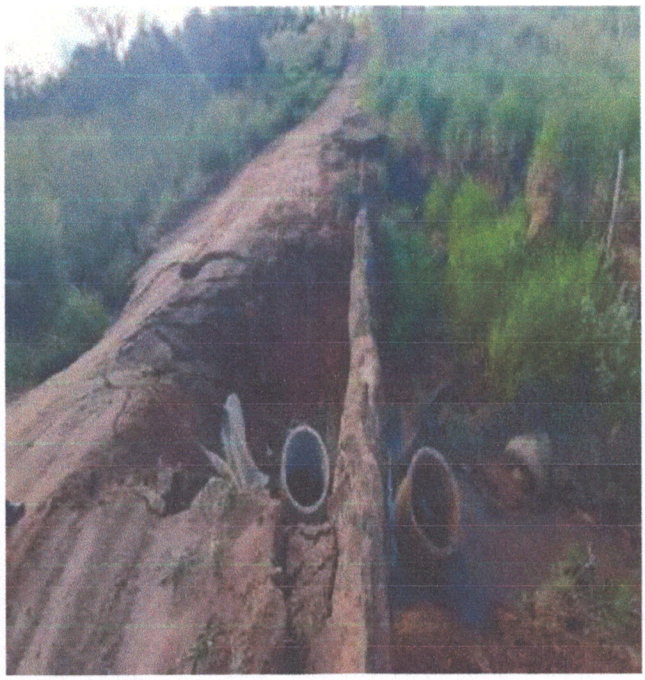

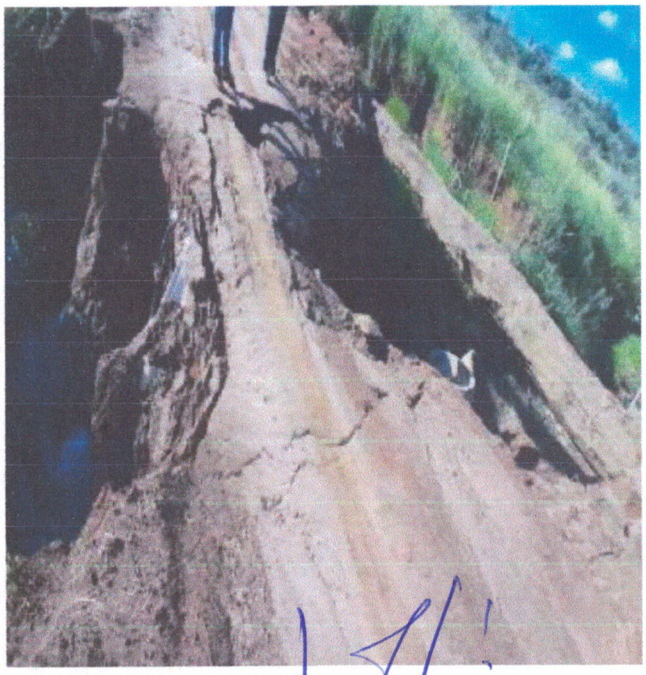

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
R.U.C. N° 80044947-9 Telef.N°: 021-3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE OBRAS

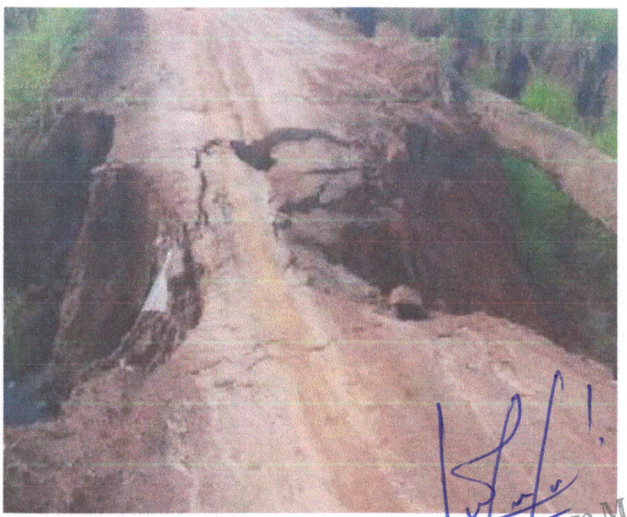

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538
