Yasy Cañy, 16 de marzo de 2.021

Sr.
Blásido Villalba Torres.
Intendente
Municipalidad de Yasy Cañy.
Presente:

DE: Fiscal de Obras.

Ref.: Informe de resultados del relevamiento de datos obtenidas, con respecto a la verificación de las construcciones existentes (sanitario y aulas) dentro de la Institución Colegio 5 de Junio.

- ***Colegio 5 de Junio***: Se realiza el relevamiento verificando los dos bloques de aulas existentes, las cuales necesitan con carácter urgente las reparaciones de las mismas, debido a encontrarse con patologías constructivas que comprometen a la estructura por presentar fisuras importantes. Se puede constatar la falta de un correcto sistema de instalación eléctrica que actualmente resulta un peligro debido a encontrarse sueltos y en malas condiciones, asi como la falta de artefactos eléctricos necesarios para el funcionamiento de las aulas.
  A su vez se verifica que el sanitario sexado existente, necesita de manera urgente realizar el cambio de instalaciones eléctricas debido a encontrarse con cables sueltos y en malas condiciones, las paredes presentan fisuras importantes y las aberturas de maderas están deterioradas y es necesario realizar una correcta aislación hidrófuga para evitar comprometer a las mamposterías existentes.

Atentamente.-

Arq. Kater
Reg. MOPC

Arq. Katerine Solis.

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
U.O.C.
Recibido 18/03/2021.

Darminia D. Gonzalez Velazquez
Encargada de la UOC

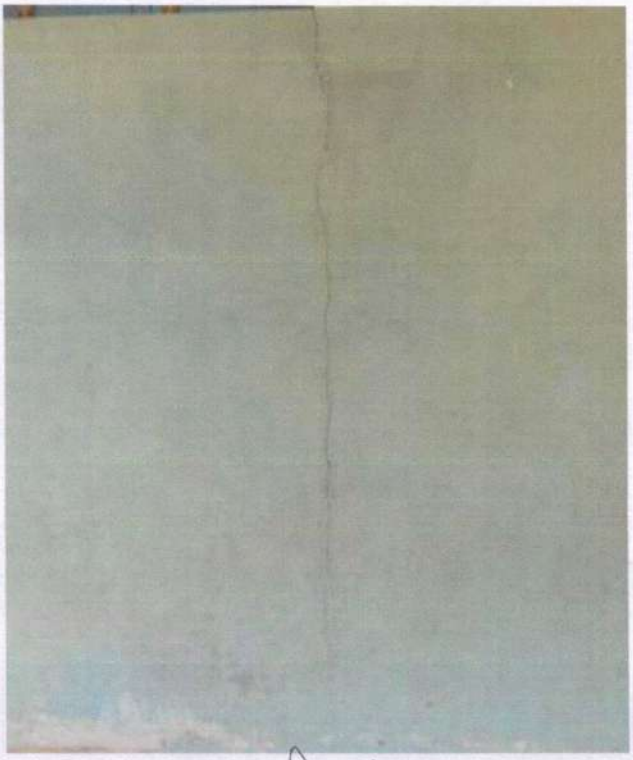

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

Yasy Cañy, 16 de marzo de 2.021

Sr.
Blásido Villalba Torres.
Intendente
Municipalidad de Yasy Cañy.
Presente:

DE: Fiscal de Obras.

Ref.: Informe de resultados del relevamiento de datos obtenidas, con respecto a la verificación de las construcciones existentes (sanitario) dentro de la Institución Escuela Básica N° 5724 5 de junio.

- ***Escuela Básica N° 5.724 5 de Junio***: Se realiza el relevamiento verificando el Sanitario Sexado existente, la cual necesita con carácter urgente la construcción de otro sanitario acorde a las necesidades imperante de la Institución, la misma presenta patologías constructivas importantes, filtraciones de techo, fisuras de paredes que suben desde la cimentación, desprendimientos de paredes en uniones, cuenta con artefactos sanitarios en malas condiciones (sin cisternas, sin asientos), y las instalaciones hidráulicas y cloacal se encuentran obstruidas, así también no cuenta con pozo absorbente, siendo el desemboque de la instalación cloacal solo en cámara séptica.
  El sanitario no abastece la necesidad para la cantidad de alumnos con la que cuenta la escuela debido a sus dimensiones y distribución, siendo también utilizada por los docentes de dicha Institución.

Atentamente.-

Arq. Katerine Solis
Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.7

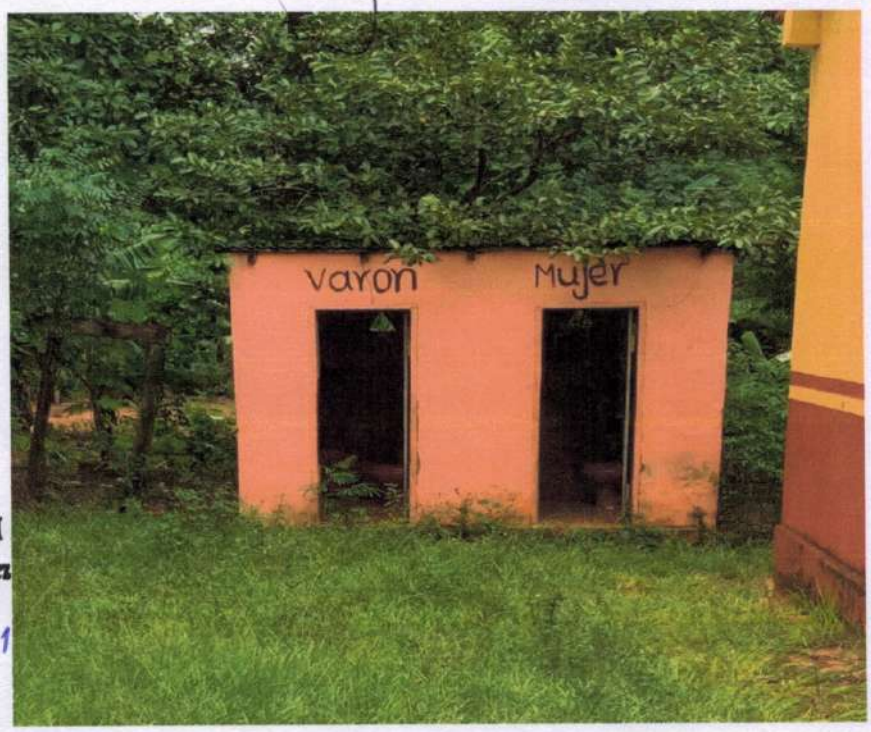

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
U.O.C.

Darminia D. Gonzalez Velazquez
Encargada de la UOC

Darminia D. Gonzalez Velazquez
Encargada de la UOC

Recibido 18/03/2021

Yasy Cañy, 16 de marzo de 2.021

Sr.
Blásido Villalba Torres.
Intendente
Municipalidad de Yasy Cañy.
Presente:

DE: Fiscal de Obras.

Ref.: Informe de resultados del relevamiento de datos obtenidas, con respecto a la verificación de las construcciones existentes (sanitario) dentro de la Institución Escuela Básica N° 5724 5 de junio.

- ***Escuela Básica N° 5.724 5 de Junio***: Se realiza el relevamiento verificando el Sanitario Sexado existente, la cual necesita con carácter urgente la construcción de otro sanitario acorde a las necesidades imperante de la Institución, la misma presenta patologías constructivas importantes, filtraciones de techo, fisuras de paredes que suben desde la cimentación, desprendimientos de paredes en uniones, cuenta con artefactos sanitarios en malas condiciones (sin cisternas, sin asientos), y las instalaciones hidráulicas y cloacal se encuentran obstruidas, así también no cuenta con pozo absorbente, siendo el desemboque de la instalación cloacal solo en cámara séptica.
  El sanitario no abastece la necesidad para la cantidad de alumnos con la que cuenta la escuela debido a sus dimensiones y distribución, siendo también utilizada por los docentes de dicha Institución.

Atentamente.-

Arq. Katerine Solis.
Reg. MOPC N° 3.7

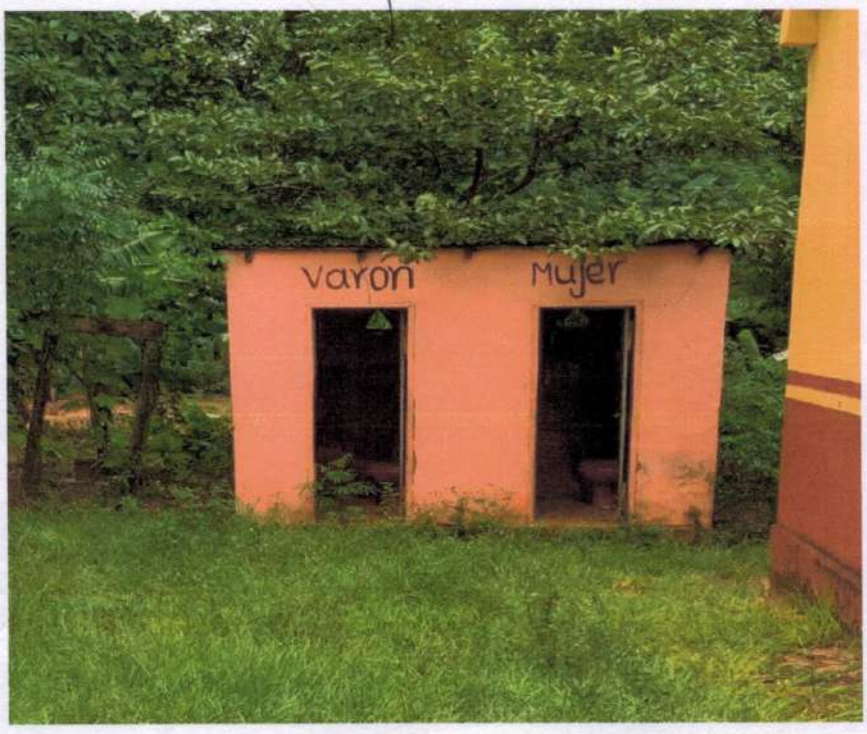

Yasy Cañy, 16 de marzo de 2.021

Sr.
Blásido Villalba Torres.
Intendente
Municipalidad de Yasy Cañy.
Presente:

DE: Fiscal de Obras.

Ref.: Informe de resultados del relevamiento de datos obtenidas, con respecto a la verificación de las construcciones existentes (aulas) dentro de la Institución Escuela Básica N° 5722 San Bartolomé.

- ***Escuela Básica N° 5722 San Bartolomé***: Se realiza el relevamiento verificando los dos bloques de aulas existentes, las cuales necesitan con carácter urgente las reparaciones de las mismas, debido a encontrarse con patologías constructivas que comprometen a la estructura por presentar fisuras importantes. A su vez es necesario realizar correctamente la aislación hidrófuga de los bloques que afecta a la mampostería actualmente. Se puede constatar la falta de un correcto sistema de instalación eléctrica que actualmente resulta un peligro debido a encontrarse sueltos y en malas condiciones, asi como la falta de artefactos eléctricos necesarios para el funcionamiento de las aulas.

Atentamente.-

Arq. Katerine Solis.
Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

Necesario realizar el correcto sistema de instalación eléctrica, la misma actualmente podría generar alguna falla y poner en peligro a los niños que están en dicha Aula. Los artefactos eléctricos no funcionan actualmente.
Las cadenas como soporte no son las autorizadas, es necesario cambiarla por un soporte rígido.

A falta de un buen contrapiso y carpeta se producen asentamientos en los pisos, se puede notar hundimientos importantes.

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY U.O.C.

Darminia D. Gonzalez Velazquez
Encargada de la UOC

Recibido 18/03/2021

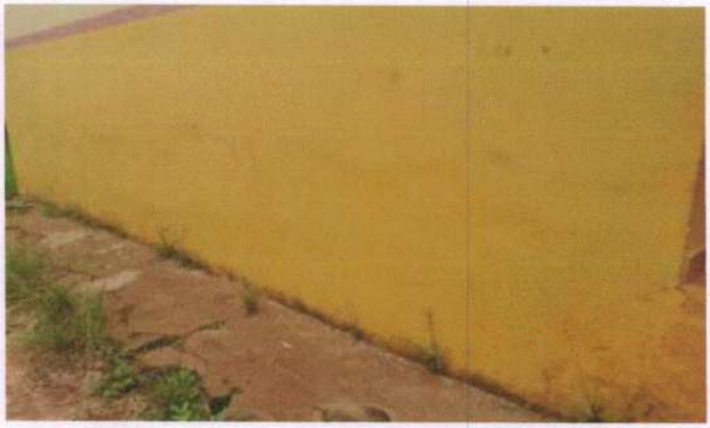

Las paredes presentan fisuras que deben ser reparadas para evitar que propaguen las patologías.

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722
