Tere U

# MEMORÁNDUM C.P.I. Nº 290 /2020

A
CAC

**A** : **Abg. Yenny Carolina Ovelar de Torres** – Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

**De** : **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila**. Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP

**Arq. Aurora Vera Cárdenas**. *Fiscal de Obras- Contrato N° 4/ 2019 - UERP – MEC*

**Asunto: Remisión de Aprobación de Incidencias de las Condiciones Climáticas – Empresa Contratista Tes Ingeniería**

**Fecha:** 3/03/2020.

Por la presente la **Fiscalización del Contrato N° 4/ 2019 –Capiibary- San Pedro** de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en referencia a CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DEL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA – DISTRITO DE CAPIIBARY- DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO´´ SEGUNDO LLAMADO- ID N° 342.673, "CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 1/ 2019 ´´, presenta por éste medio el **CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMATICAS** – en el plazo de ejecución de las Obras correspondientes al Contrato N° 4/ 2019 , a cargo de la Empresa Constructora Tes Ingeniería

**CUADRO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA**

| RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS CON ADENDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | MES | CANT. DE LLUVIAS - DINAC | INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras | DIAS ACUMULADOS | CON ADENDA |
| 1 | NOVIEMBRE 2019 | 7 | 7 | 7 | SI |
| 2 | DICIEMBRE 2019 | 10 | 10 | 10 | SI |
| 3 | ENERO 2020 SOLICITADA | 7 | 7 | 7 | NO |
| | | | TOTAL | 7 días | SIN ADENDA |

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
UEPP - MEC
Nº Exp.: 121
Entregado por:
Recibido por: Fernando.
3 3 20 9:54

CPI

| Días | MES= ENERO 2020 | |
|---|---|---|
| | DINAC | LIBRO DE OBRA |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | 1 | 1 |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | 1 | 1 |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 1 |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | 1 | 1 |
| 30 | | |
| 31 | | |
| TOTAL | 7 | 7 |

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato. CGC 22.1

**Prorroga de los Plazos de Ejecución**

- **Inclemencias climáticas:** Las prórrogas por caso de inclemencias climáticas se regirán por lo establecido en la CGC 24. Los días de lluvias y sus consecuencias serán computados, mediante presentación de documentos probatorios de la DINAC. Se deberá dejar constancia en el Libro de Obras de los días en los cuales se suspendió el trabajo.

**Condiciones Generales del Contrato**

**24. Inclemencias climáticas.**

24.1. En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

24.2. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

24.3. Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la

Arq. Aurora Vera C.
Reg. Nº 2394

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

24.4. Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el Contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la Contratante antes de los quince días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras.

**Corresponde remitir la Contabilización de la Suspensión por lluvias e incidencias del mes de Enero de 2020, aprobada por la Fiscalización de Obras, según pedido de Nota N° 006 / 2020 dela** Empresa **Contratista Tes Ingeniería es de un total de 7 (siete) días calendarios.**

**CUADRO DE DESPLAZAMIENTO PARA EL PLAZO DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| Fecha de término vigente | 10 /03/ 2020 |
| Total días de lluvias de Enero 2020 | 7 |
| Total de días de prorrogas por razones ajenas a la responsabilidad al Contratista | 7 |
| Fecha de término solicitado | 17/03/2020 |

**CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS DEL CONTRATO –**

***Contrato N° 04/ 2019 – Capiibary, San Pedro, Empresa Contratista Tes Ingeniería "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DEL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA – DISTRITO DE CAPIIBARY- DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO´´ SEGUNDO LLAMADO- ID N° 342.673, "CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 1/ 2019 ´´ -***

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: **232.251.118**

Contrato N° 04/ 2019 — Contratista: TES INGENIERIA

| DESCRIPCIÓN | Inicio | Fin | Días | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| **Suscripción del Contrato** | 07/10/2019 | | | Contrato inicial |
| **Fecha de Inicio de Contrato** | 25/10/2019 | **23/02/2020** | 120 | |
| **Desplazamiento por Inclemencias Climáticas de Adenda 1** | 23/02/2020 | 10/03/2020 | **17** | |
| **Desplazamiento por Inclemencias Climáticas para Adenda 2** | 11/03/20202 | 17/ 03/2020 | **7** | |
| **Considerando inclemencias climáticas a adendarse = 7 días** | | | | |

Se adjuntan copias de legajos

a- REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020, de la **Dirección de Meteorología e Hidrología** (para San Estanislao) del mes de Enero 2020.

b- Registros de lluvias en los Libros de Obras.

c- **Nota N° 006/2020, Exp.UEPP MEC N°1226** .

Atentamente.

| Con Visto Bueno del Fiscal de Obras | Se autoriza la remisión a las empresas de Referencia, para los trámites de rigor. |
|---|---|
| **Arq. Aurora Vera Cárdenas**<br>Fiscal del Contrato N° 04/ 2019 | **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila**<br>Coordinación de Supervisión y Certificación<br>Coordinación de Proyectos de Infraestructura |

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

**TES Ingeniería**
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

Asunción, 28 de febrero de 2020.-

**Señor:**
Alejandro Duarte
Coordinador General Interino de la UEPP
**Ministerio de Educación y Ciencias**

**Referencia:** Contrato 04/2019 – Contratación vía excepción N° 01/2019 "Construcción, Ampliación y Reparación del Colegio Nacional María Auxiliadora– Distrito de Capiibary – Departamento de San Pedro"– Segundo Llamado – ID N° 342.673.

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a objeto remitirle la documentación con los ajustes correspondientes al **Certificado Nº 03** solicitados, en el marco de licitación del llamado de referencia.

Anexamos a la carpeta los siguientes documentos:

- Pedido de Prorroga por lluvia con la contabilización de plazos como producto del análisis de los días de lluvias, correspondiente al mes de Enero 2020.
- Presentación de copias de libro de obra de los días de lluvias y sus incidencias.
- Presentación de Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC).

Sin otro particular, les saludo respetuosamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 1226
Recibido por: Victor

| DIA | MES | AÑO | HORA |
|---|---|---|---|
| 28 | 02 | 2020 | 11:30 |

***Ing. Diego J. Rodríguez***
***Representante Legal***

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

**NOTA N° 006/ 2020**

Asunción, 17 de febrero de 2020.

**A: Arq. Patricia Sánchez de Ávila – Coordinadora**
**Coordinación de Proyectos de Infraestructura – CPI – UEPP.**
**CC: Arq. Aurora Vera Cárdenas - Fiscal de Obras – CPI – UEPP.**

**Ref.:**Contrato 04/2019 – Contratación vía excepción N° 01/2019 "Construcción, Ampliación y Reparación del Colegio Nacional María Auxiliadora– Distrito de Capiibary – Departamento de San Pedro"– Segundo Llamado – ID N° 342.673.

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a Udes. Y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar los datos estadísticos correspondiente a los días de lluvias, según registro de la DINAC de los meses de Enero de 2020 y los asientos respectivos en los libros de obras, que afectaron el normal desarrollo de las actividades generando un desplazamiento del cronograma, por lo que solicitamos la ampliación del mismo según planilla de detalles adjunto.

| | |
|---|---|
| Fecha de término vigente | 10/03/2020 |
| Total días de lluvias de Enero de 2020 | 7 |
| Total de días de prorrogas por razones ajenas a la responsabilidad al Contratista | 7 |
| Fecha de término solicitado | 17/03/2020 |

Solicitamos 7 (Siete) días de desplazamiento del plazo del contrato. Para los fines correspondientes se adjuntan las documentaciones necesarias.

Sin otro particular, me despido atentamente

Humberto Rodriguez.

**Ing. Diego J. Rodríguez Barrios**

TES Ingeniería
TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

TABLA DE LLUVIAS

| Días | MES= ENERO 2020 | |
|---|---|---|
| | DINAC | LIBRO DE OBRA |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | 1 | 1 |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | 1 | 1 |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 1 |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | 1 | 1 |
| 30 | | |
| 31 | | |
| TOTAL | 7 | 7 |
| ENERO = 7 DIAS | | |
| Total días solicitado = 7 días | | |

Humberto Rodríguez

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

## DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| SAN ESTANISLAO | 24° 40' 01,00" | 56° 26' 53,29" | 161 m s.n.m.m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,8 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 17,4 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 4,6 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2,0 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 8,6 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 6,8 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 50,2 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | 95 | | | | | | | | | | | |
| Máx. 24h | 50,2 | | | | | | | | | | | |
| Día Máx. | 29 | | | | | | | | | | | |

Ing. María Lourdes Aveiro G.
Resp. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

## RESUMEN - CRONOGRAMA DE AVANCE ESTIMADO

| CRONOGRAMA DE AVANCE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 |
|---|---|---|---|---|
| INVERSION MENSUAL – SEGÚN CRONOGRAMA | 56.570.628 | 28.777.957 | 42.313.830 | 104.588.704 |
| AVANCE MENSUAL EJECUTADO | 61.962.240 | 12.615.533 | 14.235.178 | |
| AVANCE MENSUAL PROGRAMADO % | 24% | 12% | 19 % | 45 % |
| AVANCE MENSUAL EJECUTADO % | 26,68% | 5,43% | 6,13 % | |
| AVANCE ACUMULADO SEGÚN CRONOGRAMA | 36 % | | | |
| AVANCE ACUMULADO SEGÚN AVANCE | 38,24 % | | | |

## RESUMEN – DE CRONOGRAMA REPROGRAMADA DE AVANCE ESTIMADO

| CRONOGRAMA DE AVANCE REPROGRAMADA = 17 DIAS DE LLUVIAS | MES 1 = Noviembre 7 DIAS LLUVIA | MES 2 = Diciembre 10 DIAS LLUVIA | MES 3 = Enero | MES 4 = Febrero | MES 5= Marzo |
|---|---|---|---|---|---|
| INVERSION MENSUAL – SEGÚN CRONOGRAMA | 56.570.628 | 12.615.533 | 11.497.338 | 68.337.560 | 83.230.059 |
| AVANCE MENSUAL EJECUTADO | 61.962.240 | 12.615.533 | 14.235.178 | | |
| AVANCE MENSUAL REPROGRAMADO % | 24,36% | 5,43% | 4,95% | 29,42% | 35,84% |
| AVANCE MENSUAL EJECUTADO % | 26,68% | 5,43% | 6,13 % | | |
| AVANCE ACUMULADO SEGÚN CRONOGRAMA | 34,74 % | | | | |
| AVANCE ACUMULADO SEGÚN AVANCE | 38,24 % | | | | |

Humberto Rodriguez

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

# Curva de Avance Estimado

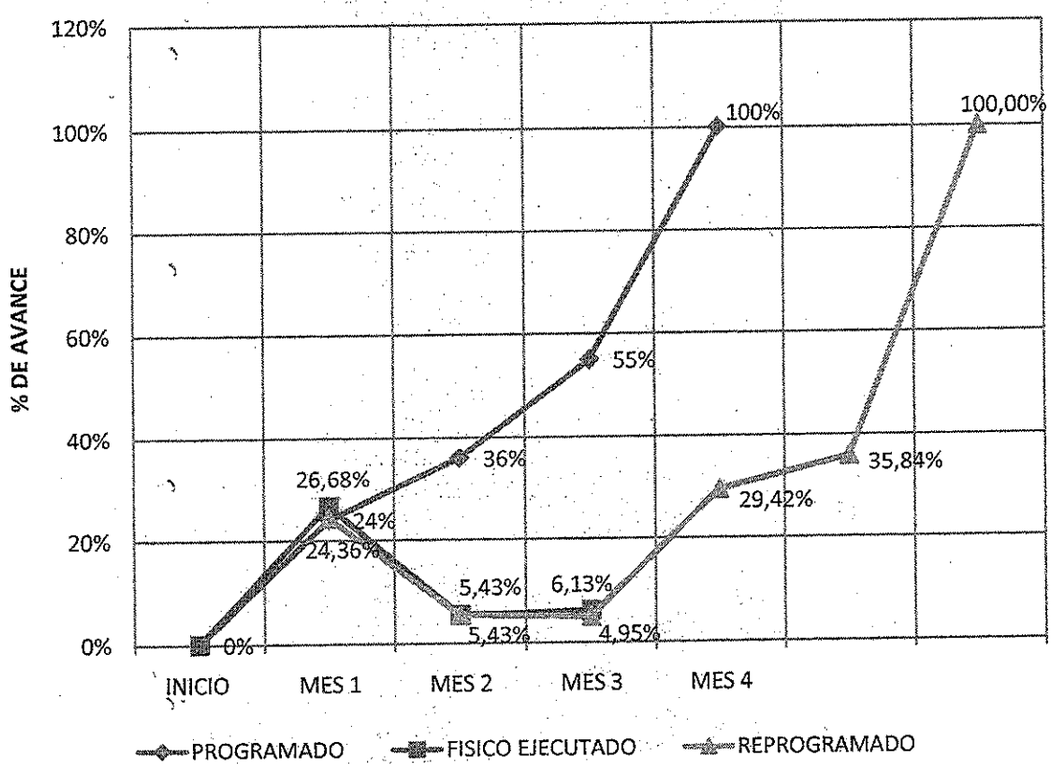


Ing. Diego J. Rodríguez Barrios

TES Ingeniería
TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Humberto Rodríguez

| Contratante: Ministerio de Educación y Ciencia | Fecha: 01/01/2020 | Ubicación: Capiibary - San Pedro | 000044 |
|---|---|---|---|

Contratista: T*ES Ingenieria*

Objeto Contractual: "Construcción, Ampliación y Reparación del Colegio Nacional Maria Auxiliadora, Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro" - Segundo llamado - ID N° 342.673

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato:** 04/2019 | | Inicio:/ / | Finalización: / / |
| Días de Contrato | Transcurridos: | Efectivos: | Ausentes: |
| | Restantes: | | |
| Condiciones Climáticas Predominantes: ☐ Bueno ☐ Nublado ☑ Lluvioso | | Día de la Semana: | Horario: |

| Contratista | Fiscalización |
|---|---|
| - Dia feriado: no se trabajó - Con lluvia. | |
| Fecha : 02/Enero/2020 | |

| Contratista. | Fiscalización. |
|---|---|
| Humberto Rodriguez | Arq. Aurora Vera C. Reg. Nº 2394 |

Multigráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 c/ Juan Netto - Tel. 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. N°. 1130 - 1/Tal. 50x3 del 0000001 al 0000050

QUIMICO - ORIGINAL - DUPLICADO: Arch
TRIPLICADO: Talón

| Contratante: Ministerio de Educación y Ciencia | Fecha: 06/01/20 | Ubicación: Capiibary - San Pedro | 000046 |
|---|---|---|---|
| Contratista: ***TES Ingenieria*** | | | |
| Objeto Contractual: "Construcción, Ampliación y Reparación del Colegio Nacional Maria Auxiliadora, Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro" - Segundo llamado - ID N° 342.673 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato:** 04/2019 | Inicio:/ / | Finalización: / / |
| Días de Contrato: Transcurridos: / Restantes: | Efectivos: | Ausentes: |
| Condiciones Climáticas Predominantes: ☐ Bueno ☐ Nublado ☑ Lluvioso | Día de la Semana: Lunes | Horario: |

| Contratista | Fiscalización |
|---|---|
| - Tareas de Mampostería en Aula y Baño. | |
| - A las 9:00 AM - Llovió todo el día | |

| Contratista. | Fiscalización. |
|---|---|
| Humberto Rodriguez | Arq. Aurora Vera R. Reg. Nº 2394 |

Multigráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 c/ Juan Netto - Tel. 514232
RUC: 804589-5 - Hab. N°. 1130 - 1 Tal. 50x3 del 0000001 al 0000050

QUIMICO - ORIGINAL - DUPLICADO: Arch. TRIPLICADO: Talón

| Contratante: ***Ministerio de Educación y Ciencia*** | Fecha: 13/01/20 | Ubicación: *Capiibary - San Pedro* | N° 0000051 |
|---|---|---|---|
| Contratista: ***TES Ingenieria*** | | | |

Objeto Contractual: "Construcción, Ampliación y Reparación del Colegio Nacional María Auxiliadora, Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro" - Segundo llamado - ID N° 342.673

| **Contrato: 04/2019** | | Inicio:/ / | Finalización: / / |
|---|---|---|---|
| Días de Contrato | Transcurridos: | Efectivos: | Ausentes: |
| | Restantes: | | |
| Condiciones Climáticas Predominantes: ☐ Bueno ☐ Nublado ☑ Lluvioso | | Día de la Semana: LUNES. | Horario: |

| **Contratista** | **Fiscalización** |
|---|---|
| - Dia lluvioso - no se | |
| trabaja. | |

| Contratista: | Fiscalización. |
|---|---|
| Ing. Humberto Rodríguez | Arq. Aurora Vera C. Reg. Nº 2394 |

Multigráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 c/ Juan Netto - Tel. 514.232
RUC: 804589-5 - Hab. N°. 1130 - 1 Tal. 50x3 del 0000051 al 0000100

QUIMICO - ORIGINAL - DUPLICADO: Arc
TRIPLICADO: Tal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratante: ***Ministerio de Educación y Ciencia*** | Fecha: 16/01/20 | Ubicación: *Capiibary - San Pedro* | N° 0000054 |
| Contratista: ***TES Ingenieria*** | | | |

Objeto Contractual: "Construcción, Ampliación y Reparación del Colegio Nacional María Auxiliadora, Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro" - Segundo llamado - ID N° 342.673

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato: 04/2019** | | Inicio:/ / | Finalización: / / |
| Días de Contrato | Transcurridos: | Efectivos: | Ausentes: |
| | Restantes: | | |
| Condiciones Climáticas Predominantes: ☐ Bueno ☐ Nublado ☑ Lluvioso | | Día de la Semana: Jueves. | Horario: |

| Contratista | Fiscalización |
|---|---|
| Falta de lluvia. | |

Contratista: Humberto Rodriguez

Fiscalización. Arq. Aurora Vera C. Reg. Nº 2394

Gráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 c/ Juan Netto - Tel. 514 232
504589-5 - Hab. N°. 1130 - 1 Tal. 50x3 del 0000051 al 0000100

QUIMICO - ORIGINAL - DUPLICADO: Arch. TRIPLICADO: Talón

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratante: ***Ministerio de Educación y Ciencia*** | Fecha: 21/01/20 | Ubicación: *Capiibary - San Pedro* | N° 0000058 |
| Contratista: ***TES Ingenieria*** | | | |

Objeto Contractual: "Construcción, Ampliación y Reparación del Colegio Nacional María Auxiliadora, Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro" - Segundo llamado - ID N° 342.673

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato: 04/2019** | | Inicio:/ / | Finalización: / / |
| Días de Contrato | Transcurridos: | Efectivos: | Ausentes: |
| | Restantes: | | |
| Condiciones Climáticas Predominantes: ☐ Bueno ☐ Nublado ☑ Lluvioso | | Día de la Semana: Martes | Horario: |

| **Contratista** | **Fiscalización** |
|---|---|
| - Día lluvioso sin trabajar. | |

Contratista: Humberto Rodriguez

Fiscalización. Arq. Aurora Vera C. Reg. Nº 2384

Multigráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 c/ Juan Netto - Tel. 514 232
RUC: 804569-5 - Hab. N°. 1130 - 1 Tal. 50x3 del 0000051 al 0000100

QUIMICO - ORIGINAL - DUPLICADO: Arch. TRIPLICADO: Talón

| Contratante: ***Ministerio de Educación y Ciencia*** | Fecha: 22/01/20 | Ubicación: *Capiibary - San Pedro* | Nº 0000059 |
|---|---|---|---|
| Contratista: ***TES Ingenieria*** | | | |

Objeto Contractual: "Construcción, Ampliación y Reparación del Colegio Nacional María Auxiliadora, Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro" - Segundo llamado - ID N° 342.673

| **Contrato: 04/2019** | | Inicio:/ / | Finalización: / / |
|---|---|---|---|
| Días de Contrato | Transcurridos: | Efectivos: | Ausentes: |
| | Restantes: | | |
| Condiciones Climáticas Predominantes: ☐ Bueno ☐ Nublado ☒ Lluvioso | | Día de la Semana: Miércoles | Horario: |

| **Contratista** | **Fiscalización** |
|---|---|
| - Día de mucha lluvia No se trabaja. | |

| Contratista: Humberto Rodríguez | Fiscalización. Ley. Aurora Vera C. Reg. Nº 2333 |
|---|---|

Multigráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 c/ Juan Netto - Tel. 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. N°. 1130 - 1 Tal. 50x3 del 0000051 al 0000100

QUIMICO - ORIGINAL - DUPLICADO: Arch. TRIPLICADO: Talón
