Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORÁNDUM FEDIM CPI Nº 10/2020

A : **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – CPI – UEPP – MEC

De : **Arq. Favio Bareiro.** Fiscal del Lote 1 (EDI)
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – CPI – UEPP – MEC

Asunto : **Remisión de Solicitud y Aprobación de Prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas.** Empresa: Ing. Fernando Moreno – Lote N° 01 O. S. N° 02 – EDI

Fecha: : 15 de diciembre de 2020.

Por la presente los Fiscales del **LOTE N° 1 (EDI) – Concepción / Pdte. Hayes / San Pedro / Caaguazú,** de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en referencia a la **Contratación Vía Excepción N° 01/2019 "Construcción de Espacios Educativos de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas" - Plurianual – ID N° 356.937,** presenta por éste medio el **CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMATICAS** – en el plazo de ejecución de las Obras correspondientes al **Contrato N° 01/2019 - Lote N° 1 (EDI),** a cargo de la Empresa **ING. FERNANDO MORENO.**

1- CUADRO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

N°	MES	Dpto.	CANT. DE LLUVIAS - DINAC	INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras	DIAS ACUMULADOS	CON ADENDA
05	Noviembre / 2020	Concepción	9	5	14	No
		Caaguazú	7	5	12	
		San Pedro	9	6	15	
		Pdte. Hayes	10	7	17	
CANTIDAD MÁXIMA A CONSIDERAR:					17 días	Para Adenda (CAC)

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato. CGC 22.1

Prorroga de los Plazos de Ejecución:

- Fuerza Mayor.
- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: Según los Certificados de uso de Tiempo presentados por el fiscal en las Certificaciones de obra mensual, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obras correspondiente y de sus incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe con imágenes del estado debido a las inclemencias climáticas.

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. N°:
Recibido por:
DIA | MES | AÑO | HORA
15 | 12 | 2020 | 15:30

Favio D. Bareiro M.
Arquitecto

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Condiciones Generales del Contrato (CGC), apartado C Plazos

24. Inclemencias climáticas.

24.1. En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

24.2. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

24.3. Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

24.4. Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el Contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato. En este caso, la Contratante antes de los quince días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras.

2- CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS.

LOTE DE OBRAS ADJUDICADAS	LOTE 1 – EDI	CORRIMIENTO DE PLAZO DE EJECICIÓN DE LA OBRA
EMPRESA ADJUDICADA	ING. FERNANDO MORENO	
SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN DE CONTRATO – 25 DÍAS	15/09/2020
SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN DE CONTRATO – 78 DÍAS	02/12/2020
SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN DE CONTRATO – 77 DÍAS	17/02/2021
ADENDA N° 01	ADICIÓN DE RUBROS	N/A
ADENDA N° 02	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS – 7 DÍAS	24/02/2021
SOLICITUD DE ADENDA N° 03	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS – 2 DÍAS	26/02/2021
SOLICITUD DE ADENDA N° 04	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS – 5 DÍAS	03/03/2021
SOLICITUD DE ADENDA N° 05	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS – 10 DÍAS	13/03/2021
SOLICITUD DE ADENDA N° 06	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FUERZA MAYOR – 14 DÍAS	27/03/2021
SOLICITUD DE ADENDA N° 07	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS – 17 DÍAS	13/04/2021

Favio D. Bareiro M.
Arquitecto

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Corresponde remitir la contabilización de la prórroga del plazo del contrato por lluvias e incidencias del mes de noviembre del 2020, APROBADA por la fiscalización de la CPI UEPP, por INFORME TÉCNICO FEDIM N° 001/2020 del Lote 1 – Concepción, Pdte. Hayes, San Pedro y Caaguazú, por un total de diecisiete (17) días, considerando la mayor cantidad de lluvias caídas entre los cuatro Departamentos del país que conforman el Lote referenciado.

Se adjuntan copias de:

a- *Notas de la Empresa*
b- *Notificación N° 15/2020 a la Empresa*
c- *REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020, de la* ***Dirección de Meteorología e Hidrología*** *(Concepción, Silvio Pettirossi Luque, San Pedro del Ycuamandiyú, Coronel Oviedo) del mes de noviembre.*
d- *Registros de lluvias en los Libros de Obras del mes de noviembre.*
e- *Informe Fotográfico*
f- *INFORME TÉCNICO FEDIM N° 001/2020*

Atendiendo a lo solicitado y la documentación entregada por la constructora, la Fiscalización de Obras aprueba la ampliación del plazo de Ejecución del Contrato N° 09/2019 – Lote 1 – Empresa: Ing. Fernando Moreno, y dar continuidad a los trámites pertinentes.

Atentamente.

Favio D. Bareiro M.
Arquitecto

Arq. Favio Bareiro
Fiscal Lote 1 (EDI)
CPI – UEPP - MEC

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UEPP - MEC				
INFORME TÉCNICO FEDIM N° 001/2020				
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS			PERIODO: NOVIEMBRE/2020	
Contrato Vía Excepción N° 01/2019 "Construcción de Espacios Educativos de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas" – Plurianual – ID N° 356.937				
CONTRATISTA:	ING. FERNANDO MORENO			
CONTRATO N°	09/2019			
MONTO CONTRATO GS.:	Mínimo: 3.146.209.975 Gs. Máximo: 6.292.419.951Gs.			
PLAZO:	310 días			
PROYECTO:	Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado.			
FISCALIZACIÓN:	CPI – UEPP – MEC			
CUADRO GENERAL DE INSTITUCIONES – LOTE 1				
INSTITUCIÓN AFECTADA:	EB N° 592 "San Juan Bosco"	EB N° 1251 "San Francisco de Asis"	EB N° 568 " Las Residentas"	EB N° 182 "Dr. Antoliano Garcete"
DEPARTAMENTO:	Concepción	Caaguazú	San Pedro	Pdte. Hayes
DISTRITO:	Concepción	Caaguazú	San Estanislao	José Falcón

REGISTRO LIBRO DE OBRAS – DÍAS DE INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS		
FECHA	REGISTRO ASENTADO EN EL LIBRO DE OBRAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
08/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 592 "San Juan Bosco" – Concepción
08/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 1251 "San Francisco de Asis" – Caaguazú
08/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 568 " Las Residentas" – San Pedro
08/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 182 "Dr. Antoliano Garcete" – Pdte. Hayes
09/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 592 "San Juan Bosco" – Concepción
09/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 1251 "San Francisco de Asis" – Caaguazú
09/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 182 "Dr. Antoliano Garcete" – Pdte. Hayes
10/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 592 "San Juan Bosco" – Concepción
10/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 568 " Las Residentas" – San Pedro
10/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 182 "Dr. Antoliano Garcete" – Pdte. Hayes
14/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 592 "San Juan Bosco" – Concepción
14/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 1251 "San Francisco de Asis" – Caaguazú
14/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 568 " Las Residentas" – San Pedro
14/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 182 "Dr. Antoliano Garcete" – Pdte. Hayes
15/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 592 "San Juan Bosco" – Concepción
15/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 568 " Las Residentas" – San Pedro
15/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 182 "Dr. Antoliano Garcete" – Pdte. Hayes

Favio D. Bareiro M.
Arquitecto

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

17/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 592 "San Juan Bosco" – Concepción
17/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 1251 "San Francisco de Asis" – Caaguazú
17/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 568 " Las Residentas" – San Pedro
17/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 182 "Dr. Antoliano Garcete" – Pdte. Hayes
18/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 592 "San Juan Bosco" – Concepción
18/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 568 " Las Residentas" – San Pedro
25/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 1251 "San Francisco de Asis" – Caaguazú
25/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 182 "Dr. Antoliano Garcete" – Pdte. Hayes
26/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 592 "San Juan Bosco" – Concepción
26/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 1251 "San Francisco de Asis" – Caaguazú
26/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 568 " Las Residentas" – San Pedro
26/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 182 "Dr. Antoliano Garcete" – Pdte. Hayes
29/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 592 "San Juan Bosco" – Concepción
29/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 1251 "San Francisco de Asis" – Caaguazú
29/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 568 " Las Residentas" – San Pedro
29/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 182 "Dr. Antoliano Garcete" – Pdte. Hayes
30/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 1251 "San Francisco de Asis" – Caaguazú
30/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 568 " Las Residentas" – San Pedro
30/11/2020	Sin actividad en obra por lluvia	EB N° 182 "Dr. Antoliano Garcete" – Pdte. Hayes

IMÁGENES DEL INFORME DE LAS INCIDENCIAS DE LAS LLUVIAS POR INSTITUCIÓN

EB N° 592 "San Juan Bosco" – Concepción

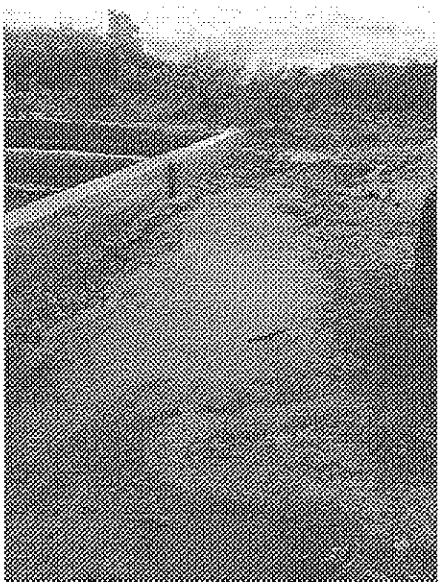

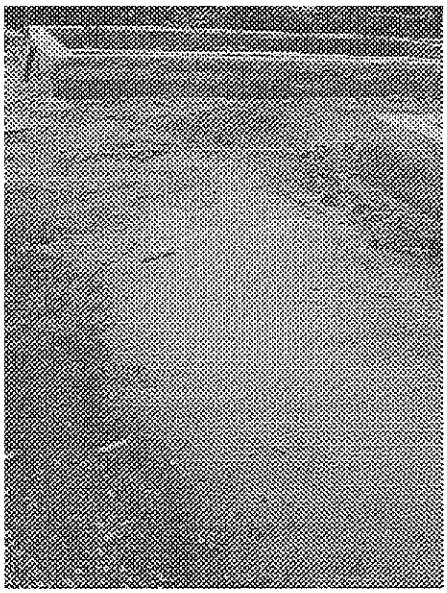

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la formación [illegible] interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Favio D. Barreiro M.
Arquitecto

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

EB N° 1251 "San Francisco de Asis" – Caaguazú

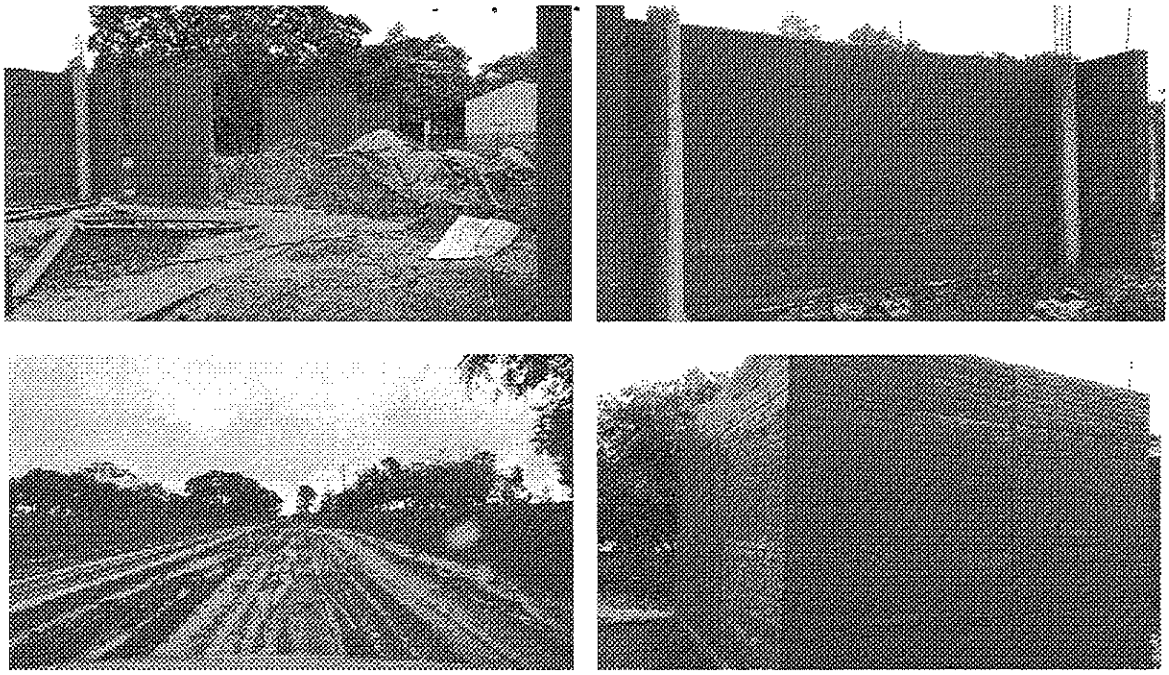

EB N° 568."Las Residentas" – San Pedro

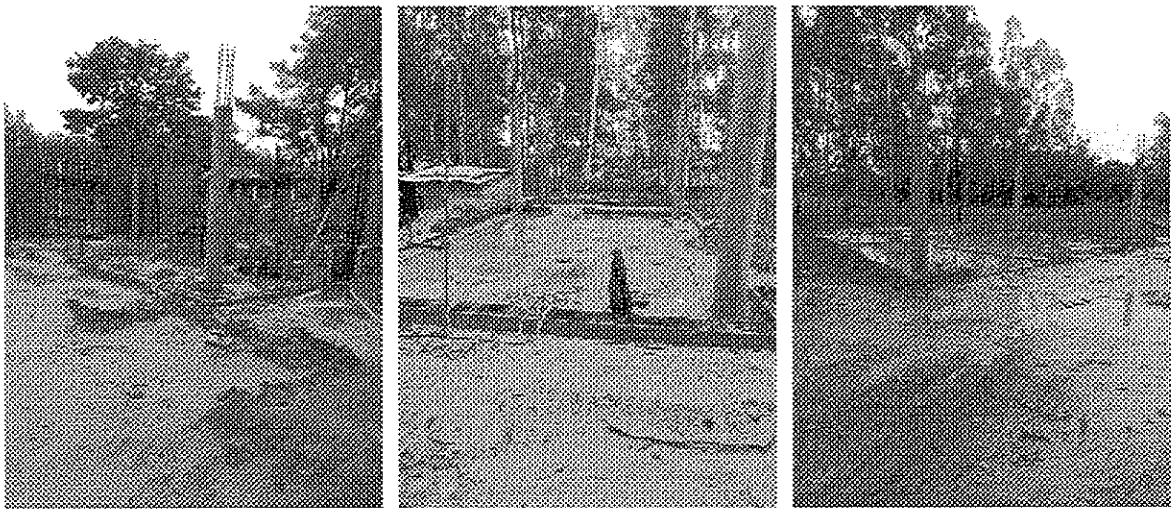

Silvio D. Bareiro M.
Arquitecto

EB N° 182 "Dr. Antoliano Garcete" – Pdte. Hayes

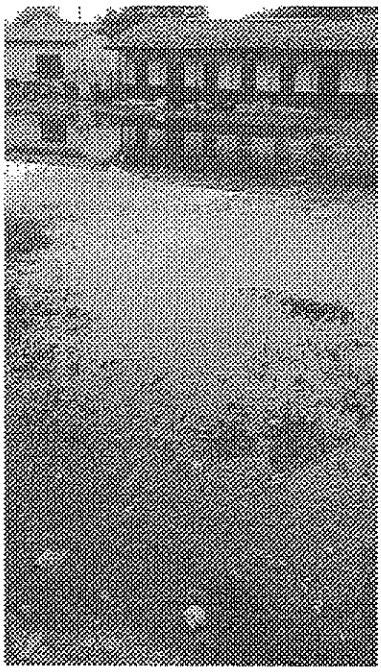

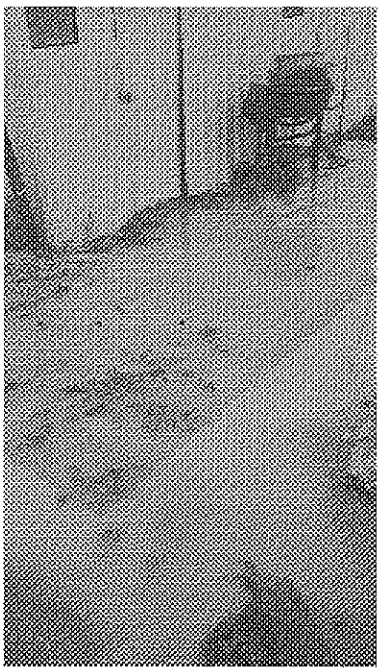

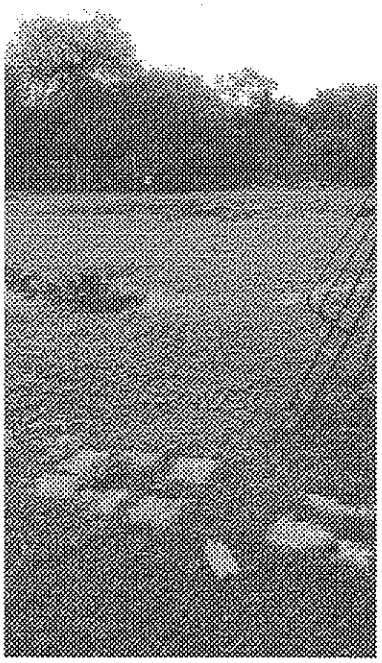

CORRIMIENTO SOLICITADO			
FECHA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO HASTA LA ÚLTIMA SOLICITUD:	27/03/2021	FECHA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO CON AMPLIACIÓN SOLICITADA:	13/04/2021

CONCLUSIÓN

Considerando lo expuesto se concluye, según las circunstancias alegadas, que estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras, por lo tanto:

La cantidad considerada de días de prórroga por lluvias caídas son de Diez (10) días. Debidamente avalados por los registros de la DINAC y asentados en el libro de obras. Correspondientes al Departamento de Presidente Hayes, que presenta la mayor afectación entre los componentes del Lote.

La cantidad considerada de días de prórroga por incidencias de las lluvias caídas son de Siete (07) días. Debidamente avalados por registro fotográfico de cada sitio y asentados en el libro de obras. Correspondientes al Departamento de Presidente Hayes, que presenta la mayor afectación entre los componentes del Lote.

La Fiscalización del Lote 1 EDI, recomienda conceder la prórroga por inclemencias climáticas solicitada por la Empresa Ing. Fernando Moreno, por 17 (diecisiete) días por el mes de NOVIEMBRE.

Favio D. Barreiro M.
Arquitecto

DOCUMENTOS ADJUNTOS: - Copias de las Notas de la Empresa. - Copia de Notificación N° 15/2020 a la Empresa - Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2020 del mes de noviembre, de la DINAC. - Copia de Informe fotográfico - Copia de los Libros de obras.
Ese es nuestro informe.
Favio D. Bareiro M. Arquitecto **Arq. Favio Bareiro** *Fiscal de Obras EDI Lote 1* *(Caaguazú y Presidente Hayes)* *CPI – UEPP – MEC*

Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

NOTIFICACIÓN N° 15/2020

UEPP/CPI/ EDI | L1

Asunción, 08 de diciembre de 2020.-

Señores
Ing. FERNANDO MORENO | Representante Legal

Presentes

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en referencia a la Contratación Vía Excepción N°01/2019. Contrato N°10/2019; Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas. ID:356937; En relación a la Solicitud de **PRÓRROGA POR DÍAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS**, Correspondiente al mes de **Noviembre/2020 (del 01 al 30).** Ingresado en mesa de entrada de la CPI – UEPP – MEC, en fecha 07/12/2020.

Se solicita **MEJORAR COPIAS ILEGIBLES DE LOS REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA**, emitidos por la DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC), facilitando así el proceso de análisis de dicha solicitud.

Una vez realizada dicha corrección, se solicita remitir dicha solicitud vía MESA DE ENTRADA OFICIAL de la UEPP – MEC.

Sin otro particular.

Atentamente.

Favio D. Bareiro M.
Arquitecto

Arq. Favio D. Bareiro M.
Fiscal de Obras Lote 1
CPI – UEPP – MEC

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Díaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py
