Asunción, 30 de agosto de 2022

DCV N° 2779/2022

Señores:

CONSORCIO RIO TEMBEY

Avda. Defensores del Chaco N° 524 casi Arturo Alsina, Asunción

Ref.: LLAMADO MOPC N.° 188/2019. Obras de Pavimentación tipo Asfáltico de tramos de Caminos Vecinales en los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguarí y Ñeembucú. – Ad Referéndum al PGN 2020. ID 373116. -**Lote:** 3.

Asunto: Prórroga por Casos de Fuerza Mayor

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia, en respuesta a su nota de MEU EXPEDIENTE N° 28861/2022 y a la reiteración de la misma mediante MEU EXPEDIENTE N° 37010/2022 de fecha 16/08/2022, en la cual solicitan prórroga de la fecha de terminación de las Obras, a consecuencia del tiempo transcurrido para la aprobación del Convenio Modificatorio N°1 por parte del Ministerio.

Considerando las verificaciones realizadas por el Supervisor, en memorándum de fecha 17 de agosto de 2022, y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) cláusulas: N° 22.1 - Prorroga de los Plazos de Ejecución; N° 22.2 - Prórroga de los Plazos de Ejecución; y N° 23.1 - Casos de Fuerza Mayor, se aclara cuanto sigue:

Fecha	Movimiento del Expediente	Días Transcurridos
10/05/2021	Ingresa el CM N°1 al MOPC por Mesa de Entrada con MEU N° 19569/2021	70
19/07/2021	Observaciones de la DCV a la Contratista, solicitando correcciones y documentos faltantes	
13/12/2021	Expediente del CMN°1 es enviado al VMOP por parte de la DCV	79
02/03/2022	Aprobación del CMN°1 mediante Contrato N°25/2022	
	Total Días	**149**

Ing. César Núñez Yegek
Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

PC

Sin embargo, considerando lo establecido en el Decreto N°4614//2020 "POR EL CUAL SE COMPLEMENTAN DISPOSICIONES SOBRE PROYECTOS DE CONTINUIDAD REESTRUCTURADOS Y AUTORIZADOS BAJO EL REGIMEN ANTERIOR Y DE SIMPLIFICACIÓN ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 2025/2019", el plazo no podrá ser extendido al año 2023.

En atención a lo expuesto, esta dirección aprueba la prórroga solicitada, y otorga 120 (ciento veinte) días por Casos de Fuerza Mayor, a contar a partir de la última fecha de finalización de plazo de ejecución aprobada (02/09/2022), por lo cual la nueva fecha de terminación de obras queda establecida el **31 de Diciembre del 2022.**

Se adjunta la curva y cronograma físico financiero aprobados.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOPC DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. César Núñez Yeger
Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales

LLAMADO UEP MOPC Nº 188/2018. OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES E

Lote Nº 3: San Vicente - M

CURVA DE AVANCE FISICO -

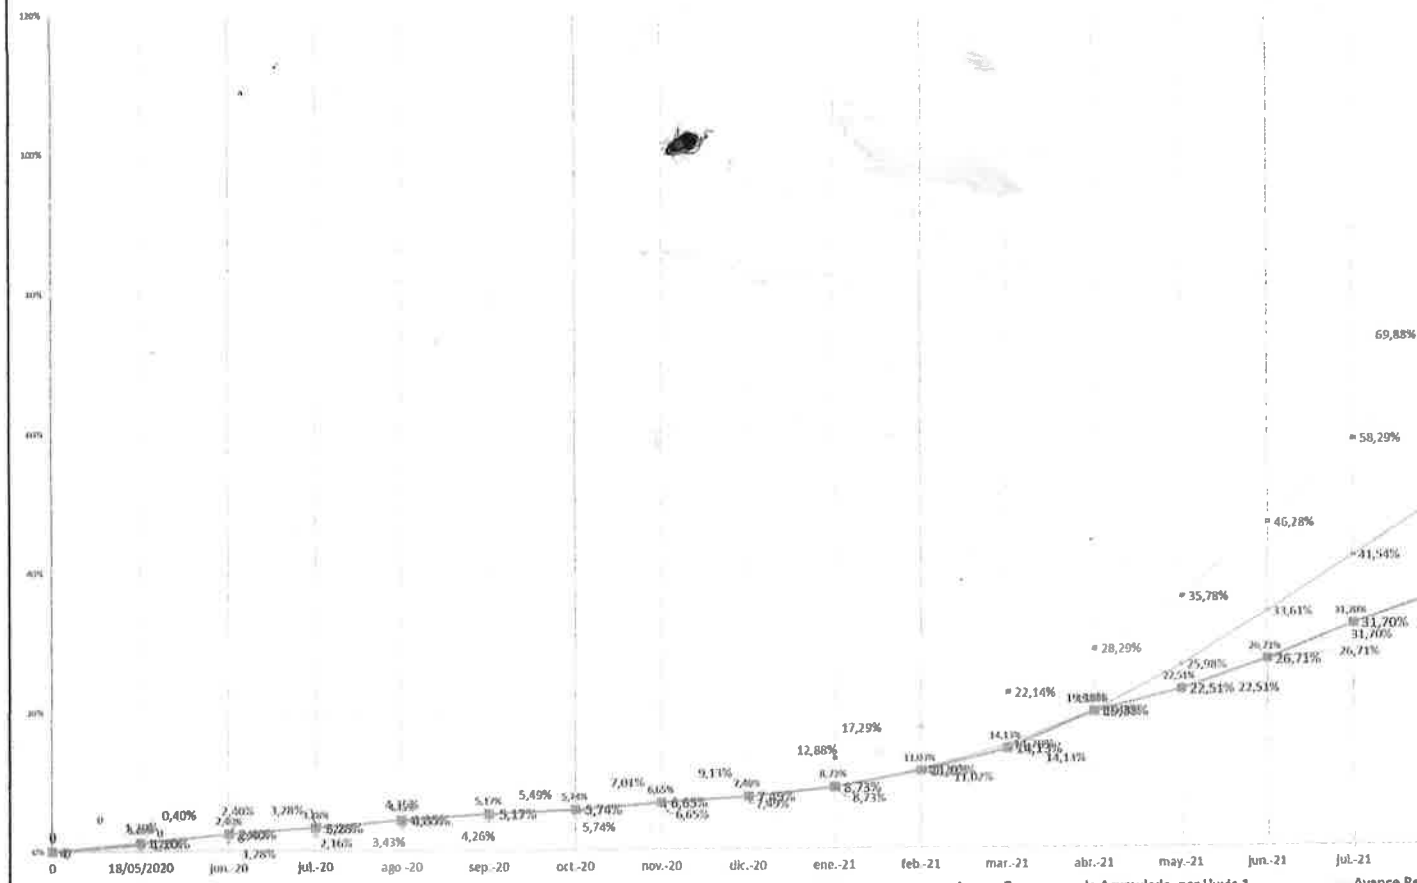

	18/05/2020	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-
Avance Programado Contractual (Apm)	0,40%	0,80%	0,69%	1,07%	0,03%	1,23%	1,52%	2,12%	3,75%	4,41%	4,85%	6,15%	7,40%	10,0
Avance Programado Acumulado Contractual	0,40%	1,20%	2,10%	3,43%	4,26%	5,49%	7,01%	9,13%	12,88%	17,29%	22,14%	28,29%	35,78%	46,2
Avance Programado por Lluvia 1	1,20%	1,20%	0,88%	1,07%	0,82%	0,57%	0,91%	0,84%	1,24%	2,29%	3,50%	4,78%	6,50%	7,6
Avance Reprogramado Acumulado por Lluvia 1	1,20%	2,40%	3,28%	4,35%	5,17%	5,74%	6,65%	7,49%	8,73%	11,20%	14,70%	19,48%	25,98%	33,6
Avance Reprogramado por CERC 1 + LLUVIA 2	1,20%	1,20%	0,88%	1,07%	0,82%	0,57%	0,91%	0,84%	1,24%	2,29%	3,11%	5,25%	3,13%	4,2
Avance Reprogramado Acumulado por CERC 1 + LLUVIA 2	1,20%	2,40%	3,28%	4,35%	5,17%	5,74%	6,65%	7,49%	8,73%	11,02%	14,13%	19,38%	22,51%	26,7
Avance Reprogramado por FUERZA MAYOR	1,20%	1,20%	0,88%	1,07%	0,82%	0,57%	0,91%	0,84%	1,24%	2,29%	3,11%	5,25%	3,13%	4,2
Avance Reprogramado Acumulado por FUERZA MAYOR	1,20%	2,40%	3,28%	4,35%	5,17%	5,74%	6,65%	7,49%	8,73%	11,02%	14,13%	19,38%	22,51%	26,7
Avance Reprogramado por LLUVIA 3	1,20%	1,20%	0,88%	1,07%	0,82%	0,57%	0,91%	0,84%	1,24%	2,29%	3,11%	5,25%	3,13%	4,2
Avance Reprogramado Acumulado por LLUVIA 3	1,20%	2,40%	3,28%	4,35%	5,17%	5,74%	6,65%	7,49%	8,73%	11,02%	14,13%	19,38%	22,51%	26,7
Avance Reprogramado por LLUVIA 4	1,20%	1,20%	0,88%	1,07%	0,82%	0,57%	0,91%	0,84%	1,24%	2,29%	3,11%	5,25%	3,13%	4,2
Avance Reprogramado Acumulado por LLUVIA 4	1,20%	2,40%	3,28%	4,35%	5,17%	5,74%	6,65%	7,49%	8,73%	11,02%	14,13%	19,38%	22,51%	26,7
Avance Reprogramado	1,20%	1,20%	0,88%	1,07%	0,82%	0,57%	0,91%	0,84%	1,24%	2,29%	3,11%	5,25%	3,13%	4,2
Avance Reprogramado Acumulado	1,20%	2,40%	3,28%	4,35%	5,17%	[illegible]	6,65%	7,49%	8,73%	11,02%	14,13%	19,38%	22,51%	26,7

Ing. Jorge Feguseira
Representante Legal
Consorcio Río Tembey

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

25(veinticinco)

DS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU / AD REFERÉNDUM AL PGN 2020.

anó. Longitud: 23,948 km.

IANCIERO REPROGRAMADO

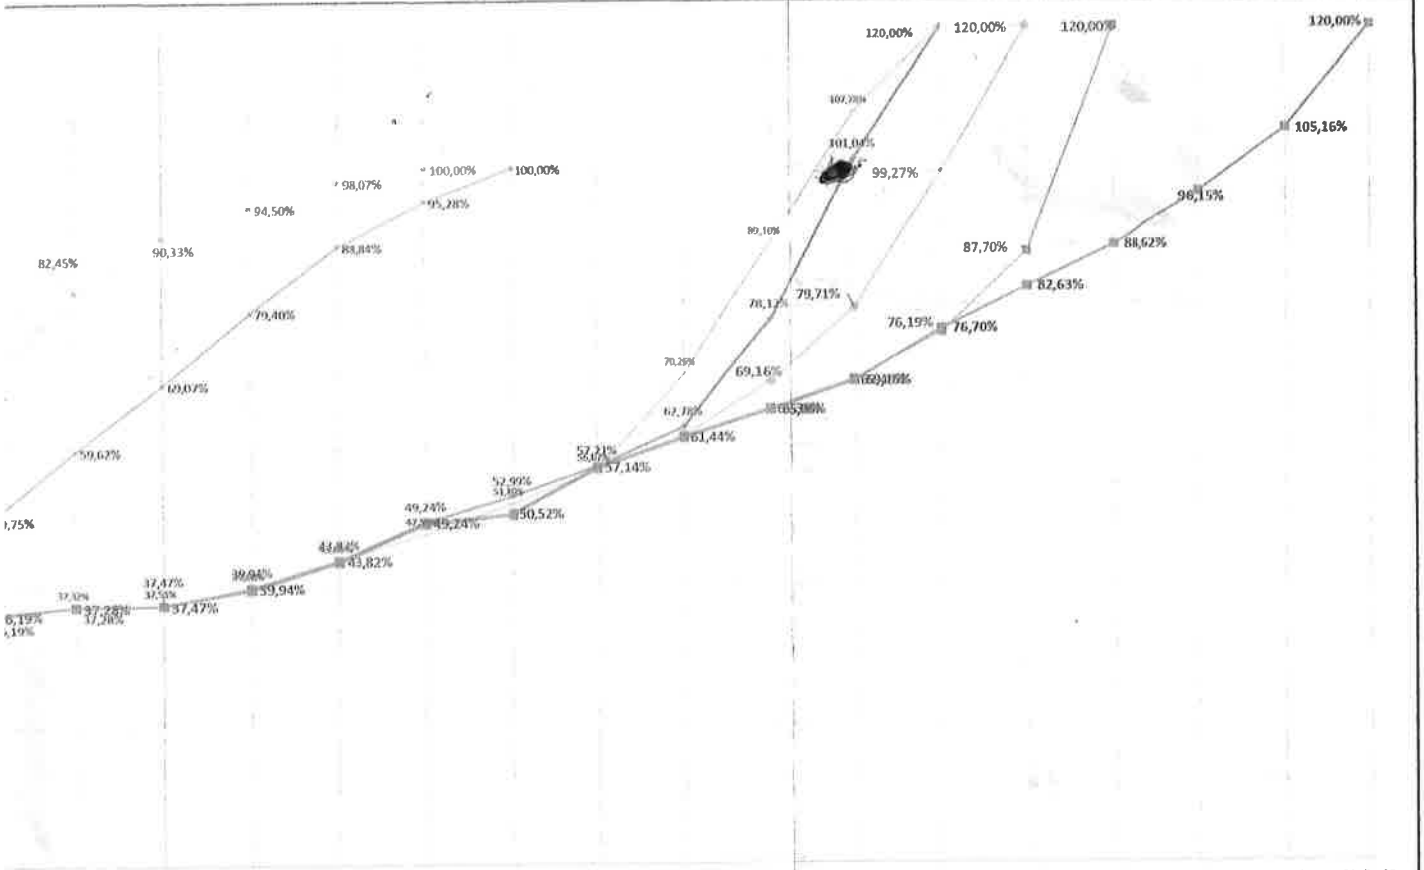

1 sep.-21 oct.-21 nov.-21 dic.-21 ene.-22 feb.-22 mar.-22 abr.-22 may.-22 jun.-22 jul.-22 ago.-22 sep.-22 oct.-22 nov.-22 31-dic.-22

mado Acumulado por CMN°1 + LLUVIA 2 · Avance Reprogramado Acumulado por LLUVIA 3 · Avance Reprogramado Acumulado por LLUVIA 4 · Avance Reprogramado

jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	31-dic-22
12,01%	11,56%	12,57%	7,88%	4,17%	3,57%	1,93%											
58,29%	69,88%	82,45%	90,33%	94,50%	98,07%	100,00%											
7,93%	8,21%	9,87%	9,45%	10,33%	9,44%	6,44%	4,72%										
41,54%	49,75%	59,62%	69,07%	79,40%	88,84%	95,28%	100,00%										
4,99%	4,49%	1,09%	0,19%	2,47%	3,88%	3,60%	4,34%	4,78%	13,50%	18,84%	18,68%	12,21%					
31,78%	36,19%	37,32%	37,51%	39,98%	43,80%	47,55%	51,89%	56,67%	70,28%	88,10%	107,78%	119,90%					
4,99%	4,49%	1,09%	0,19%	2,47%	3,88%	5,42%	3,76%	4,22%	6,67%	15,34%	22,92%	18,98%					
31,78%	36,19%	37,28%	37,47%	39,94%	43,82%	49,24%	52,99%	57,21%	62,78%	78,12%	101,04%	120,00%					
4,99%	4,49%	1,09%	0,19%	2,47%	3,88%	5,42%	1,28%	6,62%	4,30%	7,72%	10,65%	19,68%	20,73%				
31,78%	36,19%	37,28%	37,47%	39,94%	43,82%	49,24%	50,52%	57,14%	61,44%	69,16%	79,71%	99,27%	120,00%				
4,99%	4,49%	1,09%	0,19%	2,47%	3,88%	5,42%	1,28%	6,62%	4,30%	3,82%	4,09%	8,74%	11,61%	32,30%			
31,78%	36,19%	37,28%	37,47%	39,94%	43,82%	49,24%	50,52%	57,14%	61,44%	64,38%	69,45%	76,19%	87,70%	120,00%			
4,99%	4,49%	1,09%	0,19%	2,47%	3,88%	5,42%	1,28%	6,62%	4,30%	3,82%	4,09%	7,65%	6,85%	5,99%	7,53%	9,01%	14,84%
31,78%	36,19%	37,28%	37,47%	39,94%	43,82%	49,24%	50,22%	56,84%	61,14%	64,96%	69,15%	76,70%	82,63%	88,62%	96,19%	105,16%	120,00%

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obra
D.C.V. - M.O.P.C.

Ing. César Núñez Yeger
Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

CRONOGRAMA D

LLAMADO UEP Nº 188/2018 "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS

LOTE Nº 3: San Vicente - M

COD	ITEM	may-2020	jun-2020	jul-2020	ago-2020	sep-2020	oct-2020	nov-2020	dic-2020	ene-2021	feb-2021	mar-2021	abr-2021	may-2021	jun-2021
	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1	Desbroce, desmonte y limpieza			0,02%	0,01%	0,01%					0,04%	0,04%	0,03%		
2	Excavación no clasificada					0,06%						0,06%	0,02%		
3	Excavación de zanjas de drenajes											0,03%	0,01%		
4	Excavación Estructural											0,02%			
5	Terraplén			0,55%	0,77%	0,75%	0,57%	0,42%	0,28%	0,37%	0,67%	0,80%	0,81%	0,73%	0,80%
	OBRAS DE DRENAJE														
	Alcantarillas celulares hormigón armado														
6	Alcantarilla celular simple de HºAº de 1,00 x 1,00 m										0,03%	0,02%	0,06%		
7	Alcantarilla Celular Simple de HºAº 1,50 m x 1,50 m										0,05%	0,12%			
8	Alcantarilla celular doble de HºAº de 1,00 x 1,00 m											0,05%	0,06%		
9	Alcantarilla Celular Doble de HºAº 1,50 m x 1,50 m											0,18%	0,49%		
10	Cabeceras de HºAº para alcantarillas celulares										0,04%	0,19%	0,29%		
11	Cuneta Revestida de hormigón														0,06%
12	Disipadores de hormigón														
13	Badenes de hormigón														
14	Cordon cuneta de hormigón														
	Alcantarillas celulares hormigón armado														
15	Alcantarilla tubular simple de HºAº Ø 0,80 m												0,03%		0,03%
16	Cabeceras para alcantarillas tubulares												0,01%		0,01%
17	Plateas de Hº simple para alcantarillas tubulares												0,01%		0,00%
	PAQUETE ESTRUCTURAL														
18	Sub-base granular estabilizada (CBR ≥ 60%)							0,49%	0,57%	0,86%	1,16%	1,23%	1,17%	0,67%	0,81%
19	Base Granular (CBR ≥ 100%)												1,82%	1,35%	2,08%
20	Riego de Imprimación												0,32%	0,24%	0,33%
21	Riego de Liga														
22	Tratamiento Superficial Simple (en accesos laterales)														
23	Tratamiento Superficial Simple (en banquina)														
24	Concreto Asfáltico (e = 5 cm.)														
	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
25	Cordon de hormigón simple														
	SENALIZACION														
26	Señalización horizontal														
27	Señalización vertical														
28	Tacha y Tachones reflectantes														
29	Mojon de kilometraje														
30	Baranda de defensa metálica														
31	Baranda de HºAº														
32	Construcción de alambrado										0,21%	0,26%	0,09%	0,05%	0,06%
33	Traslado de Alambrado									0,02%	0,08%	0,10%	0,04%		0,00%
34	Traslado de estructuras del servicio público										0,02%	0,01%			
	PUENTES DE HºAº														
	Puente de HºAº - L: 15,0 m sobre Aº San Antonio, (Prog 5+823 del tramo B)														
	MOVIMIENTO DE SUELOS														
35	Excavación no clasificada (Zona de puentes)														
	INFRAESTRUCTURA														
36	Cabezales de estribos														
	MESOESTRUCTURA														
37	Contrafuertes de HºAº y losas de acceso (Hº Clase C25)														
	SUPERESTRUCTURA														
38	Baranda prefabricada de HºAº L=2,08 m (Hº Clase C25 / 21 Kg														
39	Veredas (Hº Clase C25)														
40	Hormigón Superestructura - Vigas Longitudinales y tableros														
41	Hormigón capa de desgaste (Hº Clase C25)														
42	Izado de vidas prefabricadas														
	VARIOS														
43	Hormigón ciclópeo														
44	Mampostería de piedra bruta (Relleno contrafuertes)														
45	Dren (3,10 m x 0,50 m)														
46	Apoyos de Neopreno														
47	Junta de dilatación														
48	Acero para refuerzo (Puentes)														
	Puente de HºAº - L: 15,0 m sobre Aº Tuma, (Prog 11+072 del tramo B)														
	MOVIMIENTO DE SUELOS														
49	Excavación no clasificada (Zona de puentes)														
	INFRAESTRUCTURA														
50	Cabezales de estribos														
51	Pilotes de HºAº Ø =1,00 m (Hº Clase C25)														
	MESOESTRUCTURA														
52	Contrafuertes de HºAº y losas de acceso (Hº Clase C25)														
	SUPERESTRUCTURA														
53	Baranda prefabricada de HºAº L=2,08 m (Hº Clase C25 / 21 Kg														
54	Veredas (Hº Clase C25)														
55	Hormigón Superestructura - Vigas Longitudinales y tableros (Hº														
56	Hormigón capa de desgaste (Hº Clase C25)														
57	Izado de vidas prefabricadas														
	VARIOS														
58	Hormigón ciclópeo														
59	Mampostería de piedra bruta (Relleno contrafuertes)														
60	Dren (3,10 m x 0,50 m)														
61	Apoyos de Neopreno														
62	Junta de dilatación														
63	Acero para refuerzo (Puentes)														
	Puente de HºAº - L: 15,0 m (Prog 2+834 del tramo B) (incluye demolicion de puente de L:12,0 m y diseño de puente nuevo)														
	MOVIMIENTO DE SUELOS														
64	Excavación no clasificada (Zona de puentes)														
	INFRAESTRUCTURA														
65	Cabezales de estribos														
66	Pilotes de HºAº Ø =1,00 m (Hº Clase C25)														
	MESOESTRUCTURA														
67	Contrafuertes de HºAº y losas de acceso (Hº Clase C25)														
	SUPERESTRUCTURA														
68	Baranda prefabricada de HºAº L=2,08 m (Hº Clase C25 / 21 Kg														
69	Veredas (Hº Clase C25)														
70	Hormigón Superestructura - Vigas Longitudinales y tableros														
71	Hormigón capa de desgaste (Hº Clase C25)														
72	Izado de vidas prefabricadas														
	VARIOS														
73	Hormigón ciclópeo														
74	Mampostería de piedra bruta (Relleno contrafuertes)														
75	Dren (3,10 m x 0,50 m)														
76	Apoyos de Neopreno														
77	Junta de dilatación														
78	Acero para refuerzo (Puentes)													0,07%	
79	Demolición de puente existente de L: 12,0 m.														
80	Diseño de proyecto de puente de L: 15,0 m.														
81	Reparacion Puente de H°A° - L: 100,0 m (prog 3+149 del														

Ing. Jorge Requeiro
Representante Legal
Consorcio Río Tembey

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DOV - MOPC

24 (veinticuatro)

CTIVIDADES
ARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020."
ané; Long: 23,948 Km

Afectación Mensual

ul-2021	ago-2021	sep-2021	oct-2021	nov-2021	dic-2021	ene-2022	feb-2022	mar-2022	abr-2022	may-2022	jun-2022	jul-2022	ago-2022	sep-2022	oct-2022	nov-2022	31-dic-22
									0.03%		0.04%	0.04%	0.02%				
													0.04%				
0.01%	0.02%	0.01%			0.02%						0.01%	0.01%	0.00%				
						0.01%		0.06%			0.00%	0.00%	0.00%				
0.78%	0.62%	0.21%								0.25%	0.29%	0.64%	0.47%	0.50%	0.91%		
											-0.09%						
								0.73%				0.07%	0.00%				
0.09%	0.05%	0.07%		0.11%	0.05%				0.04%	0.22%	0.16%	0.10%	0.28%	0.40%	0.40%	0.52%	
											0.05%	0.05%	0.13%	0.25%	0.25%		
													0.07%				
				0.03%	0.03%							0.03%	0.04%				
				0.01%	0.01%							0.01%	0.01%				
				0.01%	0.01%							0.01%	0.01%				
1.31%	1.04%	0.20%			0.98%	1.18%	0.69%		0.51%	0.20%	0.30%	1.09%	0.75%	0.83%	1.08%	1.08%	0.92%
2.35%	2.25%	0.30%			0.97%	1.82%	0.50%	0.37%	0.75%	0.28%	0.28%	0.93%	1.00%	1.31%	1.51%	2.81%	3.79%
0.40%	0.40%	0.05%			0.17%	0.32%	0.09%	0.07%	0.13%	0.05%	0.06%	0.17%	0.42%	0.42%	0.42%	0.22%	0.23%
				0.11%	0.09%	0.09%		0.02%	0.09%	0.09%	0.08%	0.14%	0.12%	0.10%	0.21%	0.21%	0.09%
						0.26%				0.21%	0.10%	0.20%	0.50%	0.51%	0.50%		
				1.86%	1.56%	1.56%		0.35%	1.48%	1.60%	1.30%	2.42%	1.00%	1.01%	1.57%	3.57%	5.43%
																	0.95%
																	0.30%
																	0.28%
																	2.07%
0.03%	0.11%	0.07%	0.12%	0.01%				0.13%	0.02%								
	0.00%		0.00%	0.01%		0.07%		0.02%									
											0.00%						0.06%

23 (veintitres)

CTIVIDADES
ARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020."
ná; Long: 23,948 Km

Afectación Mensual

ol-2021	ago-2021	sep-2021	oct-2021	nov-2021	dic-2021	ene-2022	feb-2022	mar-2022	abr-2022	may-2022	jun-2022	jul-2022	ago-2022	sep-2022	oct-2022	nov-2022	31-dic-22
																	0,00%
								1,34%	0,24%				0,14%	0,10%			
								0,34%					0,26%	0,16%	0,13%		
								0,27%			0,13%						
								0,11%				0,11%					
								0,44%				0,15%					
								0,12%									
								0,20%									
								0,09%				0,01%			0,04%		
								0,64%	0,31%	0,42%	0,26%	0,26%	0,03%	0,10%			
								0,27%	0,33%	0,14%	0,42%	0,44%	0,20%	0,30%	0,44%	0,59%	0,70%
									0,04%								
								0,04%									
								0,11%									
								0,11%									
											0,02%						
								0,21%									
								0,27%			0,17%						
									0,08%	0,17%	0,04%						
												0,02%					
													0,02%				
												0,08%					
												0,02%					
											0,35%	0,35%					
										0,05%							
									0,01%								
												0,03%					
												0,01%					
								0,11%	0,13%	0,10%	0,23%						
												0,06%					
										0,03%							
								0,05%									
								0,07%			0,17%						
										0,03%							
													0,06%				
										0,01%							
											0,14%						

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
4,99%	4,49%	1,09%	0,19%	2,17%	3,88%	5,42%	1,28%	6,62%	4,30%	3,92%	4,09%	7,55%	5,93%	5,99%	7,53%	9,01%	14,84%
31,70%	36,19%	37,28%	37,47%	39,64%	43,52%	48,94%	50,22%	56,84%	61,14%	65,06%	69,15%	76,70%	82,63%	88,62%	96,15%	105,16%	120,00%

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obra
D.C.V. - M.O.P.C.

Ing. César Núñez Yeger
Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

CRONOGRAMA D

LLAMADO UEP Nº 188/2018 "OBRAS DE PAVIMENTACIÒN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS D

LOTE Nº 3: San Vicente - Mo

		18/05/2020	jun-2020	jul-2020	ago-2020	sep-2020	oct-2020	nov-2020	dic-2020	ene-2021	feb-2021	mar-2021	abr-2021	may-2021	jun-2021
	MOVILIZACION (CONSIDERANDO 3% DEL COSTO DE OBRAS)														
82	Movilización (3%)	1,20%	1,20%	0,30%	0,30%										
	NUEVOS ITEMS														
83	Cañerías de Agua														
84	Empastado														
85	Alcantarilla Celular 4x2 (0m x 2,50m														
86	Alcantarilla Celular triple de H° A° de 1,00 x 1,00 m.														
87	Alcantarilla Celular triple de H° A° de 1,50 x 1,50m.														
88	Alcantarilla Celular doble de H°A° de 2,00 x 2,00 m														
89	Alcantarilla Celular simple de H°A° de 2,50 x 2,50 m														
90	Contrapiso de H° - Cabecera Alcantarillas Celulares														
91	Dren Profundo														
92	Accesos Domiciliarios														
93	Cartel de Obra														
94	Estudios Hidrológicos Puente de Hº Aº - L:100,0 m (prog 3+149 del tramo B)														
95	Estudios de Suelo Puente de Hº Aº - L:100,0 m (prog 3+149 del tramo B)														
96	Estudios Estructurales Puente de Hº Aº - L:100,0 m (prog 3+149 del trammo B)														
	Puente de HºAº - L: 25,0 m (Prog 2+811,5 del tramo B)														
	MOVIMIENTO DE SUELOS														
97	Excavación no clasificada (Zona de puentes)														
	INFRAESTRUCTURA														
98	Cabezales de estribos														
99	Pilotes de HºAº Ø =0,60 m (Hº Clase C25)														
	MESOESTRUCTURA														
100	Contrafuertes de HºAº y losas de acceso (Hº Clase C25)														
	SUPERESTRUCTURA														
101	Baranda prefabricada de HºAº L=2,08 m (Hº Clase C25 / 21 Kg														
102	Veredas (Hº Clase C25)														
103	Hormigón Superestructura														
104	Hormigón capa de desgaste (Hº Clase C25)														
105	Viga Longitudinal Pretensada L=25,00m (Incluye Armaduras y														
106	Losetas de HºAº Prefabricadas (Puentes)														
	VARIOS														
107	Dren (3,10 m x 0,50 m)														
108	Apoyos de Neopreno - V25														
109	Junta de dilatación														
110	Acero para refuerzo (Puentes)														
11	Relleno Granular Cementado														
12	Denaje en Trasdos de Muro														
113	Diseño de proyecto de puente de L: 25,0 m.														
	Puente de HºAº - L: 15,0 m sobre Aº Tuna, (Prog 11+072 del tramo B)														
114	Pilotes de HºAº Ø =0,60 m (Hº Clase C25)														
115	Losetas de HºAº Prefabricadas (Puentes)														
116	Relleno Granular Cementado														
117	Denaje en Trasdos de Muro														
118	Viga Longitudinal Pretensada L=15,00m (Incluye Armaduras)														

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO	1,20%	1,20%	0,88%	1,07%	0,82%	0,57%	0,91%	0,84%	1,24%	2,29%	3,11%	5,26%	3,13%	4,20%
AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	1,20%	2,40%	3,28%	4,35%	5,17%	5,74%	6,65%	7,49%	8,73%	11,02%	14,13%	19,38%	22,51%	26,71%

Ing. Jorge Regueiro
Representante Legal
Consorcio Rio Tembey

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC
