55(cincuenta y cinco)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

COPIA

Asunción, 30 de noviembre de 2020

D.C.V. N°3908 /2020

Señores:

Consorcio Vial San Pedro
Presente

Ref.: *Llamado MOPC N° 188/2019. "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCU".*

Contrato SG Ministro N° 114/2020 – Lote 2.

Asunto: Aprobación de prórroga de plazo por Casos de Fuerza Mayor.

Me dirijo a usted, en respuesta a vuestra nota de fecha 30 de octubre de 2020, en la cual solicita prorroga de la fecha de terminación de las obras por Casos de Fuerza Mayor, en el periodo comprendido desde marzo a agosto del corriente. Considerando las verificaciones realizadas por el Supervisor, en Memorándum de fecha 9 de noviembre de 2020, y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) clausulas: N°22.1-Prorroga de los Plazos de Ejecución; N°22.2-Prórroga de los Plazos de Ejecución; y N°23.1-Casos de Fuerza Mayor, corresponde una prórroga de 1,36 (uno coma treinta y seis) meses por Casos de Fuerza Mayor ocurridas en el periodo mencionado.

En atención a dichos informes, esta dirección aprueba la prórroga solicitada, y otorga 1,36 (uno coma treinta y seis) meses por Casos de Fuerza Mayor ocurridas en el periodo 16/03/2020 y 31/08/2020, a contar a partir de la fecha de finalización de plazo de ejecución, donde la nueva fecha de terminación queda establecida el **29 de setiembre de 2021.**

Atentamente.

RECIBIDO
Fecha: 08/12/2020 Hora: 09:40hs
Firma:

MOPC * SEDAL
DIRECCION DE CAMINOS

Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Ítems del llamado LLAMADO MOPC Nº 198/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS V

Cronograma Fis

Item	Descripción	Incidencia %	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	M
1	Deobosque, desbroce, despeje y limpieza	0,04%		30%	40%	30%		
2	Desbroce, despeje y limpieza	0,21%				25%	25%	
3	Excavación No Clasificada	0,35%				30%	40%	
4	Excavación en Roca	0,22%				50%	50%	
5	Excavación de Bolsones	0,15%				25%	25%	
6	Excavación Zanjas de Drenaje	0,09%				25%	25%	
7	Terraplén	5,47%				5%	10%	
8	Subrasante Mejorada CBR=>15% (1)	7,69%						
9	Demolición y Remoción de estructura existente	0,17%						
10	Sub-base Granular Cementado RC>2.8 Mpa	18,84%						
11	Base Granular Estabilizada CBR=>100%	18,29%						
12	Imprimación Asfáltica	3,95%						
13	Riego de liga	1,97%						
14	Tratamiento Superficial Simple en banquina	1,00%						
15	Concreto asfáltico (e= 5 cm)	21,03%						
16	Ripio en banquinas	1,65%						
17	Alcantarilla Tubular Simple de H*A* D= 0,80 m	0,04%						
18	Alcantarilla Tubular Simple de H*A* D= 1,00 m	0,04%						
19	Alcantarilla Tubular Simple de H*A* D= 1,20 m	0,06%						
20	Alcantarilla Tubular Triple de H* A* D= 1,20 m	0,14%						
21	Cabecera para alcantarillas tubulares	0,37%						
22	Plateas de H° simple para alcantarillas tubulares	0,56%						
23	Alcantarilla Celular Doble de H*A* de 2,00 x 2,00 m.	0,30%						
24	Alcantarilla Celular Triple de H*A* de 1,00 x 1,00 m.	0,49%						
25	Alcantarilla Celular Triple de H*A* de 1,50 x 1,50 m.	0,52%						
26	Alcantarilla Celular Triple de H*A* de 2,00 x 2,00 m.	0,81%						
27	Cabecera de H*A* para alcantarillas celulares	0,86%						
28	Plateas de H° simple para alcantarillas celulares	0,17%						
29	Cunetas revestidas de hormigón	0,77%						
30	Disipadores de Hormigón	0,31%						
31	Dren Profundo	0,08%						
32	Construcción de Alambrado	0,32%						
33	Traslado de Alambrado	0,16%						
34	Empastado de Taludes	1,40%						
35	Baranda de defensa metálica (Tipo Flex Beam)	1,85%						
36	Señalización Horizontal	1,60%						
37	Señalización Vertical	0,16%						
38	Pórtico de Señalización	0,30%						
39	Tachas Reflectantes Bidireccionales	0,13%						
40	Mojones de Kilometraje	0,04%						
41	Traslado de estructuras del servicio público (electricidad y teleconunicaciones)	0,57%						
42	Traslado y/o reparación de cañerías de agua	1,08%				30%	30%	
43	Traslado y/o reparación de red saneamiento/cloacal	0,66%				30%	30%	
44	Iluminación en intersección	1,47%						
45	Instalación y servicios especializados	0,49%	7%	7%	7%	7%	7%	
46	Medidas de Mitigación ambiental	1,34%		7%	7%	7%	7%	
47	Movilización (3%)	2,91%	30%	40%				
Desembolso porcentuales previstos		100,00%	0,91%	1,31%	0,14%	1,26%	1,56%	
Desembolso porcentuales previstos acumulados			0,91%	2,21%	2,36%	3,62%	5,18%	

Cronograma Fi

54(cincuenta y cuatro)

Fecha: Asuncion, 30 de Octubre del 2020

Llamado MOPC Nº 166/2019

NALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 con ID: 373116 - LOTE 2

Financiero

	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17
	25%										
	20%										
	25%										
	25%										
	15%	20%	20%	20%							
	15%	25%	20%	18%	12%						
	40%	20%									
			10%	20%	20%	22,5%	22,5%	5%			
					15%	20%	20%	15%	15%	15%	
					15%	20%	20%	15%	15%	15%	
						10%	20%	20%	20%	20%	10%
						20%	20%	20%	20%	20%	
								30%	30%	25%	15%
						25%	25%	25%	25%		
	25%	25%	25%		25%						
			100%								
		100%									
					100%						
	20%	20%	20%	20%	20%						
	20%	20%	20%	20%	20%						
	50%		25%		25%						
	25%	50%			25%						
			33%	67%							
	50%				50%						
	20%	20%	20%	20%	20%						
	20%	20%	20%	20%	20%						
					25%	25%	25%	25%			
					25%	25%	25%	25%			
		30%	30%	30%	10%						
	25%	25%	25%	25%							
	25%	25%	25%	25%							
						30%	30%	30%	10%		
								25%	25%	25%	25%
								25%	25%	25%	25%
										50%	50%
										50%	50%
										50%	50%
										50%	50%
	50%	50%									
%											
%										50%	50%
%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%		
%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%		
				20%							10%
2,38%	4,03%	4,52%	5,48%	7,48%	9,35%	9,88%	10,08%	13,20%	11,79%	11,69%	5,55%
7,55%	11,58%	16,10%	21,58%	29,06%	38,41%	48,29%	58,37%	71,57%	83,36%	94,45%	100,00%

o - Financiero

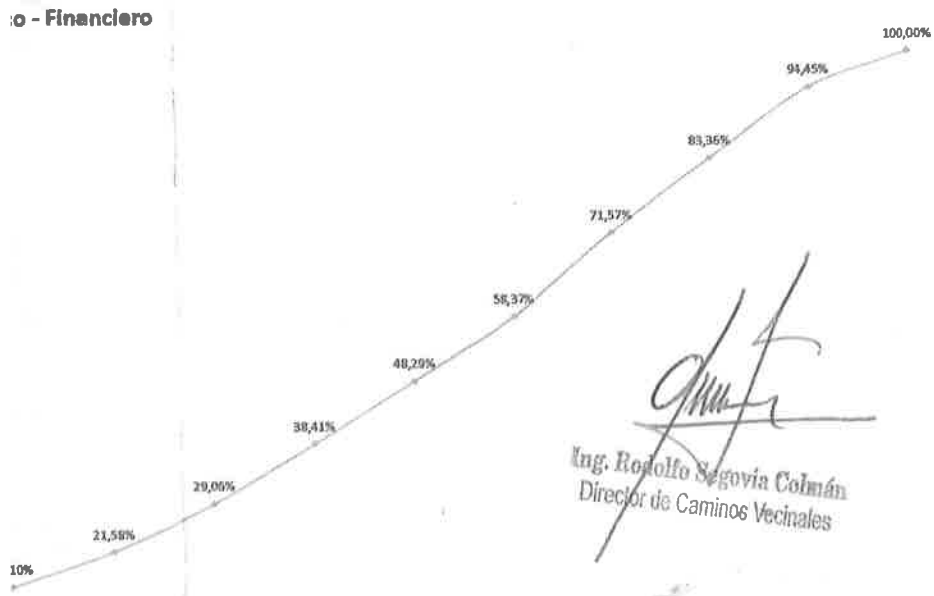

	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17
	10%	21,58%	29,06%	38,41%	48,29%	58,37%	71,57%	83,36%	94,45%	100,00%

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Ing. Edgar [illegible]
Representante Legal

CONSORCIO
VIAL SAN PEDRO
RUC: 80111215-0

LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN T
EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMA

Curva de Avance

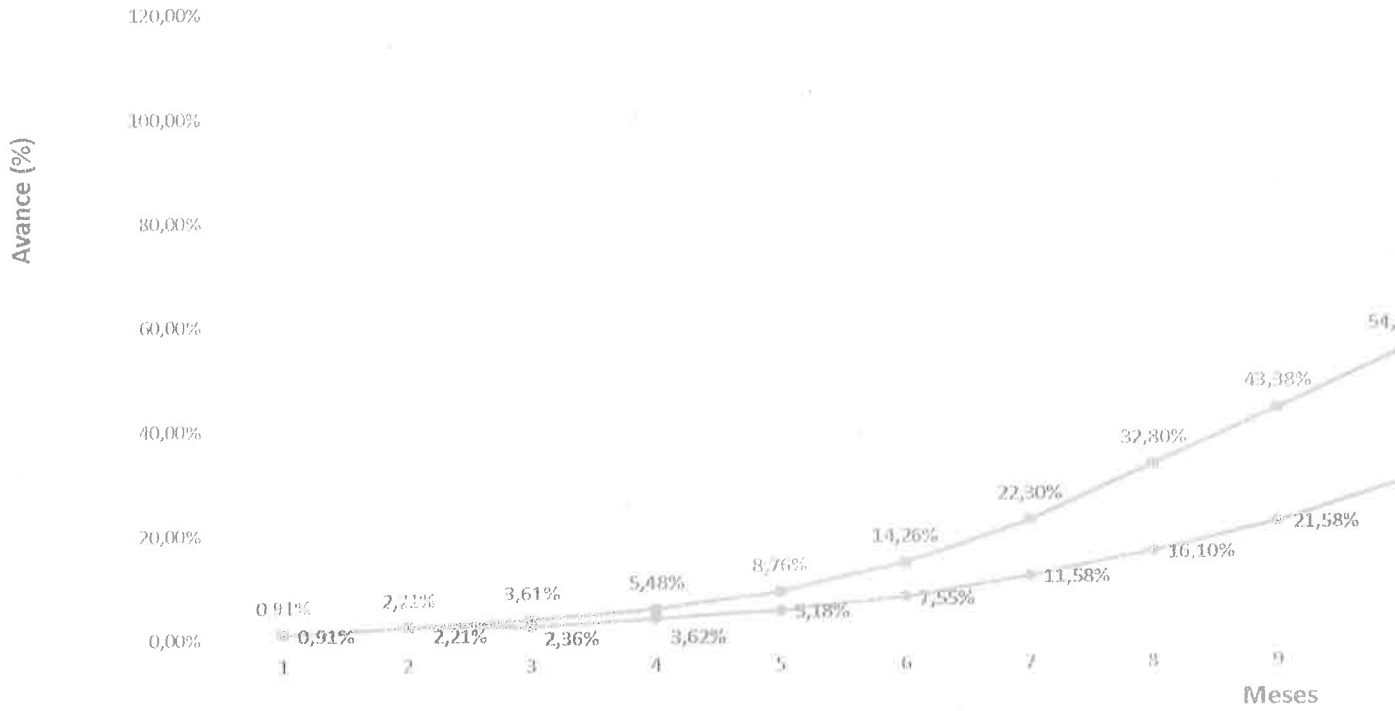

Nº Certificado	1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha de Cierre	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/202
Avance Mensual Programado	0,91%	1,31%	1,40%	1,87%	3,27%	5,50%	8,04%	10,49%
Avance Acumulado Programado	0,91%	2,21%	3,61%	5,48%	8,76%	14,26%	22,30%	32,80%
Avance Mensual Modificado	0,91%	1,31%	0,14%	1,26%	1,56%	2,38%	4,03%	4,52%
Avance Acumulado Modificado	0,91%	2,21%	2,36%	3,62%	5,18%	7,55%	11,58%	16,10%
Dias del Mes	13	30						
Dias de Lluvias y Consecuencias	0							
Dias Laborables	13	30	0	0	0	0	0	0
Dias Prorrogables	0	0	0	0	0	0	0	0
ATAm	0,91%	1,31%	1,45%	2,71%	4,27%	6,65%	10,68%	15,20%

Ing. Rodolfo Novis Coinde
Director de Control Técnico

.....
ING. EDG

53(cincuenta y tres)

'O ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES
:ION PRESUPUESTARIA CON ID: 351956. LOTE Nº2

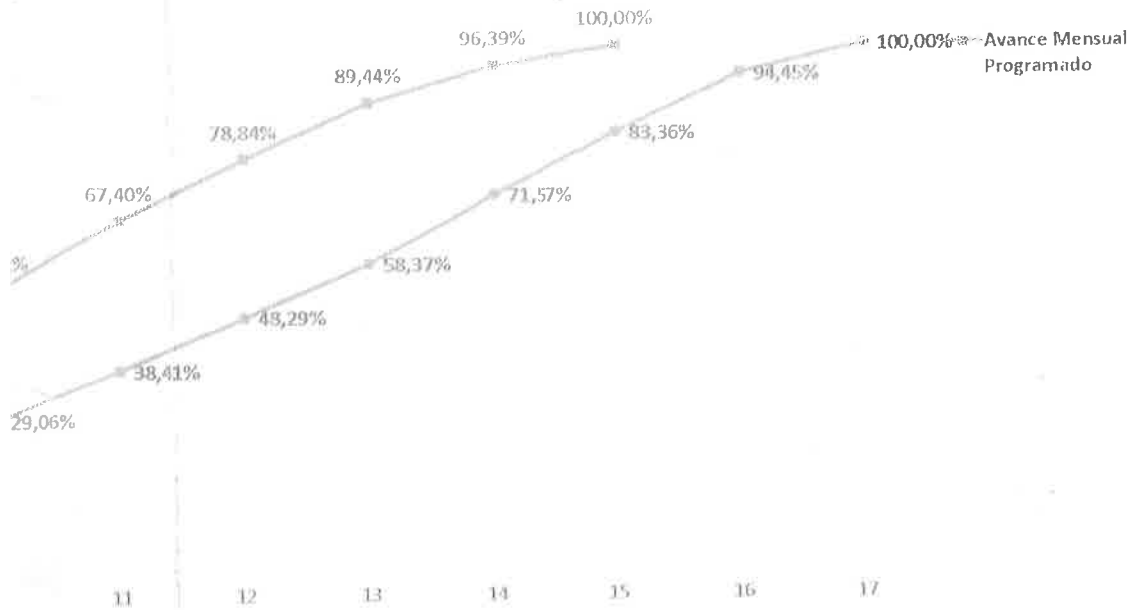

9	10	11	12	13	14	15	16	17
31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	10/09/2021
10,59%	10,83%	13,18%	11,44%	10,60%	6,95%	3,61%		
43,38%	54,22%	67,40%	78,84%	89,44%	96,39%	100,00%		
5,48%	7,48%	9,35%	9,88%	10,08%	13,20%	11,79%	11,09%	5,55%
21,58%	29,06%	38,41%	48,29%	58,37%	71,57%	83,36%	94,45%	100,00%
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0
20,68%	28,16%	37,51%	47,39%	57,47%	70,67%	59,18%		76,22%

.....
L OSVALDO ARRENS BARRIOS
:PRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

CONSORCIO
VIAL SAN PEDRO
RUC: 80111215-0

52 (cincuenta y dos)

GOBIERNO
NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 45385/2020

TITULAR:
GONCALVES VIAL SAN PEDRO

NOMBRE Y APELLIDO:
JORGE LOPEZ
TELEFONO:
021 341 383
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
LLAMADO MOPC Nº 186/2019
SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PLAZO
CONTRACTUAL

FACTURAS: Nro: Monto GS.
0 0
USUARIO RECEPCIONADORA DE REGISTRO:

FECHA: 08/06/2020 14:34:17

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoría I. ____
Secretaría Privada ____ ITGE ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAP ____
Patrulla Caminera ____ DJESA ____
C.RR.II. ____ DIya ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Dir.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Plani.Econ ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec. Energ ____ D.Rec. Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

51(cincuenta y uno)

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO

18 de julio 2350 c/ La Esperanza
Tel/fax: +595 21 331-383
e-mail: licitaciones@icsa.com.py

Asunción, 30 de octubre de 2020

Señor
ING RODOLFO SEGOVIA, DIRECTOR
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Referencia: Llamado MOPC N°188/2019 "OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU."– Lote 2. Contrato Ministro S.G. N°114/2020.
Asunto: Solicitud de ampliación del plazo contractual.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar la prórroga de 1,36 meses de plazo del contrato, en virtud a las cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato:

- 22.1: **Prórroga de los Plazos de Ejecución**, "Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de Inclemencias Climáticas."
- 22.2: **Prórroga de los Plazos de Ejecución**, "De existir situaciones de Fuerza Mayor o Inclemencias Climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación en los términos del artículo 63 de la Ley De Contrataciones Públicas."
- 23.1 **Casos de Fuerza Mayor**, "Para efectos del presente contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes."

Esta solicitud por Fuerza Mayor es a consecuencia de la PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19) y secundado por el Decreto Presidencial N°3456 "POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)". Se adjuntan los documentos que fundamentan esta solicitud.

Sin otro particular hacemos propia la ocasión para saludarle muy atentamente.

CONSORCIO
VIAL SAN PEDRO
RUC: 80111215-0

Ing. Edgar Osvaldo Ahrens Barrios
Representante Legal

50 (cincuenta)

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO

18 de julio 2350 c/ La Esperanza
Tel/fax: +595 21 331-383
e-mail: licitaciones@icsa.com.py

Determinación de las Incidencias de las Medidas Sanitarias por la Pandemia del Coronavirus (Covid-19) en el avance de obras programado.

La cuarentena por la **Pandemia del Coronavirus (Covid-19)** en Paraguay, se declaró **Emergencia Nacional** por Decreto N°3.456/2020 en todo el territorio nacional por decisión del Gobierno Nacional, en fecha lunes 16 de marzo del corriente año.

Con la declaración de **Emergencia Nacional** se impusieron **Medidas de Restricción** como así también un **Instructivo para Personal en Obras en Rutas**. A continuación, se detalla un calendario con la afectación de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

Descripción	Decreto	Articulo	Vigencia del Decreto		Mes de Afección
			Inicio	Fin	
Emergencia Nacional.	3.456	**Art 6.-** El cumplimiento del presente Decreto no afectará a las obras públicas en ejecución, cuya continuidad estará sujeta a la observancia de los protocolos sanitarios vigentes. **INSTRUCTIVO PARA PERSONAL EN OBRAS EN RUTAS.**	16-mar	-	MARZO
Emergencia Nacional.	3.456	**Art. 2°.-** Autorízase al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a disponer un aislamiento preventivo general por razones sanitarias, por el término a ser fijado por dicha autoridad de la salud, en horario comprendido desde las 21- 00 horas hasta las 04:00 horas.	21-mar	28-mar	
Aislamiento Preventivo General.	3.490	**Resolucion C.D. N°157** Se suspende temporalmente el servicio regular de transporte público de pasajeros de corta, mediana y larga	29-mar	31-mar	
Aislamiento Preventivo General.	3.490		01-abr	12-abr	ABRIL
Ampliación Aislamiento Preventivo General.	3.525	**Art 2. 7.-** Las personas afectadas a las obras públicas; y a las civiles, debiendo estas últimas activar por turnos al 50% de su fuerza laboral, notando la asistencia y aplicando los controles sanitarios vigentes. Y su cadena logística, preservando el distanciamiento social.	13-abr	19-abr	
Extensión Aislamiento Preventivo General.	3.537	**Art 2. 7.-** Las personas afectadas a la ejecución de obras públicas, así como su cadena logística, preservando el distanciamiento social.	20-abr	26-abr	
Reglamentación art. 46 de Ley 6524.	3.546	**Art 7.-** Las personas afectadas a la ejecución de obra públicas, así como su cadena logistica, preservando el distanciamiento social.	21-abr	-	
Extensión Aislamiento Preventivo General.	3.564	**Art 2. 7.-** Las personas afectadas a la ejecución de obras públicas, así como su cadena logística, preservando el distanciamiento social.	27-abr	30-abr	
Extensión Aislamiento Preventivo General.	3.564	**Art 2. 7.-** Las personas afectadas a la ejecución de obras públicas, así como su cadena logística, preservando el distanciamiento social.	01-may	03-may	MAYO
Fase 1 - Cuarentena Inteligente.	3.576	**Art 3. 7.-** Las personas afectadas a la ejecución de obras públicas, así como su cadena logística, cumpliendo el protocolo sanitario.	04-may	25-may	
Fase 2 - Cuarentena Inteligente.	3.619	**Art 3. 11.-** Ejecución de obras públicas, así como su cadena logística, cumpliendo el protocolo sanitario.	26-may	31-may	
Fase 2 - Cuarentena Inteligente.	3.619	**Art 3. 11.-** Ejecución de obras públicas, así como su cadena logística, cumpliendo el protocolo sanitario.	01-jun	14-jun	JUNIO
Fase 3 - Cuarentena Inteligente.	3.706	**Art 4. 12.-** Ejecución de obras públicas, así como su cadena logística, cumpliendo el protocolo sanitario.	15-jun	30-jun	
Fase 3 - Cuarentena Inteligente.	3.706	**Art 4. 12.-** Ejecución de obras públicas, así como su cadena logística, cumpliendo el protocolo sanitario.	01-jul	05-jul	JULIO
Extensión Fase 3 - Cuarentena Inteligente.	3.780		05-jul	19-jul	
Fase 4 - Cuarentena Inteligente.	3.835	**Art 5. 12.-** Ejecución de obras públicas, así como su cadena logística, cumpliendo el protocolo sanitario.	20-jul	31-jul	
Fase 4 - Cuarentena Inteligente.	3.835	**Art 5. 12.-** Ejecución de obras públicas, así como su cadena logística, cumpliendo el protocolo	01-ago	16-ago	AGOSTO
Extensión Fase 4- Cuarentena Inteligente.	3.943		17-ago	30-ago	

49(cuarenta y nueve)

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO
18 de julio 2350 c/ La Esperanza
Tel/fax: +595 21 331-383
e-mail: licitaciones@icsa.com.py

Es así que durante todo el periodo de cuarentena, en sus diferentes fases, hemos continuando trabajando, pero consecuentemente no en la plenitud de nuestra capacidad laboral que nos impide cumplir con los porcentajes de ejecución de nuestro cronograma de obra programado, a causa que debíamos ajustarnos en modo y forma a las estrictas recomendaciones del protocolo sanitario y a las restricciones del transporte público (urbano y de larga distancia) limitados e inclusive suspendidos en muchas zonas del país.

A continuación, tenemos la tabla de **Incidencia Negativas al Avance de Obra Programado**, en ella se detalla el efecto negativo que se tuvo en cada mes, en la **fila C** tenemos todos los totales.

Ref.	INCIDENCIA NEGATIVAS AL AVANCE DE OBRA PROGRAMADOS						
	ITEMS	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
A	Porcenaje de Incidencia por Protocolo Sanitario	15,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%
B	Suspención temporal del servicio regular de transporte público de pasajeros de corta, mediana y larga distancia.	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C=A+B	Total	15,00%	38,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%

Considerando lo expuesto al mes de setiembre 2020, durante el transcurso de la cuarentena que continua a la fecha, corresponde aplicar el siguiente cálculo para determinar el porcentaje de obra que no se pudo ejecutar por las causales expuestas y a su vez la ampliación del plazo contractual.

El cálculo consiste en multiplicar los valores obtenidos en la **fila C** de la tabla **Incidencia Negativas al Avance de Obras Programados**, por los valores de la **fila D** del **Cronograma de Obra Programado en los Meses Afectados** obteniendo así los valores de la **fila E** de la tabla **Incidencia Negativa Reflejado en el Cronograma de Obras Programado**.

Ref.	CRONOGRAMA DE OBRA PROGRAMADO EN LOS MESES AFECTADOS							
	Meses	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
D	Porcentaje de Avance Programado Contractual	0,00%	0,00%	0,91%	2,21%	3,61%	5,48%	12,21%
Ref.	INCIDENCIA NEGATIVA REFLEJADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRAS PROGRAMADO							
	Meses	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
E=CxD	Porcentaje de Inicidencia Negarivas al Avance Programado	0,00%	0,00%	0,31%	0,75%	1,23%	1,86%	4,15%

Finalmente se determinan los meses que serían necesarios en la **fila G** correspondiente al **Porcentaje Total no Alcanzado por Efecto Covid-19** de la tabla **Calculo de Aumento de Plazo Contractual**.

Ref.	CALCULO DEL AUMENTO DE PLAZO CONTRACTUAL		
	Descripción	Porcentaje (%)	Tiempo (mes)
F	Porcenaje Total de Avance Programado	12,21%	4
G	Porcentaje Total no Alcanzado por Efecto Covid-19	4,15%	1,36

CONSORCIO
VIAL SAN PEDRO

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA N[illegible]ONAL [illegible]A LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO [illegible]SÁLTIC[illegible] DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINL[illegible]U, CAA[illegible]APA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - AD REFL [illegible]NDUM [illegible] PGN 2020 con ID: 373116 - LOT

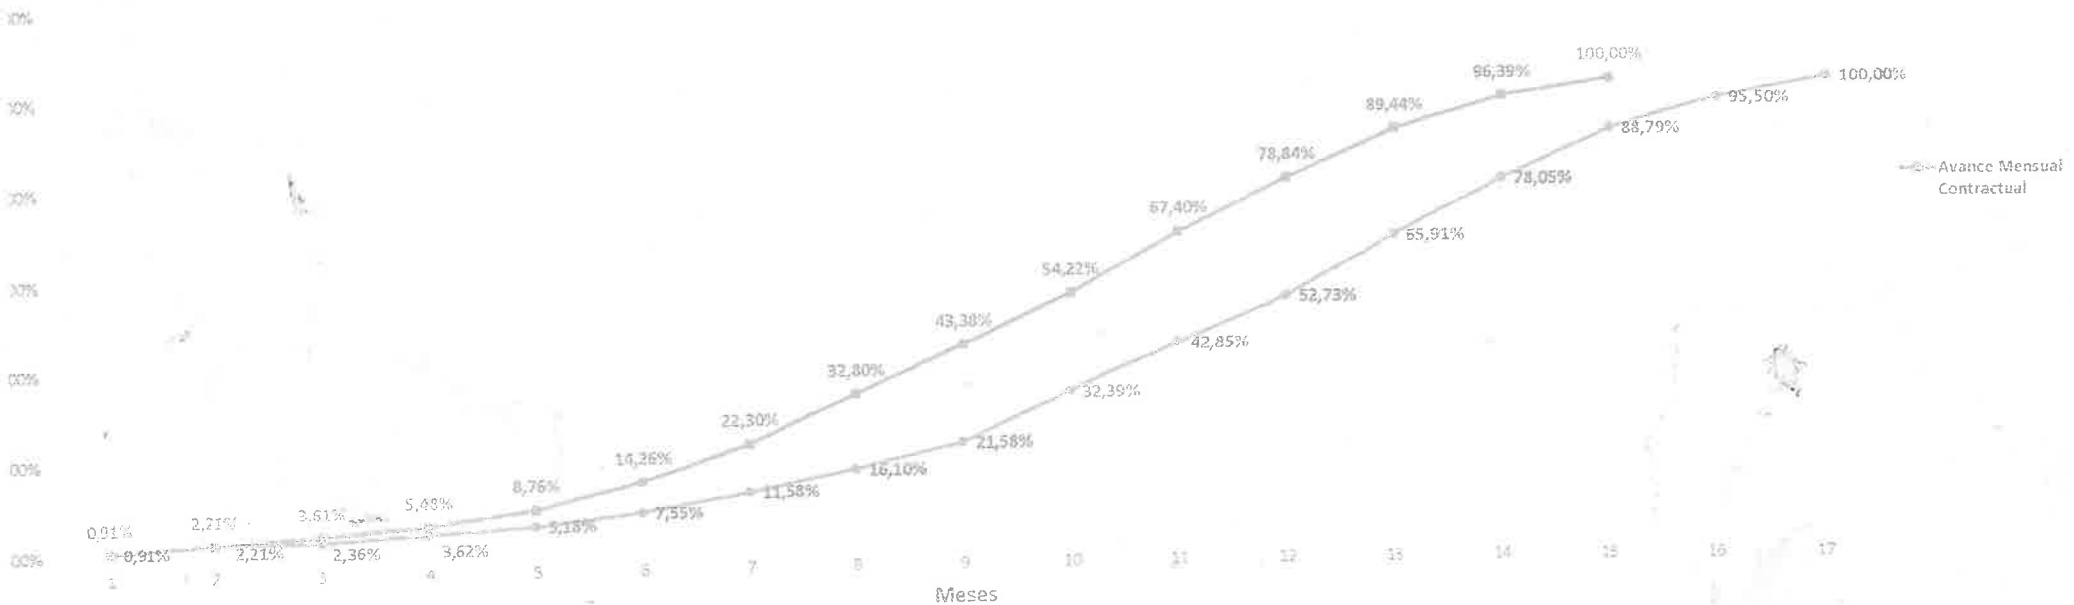

ertificado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
de Cierre	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	10/09/2021
sual Contractual	0,91%	1,31%	1,40%	1,87%	3,27%	5,50%	8,04%	10,49%	10,59%	10,83%	13,18%	11,44%	10,60%	6,95%	3,61%		
ulado Contractual	**0,91%**	**2,21%**	**3,61%**	**5,48%**	**8,76%**	**14,26%**	**22,30%**	**32,80%**	**43,38%**	**54,22%**	**67,40%**	**78,84%**	**89,44%**	**96,39%**	**100,00%**		
al por Fuerza Mayor	0,91%	1,31%	0,14%	1,26%	1,56%	2,38%	4,03%	4,52%	5,48%	10,81%	10,46%	9,88%	13,18%	12,14%	10,74%	6,71%	4,50%
ado por Fuerza Mayor	**0,91%**	**2,21%**	**2,36%**	**3,62%**	**5,18%**	**7,55%**	**11,58%**	**16,10%**	**21,58%**	**32,39%**	**42,85%**	**52,73%**	**65,91%**	**78,05%**	**88,79%**	**95,50%**	**100,00%**

Guido Benitez

ING. EDGAR OSVALDO OHRENS BARRIOS

CONSORCIO
VIAL SAN PEDRO
RUC: [illegible]

49 (cuarenta y ocho)

47 (cuarenta y siete)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

A	:	**Ing. Rubén Andino**, Jefe **Departamento de Ejecución – DCV**
DE	:	**Ing. Guido Benítez Villate,** Supervisor de Obra
FECHA	:	9 de noviembre de 2020.
REFERENCIA	:	Llamado MOPC Nº 188/2019. "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCU". **Contrato SG Ministro Nº 114/2020 – Lote 2.** **Asunto: Aprobación de prórroga de plazo.**

Me dirijo a usted en relación a la Nota de fecha 30 de octubre de 2020 remitida por la empresa ***Consorcio Vial San Pedro***, referente a la solicitud de prórroga por **Casos de Fuerza Mayor** del contrato de la referencia.

Al respecto del pedido de prórroga solicitado, la empresa presenta un registro de los Decretos Gubernamentales en los cuales se declaró **Emergencia Nacional** (Decreto N°3.456/2020) y su afectación a las **Obras Públicas** con la utilización del **Instructivo para Personal en Obras en Rutas** (Proveído por el MSPBS), ocurridos en el periodo comprendido entre el mes marzo a agosto 2020 y en base a estos solicita una ampliación adicional de 1,36 (uno coma treinta y seis) meses del plazo contractual.

Esta Supervisión luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) clausula: Nº 22.1-Prórroga de los Plazos de Ejecución; N°22.2-Prórroga de los Plazos de Ejecución; y N°23.1-Casos de Fuerza Mayor, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 1,36 (uno coma treinta y seis) meses por **Casos de Fuerza Mayor**.

En atención a lo señalado más arriba, esta supervisión sugiere otorgar prorroga por 1,36 (uno coma treinta y seis) meses, con lo cual la nueva fecha de finalización es el **29 de setiembre de 2021**.

Guido Benítez

Ing Guido Benítez Villate

Supervisor
