006 (seis)

LLAMADO MOPC Nº 111/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS:

LOTE 1 - Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas", Tramos: Rotonda Calle 6000 - Yty y Kaffy (55 km); Yety Kaffy - Curuguaty (22 km) y Acceso a Curuguaty (2 km).

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO - OBRAS DE PUESTA A PUNTO - REPROGRAMADO

Orden de Inicio:	18/05/2020
Plazo de ejecución Obras de Puesta a Punto:	18 meses
Fecha de finalización Obras de Puesta a Punto:	18/11/2021
Plazo de ejecución CM Nº1 de las OPP :	175 días
Fecha de finalización CM Nº 1 Obras de Puesta a Punto:	11/05/2022
Plazo de ejecución reprogramado de las OPP :	184 días
Fecha de finalización CM Nº 1 Obras de Puesta a Punto:	11/11/2022

Item	Descripción del Item	Unidad de Medida	Cantidades Original	Incidencia O/P Saldo Contrato Original de las OPP	Mes0 may.-20	Mes1 jun.-20	Mes2 jul.-20	Mes3 ago.-20	Mes4 sep.-20	Mes5 oct.-20	Mes6 nov.-20	Mes7 dic.-20	Mes8 ene.-21	Mes9 feb.-21	Mes10 mar.-21	Mes11 abr.-21	Mes12 may.-21	Mes13 jun.-21	Mes14 jul.-21	Mes15 ago.-21	Mes16 sep.-21	Mes17 oct.-21	Mes18 nov.-21	Mes19 dic.-21	Mes20 ene.-22	Mes21 feb.-22	Mes22 mar.-22	Mes23 abr.-22	Mes24 may.-22	Mes25 jun.-22	Mes26 jul.-22	Mes27 ago.-22	Mes28 sep.-22	Mes29 oct.-22	Mes30 11-11-22
1	Limpieza de franje de dominio	km	79,00	0,83%				77,1%	20,4%							2,5%																			
2	Excavación de zanjas de Drenaje	m3	2.000,00	0,06%																														100,0%	
3	Terraplen	m3	1.380,00	0,15%																														100,0%	
4	Excavación de Bolsones.	m3	700,00	0,03%																														100,0%	
5	Rasheo Profundo	m2	19.371,00	2,17%													4,5%	8,4%	5,4%	13,3%	12,1%	15,0%	13,6%		4,1%	4,1%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%					
6	Reciclado de Paquete Estructural	m3	114.950,00	12,44%														4,1%	9,3%	8,0%	2,6%	11,5%	15,2%	4,7%	8,5%		5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%			
7	Fresado de Carpeta de (7 cm)	m3	27.258,50	2,06%												1,0%	7,8%	8,1%	2,5%	4,0%	7,6%	6,9%				7,4%		10,9%	10,9%	10,9%	10,9%	10,9%			
8	Fresado de Carpeta de (3 cm)	m3	679,80	0,05%																														100,0%	
9	Base Granular estabilizada	m3	30.250,00	6,94%																														100,0%	
10	Tratamiento Superficial Doble.	m2	243.500,00	5,10%															4,0%	2,5%	4,1%													89,7%	
11	Concreto Asfáltico con Polimero (e=6cm).	m3	24.420,00	36,85%															5,4%	2,5%	5,1%	13,1%	16,4%	5,4%	11,0%	1,1%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%			
12	Concreto Asfáltico con Polimero (e=7cm).	m3	11.927,40	18,00%												3,0%	11,9%	15,5%	9,3%	12,7%	19,4%	16,4%	1,6%		0,5%	9,9%									
13	Riego de Liga	lts	321.772,00	2,15%													2,8%	4,5%	9,5%	5,6%	8,9%	11,8%	13,3%	2,8%	7,7%	5,0%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%			
14	Riego de Imprimación	lts	498.520,00	5,42%													0,2%	2,4%	5,4%	8,4%	3,9%	8,4%	8,8%	3,7%	8,2%	0,2%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%			
15	Señalización Horizontal	m2	29.845,00	1,11%																					32,7%									67,3%	
16	Señalización Horizontal Termoplastica	m2	1.500,00	0,12%																														66,7%	33,3%
17	Señalizacion en zona de Escuelas y Hospitales según resolución del MOPC.	un	4,00	0,05%																					100,0%										
18	Señalización Vertical	m2	150,00	0,17%																												25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
19	Mojones de kilometraje	un	10,00	0,00%																												50,0%	50,0%		
20	Instalación y Servicios Especializados	mes	18,00	4,47%		2,1%	2,1%	2,2%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	33,0%	
21	Provisión y Colocación de Espiras Magneticas para Puesto de Control Permanente (Cruzero a Yety Kaffy).	gl	1,00	0,28%																										100,0%					
22	Provisión y Colocación de Espiras Magneticas para Puesto de Control Permanente (Cruzero a Acceso.	gl	1,00	0,28%																										100,0%					
23	Movilizaciones	gl	1,00	1,28%		5,0%	50,0%									45,0%																			
				100,00%																															
	Avance REPROGRAMADO Obras de Puesta a Punto por mes:					0,16%	0,73%	0,74%	0,26%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	1,25%	2,58%	3,90%	5,77%	5,36%	6,82%	10,51%	9,35%	2,94%	6,55%	2,82%	3,93%	4,15%	4,15%	4,71%	4,04%	4,08%	0,14%	14,41%	0,08%
	Avance REPROGRAMADO acumulado Obras de Puesta a Punto:					0,16%	0,89%	1,63%	1,89%	1,98%	2,08%	2,17%	2,27%	2,36%	2,46%	3,70%	6,28%	10,18%	15,96%	21,32%	28,13%	38,64%	47,99%	50,93%	57,47%	60,30%	64,23%	68,38%	72,54%	77,24%	81,28%	85,37%	85,51%	99,92%	100,00%
	Avance programado CM Nº 1 Obras de Puesta a Punto por mes:					0,16%	0,73%	0,74%	0,26%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	1,25%	2,56%	3,88%	5,77%	5,35%	5,50%	9,65%	9,65%	5,76%	9,65%	9,65%	8,72%	17,84%	2,32%						
	Avance programado acumulado CM Nº 1 Obras de Puesta a Punto:					0,16%	0,89%	1,63%	1,89%	1,98%	2,08%	2,17%	2,27%	2,36%	2,46%	3,70%	6,26%	10,14%	15,91%	21,26%	26,77%	36,41%	46,06%	51,82%	61,47%	71,12%	79,84%	97,68%	100,00%						
	Avance ejecutado Obras de Puesta a Punto por mes:					0,16%	0,73%	0,74%	0,26%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	1,25%	2,56%	3,88%	5,77%	5,35%	6,80%	10,49%	9,35%	2,94%	6,55%	2,81%									
	Avance ejecutado acumulado Obras de Puesta a Punto:					0,16%	0,89%	1,63%	1,89%	1,98%	2,08%	2,17%	2,27%	2,36%	2,46%	3,70%	6,26%	10,14%	15,91%	21,26%	28,06%	38,55%	47,90%	50,84%	57,38%	60,19%									

Ing. Mauricio Cordero
Representante Legal
CONSORCIO RIO YPANE

ING. [illegible] ROBADIN A.
UNIDAD EJECUTORA
CMANS

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

28 (veintiocho)

005 (cinco)

LLAMADO MOPC Nº 113/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS:

LOTE 1 - Ruta Nacional Nº 10 "Las Residentas", Tramos: Rotonda Calle 6000 - Yacy Kañy (35 km); Yacy Kañy - Curuguaty (22 km) y Acceso a Curuguaty (2 km). CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 11/2020.

CURVA DE AVANCE OBRAS DE PUESTA A PUNTO - REPROGRAMADO

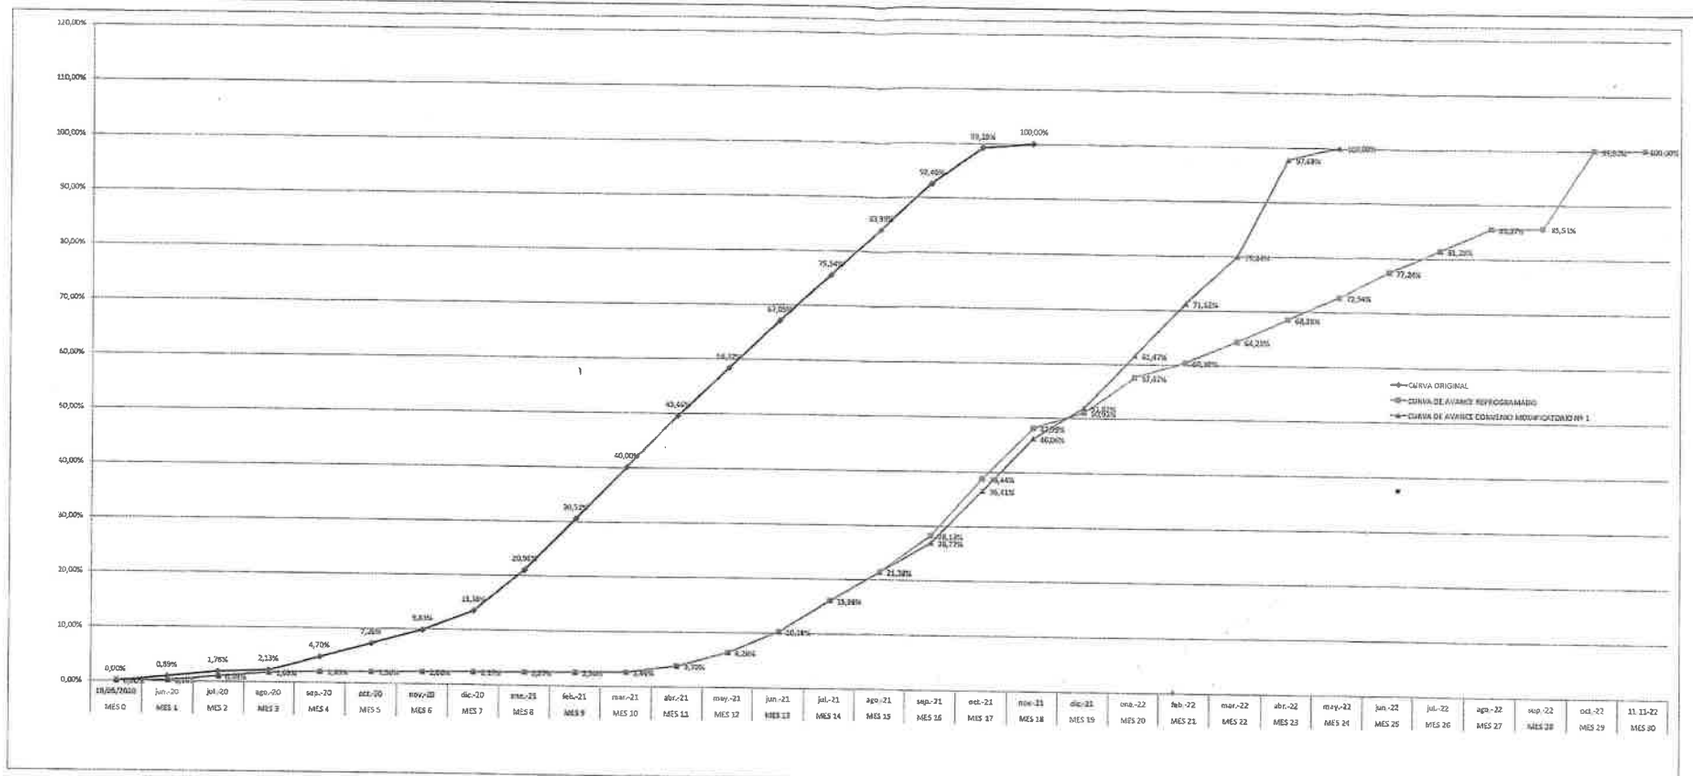

	MES 0 19/05/2020	MES 1 jun.-20	MES 2 jul.-20	MES 3 ago.-20	MES 4 sep.-20	MES 5 oct.-20	MES 6 nov.-20	MES 7 dic.-20	MES 8 ene.-21	MES 9 feb.-21	MES 10 mar.-21	MES 11 abr.-21	MES 12 may.-21	MES 13 jun.-21	MES 14 jul.-21	MES 15 ago.-21	MES 16 sep.-21	MES 17 oct.-21	MES 18 nov.-21	MES 19 dic.-21	MES 20 ene.-22	MES 21 feb.-22	MES 22 mar.-22	MES 23 abr.-22	MES 24 may.-22	MES 25 jun.-22	MES 26 jul.-22	MES 27 ago.-22	MES 28 sep.-22	MES 29 oct.-22	MES 30 11-11-22
Avance reprogramado por mes según:	0,00%	0,15%	0,73%	0,74%	0,26%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	1,25%	2,58%	3,90%	5,77%	5,36%	6,82%	10,51%	9,91%	2,94%	6,55%	2,82%	3,93%	4,15%	4,15%	4,71%	4,04%	4,88%	0,14%	14,41%	0,08%
Avance reprogramado acumulado según:	0,00%	0,16%	0,89%	1,63%	1,89%	1,98%	2,08%	2,17%	2,27%	2,36%	2,46%	3,70%	6,28%	10,18%	15,96%	21,32%	28,13%	38,64%	47,99%	50,93%	57,47%	60,30%	64,23%	68,38%	72,54%	77,24%	81,28%	85,87%	85,51%	99,92%	100,00%
Avance programado por mes según CM Nº 1:	0,00%	0,15%	0,73%	0,74%	0,26%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	1,25%	2,58%	3,88%	5,77%	5,35%	5,50%	9,65%	9,65%	5,76%	9,65%	9,65%	8,72%	17,84%	2,92%						
Avance programado acumulado según CM Nº 1:	0,00%	0,15%	0,89%	1,63%	1,89%	1,98%	2,08%	2,17%	2,27%	2,36%	2,46%	3,70%	6,28%	10,14%	15,91%	21,26%	26,77%	36,41%	46,06%	51,82%	61,47%	71,12%	79,84%	97,68%	100,00%						
Avance programado por mes según Contrato Original:	0,00%	0,80%	0,89%	0,85%	2,56%	2,56%	2,50%	3,55%	7,58%	9,54%	9,50%	9,45%	8,67%	8,72%	8,49%	8,45%	8,50%	6,71%	0,81%												
Avance programado acumulado según Contrato Original:	0,00%	0,80%	1,78%	2,13%	4,70%	7,26%	9,83%	13,38%	20,96%	30,51%	40,00%	49,46%	58,12%	67,05%	75,54%	83,99%	92,49%	99,19%	100,00%												

ING. GUSTAVO A. LOBADIN A.
UNIDAD EJECUTORA
GMANS

Ing. Mauricio Cordero
Representante Legal
CONSORCIO RIO YPANE

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

29 (veintinueve)
