CONSTRUTEX

Asunción, 16 de mayo del 2024.

Sra.
Arq. Laura Florentín.
Asistencia Técnica.
Dpto. Prevención de Incendios.
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL.
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco al contrato 085/2023 LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS con ID N° 417769, a fin de dar respuesta a la consulta con respecto a la provisión de las Bombas de Incendio.

En tal sentido, informamos el retraso de la entrega de las Bombas de Incendio se debe a que la compañía marítima encargada de transportar el producto se encuentra con demora con la carga, debido a varios factores.

Dado que, es un bien que estamos importando, por esta situación el proveedor extiende el plazo para la entrega de las Bombas.

Se remite las notas de respuestas del proveedor y los retrasos por la llegada del mismo así también afirmando que el día sábado 18 de mayo estaría ya en aduana la mercadería por lo cual estimamos que a finales de mayo se tendría ya la bomba a mano para la instalación del mismo con eso concluir los trabajos de PCI para la quincena de junio.

Sin otro particular me despido muy atentamente. –

Ing. Steven Chaparro Alonso.
Representante Legal.
CONSTRUTEX S.A.

Asunción, 26 de febrero del 2024

Señores:

REGIMIENTO 8 S.A.
Atn: Ing. Jesus Betancourt

Presente

REF: MOTOBOMBA MOD. 6X4X10F-M PPAL ELÉCTRICA 750GPM / 145 PSI 100 HP 50 HZ/380 V/3 FASES/2 POLOS + CONTROLADOR BOMBA ELECTRICA: TORNATECH GPY 100 HP (ESTRELLA-DELTA) , CERRAMIENTO NEMA 2, 380 V, CONFIGURACION ESTANDAR MARCA AC FIRE

Estimado Ing. Jesus,

Queremos informar que la carga que corresponde al pedido de referencia se encuentra con demora en el Puerto de Barcelona, a causa de un alto congestionamiento en este punto de transbordo, la empresa naviera MSC nos acaba de informar que la **fecha estimada de llegada a Paraguay el 28/03/2024.**

De todos modos, nuestro Dpto de Importaciones está conversando con la empresa Naviera para encontrar alguna posibilidad de adelantar estos tiempos.

Atentamente.

Marcelo Pereira
Gerente
Record Lux

.....

Marcelo Pereira
Gerente Comercial

Asunción, 02 de abril del 2024

Señores:

REGIMIENTO 8 S.A.
Atn: Ing. Jesus Betancourt

Presente

REF: MOTOBOMBA MOD. 6X4X10F-M PPAL ELÉCTRICA 750GPM / 145 PSI 100 HP 50 HZ/380 V/3 FASES/2 POLOS + CONTROLADOR BOMBA ELECTRICA: TORNATECH GPY 100 HP (ESTRELLA-DELTA) , CERRAMIENTO NEMA 2, 380 V, CONFIGURACION ESTANDAR MARCA AC FIRE

Estimado Ing. Jesus,

Queremos informar que la compañía marítima nos acaba de avisar que la carga que corresponde al pedido de referencia se encuentra con demora lo cual nos obliga a recalcular una nueva fecha de **llegada a Paraguay indicando como fecha actualizada para el 25/04/2024.***

De todos modos, nuestro Dpto de Importaciones se encuentra agotando esfuerzos para lograr adelantar estos tiempos.

Atentamente.

Marcelo Pereira
Gerente
Record Lux

.....
Marcelo Pereira
Gerente Comercial

**IMPORTANTE*
Favor tomar nota que las fechas mencionadas en la presente notificación son estimadas y no pueden garantizarse debido a las contingencias propias del transporte, pudiendo variar sin previo aviso por estar sujeto a factores referidos a trasbordos, huelgas, alijes, congestionamiento en puertos, seguridad, disposiciones de autoridad, contingencias de la navegación, motivos de fuerza mayor o fortuita.

Asunción, 29 de abril del 2024

Señores:

REGIMIENTO 8 S.A.
Atn: Ing. Jesus Betancourt
Presente
REF: MOTOBOMBA MOD. 6X4X10F-M PPAL ELÉCTRICA 750GPM / 145 PSI 100 HP 50 HZ/380 V/3 FASES/2 POLOS + CONTROLADOR BOMBA ELECTRICA: TORNATECH GPY 100 HP (ESTRELLA-DELTA) , CERRAMIENTO NEMA 2, 380 V, CONFIGURACION ESTANDAR MARCA AC FIRE

Estimado Ing. Jesus,

Cumplimos en informar que hemos sido notificados por la naviera que el contenedor de carga consolidada en el cual viene estos equipos se encuentra con otra carga que presentó pérdida de contenido y fue puesto en cuarentena considerando que las mercaderías son IMO CLASS.

Ante esta situación hemos accionado inmediatamente; contactamos con los representantes de la marca en Uruguay y enviado una persona de Record Electric hasta el sitio para autorizar y agilizar cualquier trámite que sea necesario. Estimamos que el tiempo entre resolver esta situación, el transbordo y llegada hasta Asunción puede rondar el plazo de 10 a 20 días.

De nuestra parte está firme el compromiso de agotar todas las instancias para lograr que estos equipos lleguen en el menor tiempo hasta puerto de Asunción.

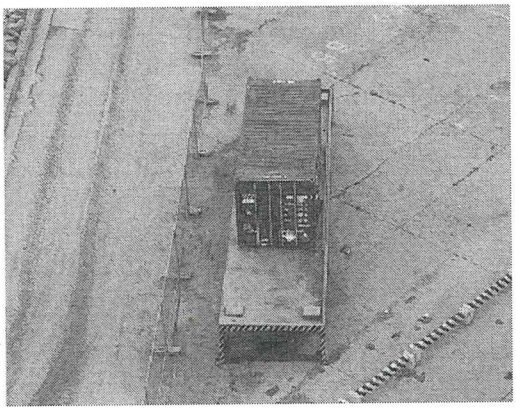

Estaremos informándoles de cualquier novedad.
Atentamente.

Marcelo P
Gerer
Record

.....
Marcelo Pereira
Gerente Comercial

**IMPORTANTE*
Favor tomar nota que las fechas mencionadas en la presente notificación son estimadas y no pueden garantizarse debido a las contingencias propias del transporte, pudiendo variar sin previo aviso por estar sujeto a factores referidos a trasbordos, huelgas, alijes, congestionamiento en puertos, seguridad, disposiciones de autoridad, contingencias de la navegación, motivos de fuerza mayor o fortuita.
