DC INGENIERIA S.A

Llamado MOPC Nº 65/2019 **Licitación Pública Nacional para la "Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental. 1ra tanda. Financiación CAF-FONPLATA. ID 367.387 – CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 – Lote 2**

CURVA DE AVANCE GENERAL - PUENTES DEL LOTE 2

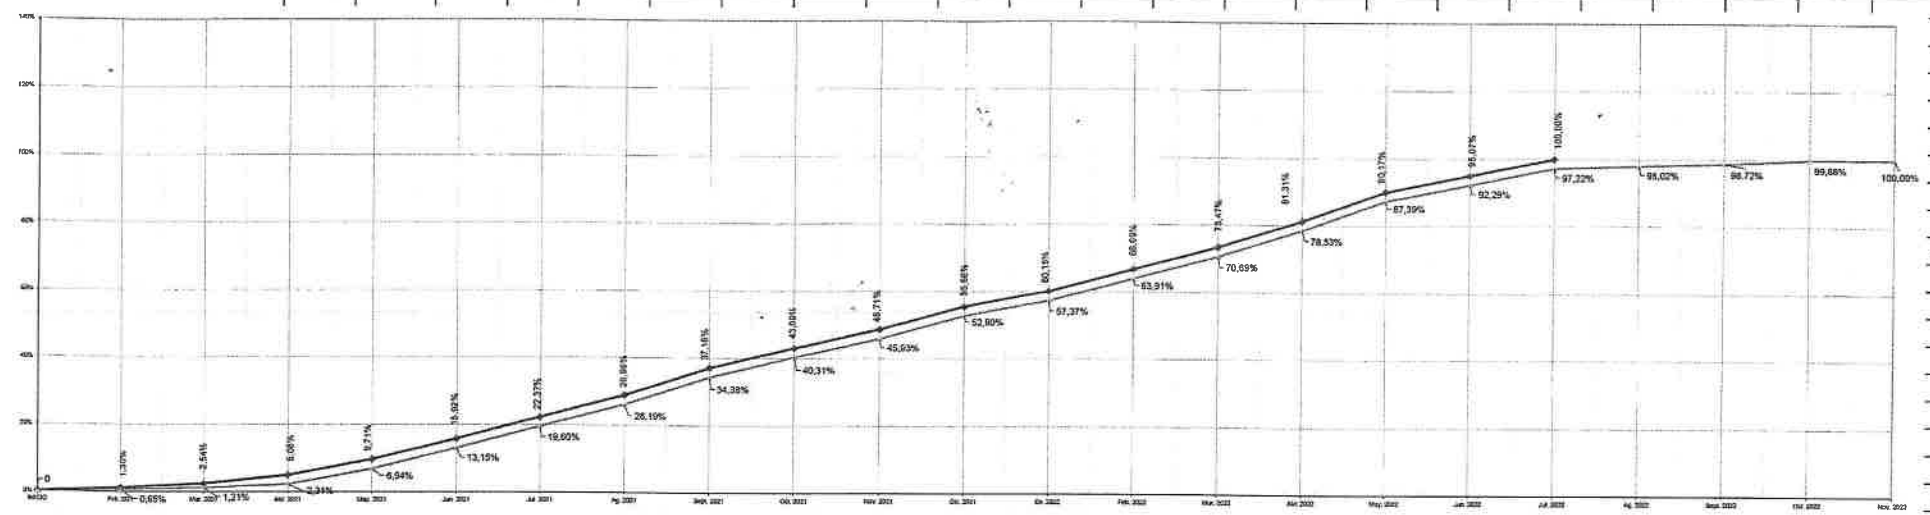

Descripción	INICIO MES 0	Feb. 2021 MES 1	Mar. 2021 MES 2	Abr. 2021 MES 3	May. 2021 MES 4	Jun. 2021 MES 5	Jul. 2021 MES 6	Ag. 2021 MES 7	Sept. 2021 MES 8	Oct. 2021 MES 9	Nov. 2021 MES 10	Dic. 2021 MES 11	En. 2022 MES 12	Feb. 2022 MES 13	Mar. 2022 MES 14	Abr. 2022 MES 15	May. 2022 MES 16	Jun. 2022 MES 17	Jul. 2022 MES 18	Ag. 2022 MES 19	Sept. 2022 MES 20	Oct. 2022 MES 21	4/11/2022 Nov. 2022 MES 22
	1/2/2021	01/02/2021 a 28/02/2021	01/03/2021 a 31/03/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	01/07/2021 a 31/07/2021	01/08/2021 a 31/08/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	01/10/2021 a 31/10/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	01/12/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	01/11/2022 a 4/11/2022
PROGRAMADO CONTRACTUAL	0	1,30%	1,25%	2,54%	4,63%	6,21%	6,45%	6,59%	8,19%	5,93%	5,62%	6,87%	4,57%	6,54%	6,79%	7,84%	8,86%	4,90%	4,93%				
AVANCE ACUMULADO CONTRACTUAL	0	1,30%	2,54%	5,08%	9,71%	15,92%	22,37%	28,96%	37,16%	43,09%	48,71%	55,58%	60,15%	66,69%	73,47%	81,31%	90,17%	95,07%	100,00%				
AVANCE MENSUAL REPROGRAMADO POR INICIO DE PUENTE Nº 7 y 11	0	0,98%	0,84%	1,74%	4,63%	6,21%	6,45%	6,59%	8,19%	5,93%	5,62%	6,87%	4,57%	6,54%	6,78%	7,84%	8,86%	4,90%	4,93%	0,80%	0,70%	0,02%	
AVANCE ACUMULADO REPROGRAMADO POR INICIO DE PUENTE Nº 7 y 11	0	0,98%	1,81%	3,56%	8,19%	14,40%	20,85%	27,44%	35,64%	41,57%	47,19%	54,06%	58,63%	65,17%	71,95%	79,79%	88,65%	93,55%	98,48%	99,28%	99,98%	100,00%	
DIAS DE PRORROGAS		10	10	11																			
AVANCE NO EJECUTADO POR ESCACEZ DE CEMENTO		0,33%	0,28%	0,64%																			
AVANCE MENSUAL REPROGRAMADO POR ESCACEZ DE CEMENTO (01/11/2022)	0	0,65%	0,96%	1,10%	4,63%	6,21%	6,45%	6,59%	8,19%	5,93%	5,62%	6,87%	4,57%	6,54%	6,79%	7,84%	8,86%	4,90%	4,93%	0,80%	0,70%	1,14%	0,19%
AVANCE ACUMULADO REPROGRAMADO POR ESCACEZ DE CEMENTO (4/11/2022)	0	0,65%	1,21%	2,31%	6,94%	13,15%	19,60%	26,19%	34,38%	40,31%	45,93%	52,80%	57,37%	63,91%	70,69%	78,53%	87,39%	92,29%	97,22%	98,02%	98,72%	99,88%	100,00%

ING. FELICITA CHINOTE DE ARIAS
Representante Legal
DC INGENIERIA S.A.

Ing. Felicita Chinote
Representante Legal

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF/FONPLATA
DCV - MOPC

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

ING. ANTONIO MIGALDO
Director de Fiscalización
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES

ADJUNTO A NOTA 165/22

P/A

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Ing. Oscar Valdez
Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

38 (treinta y ocho)
