LLAMADO MOPC Nº 44/2021

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA

GRUPO 3

IDE Nº: 398.706

TRAMO: ABAI - GENERAL MORINIGO

DEPARTAMENTO CAAZAPA

LOTE 3 (0+000 - 14+919) L= 14,92 km

CURVA DE AVANCE REPROGRAMADO

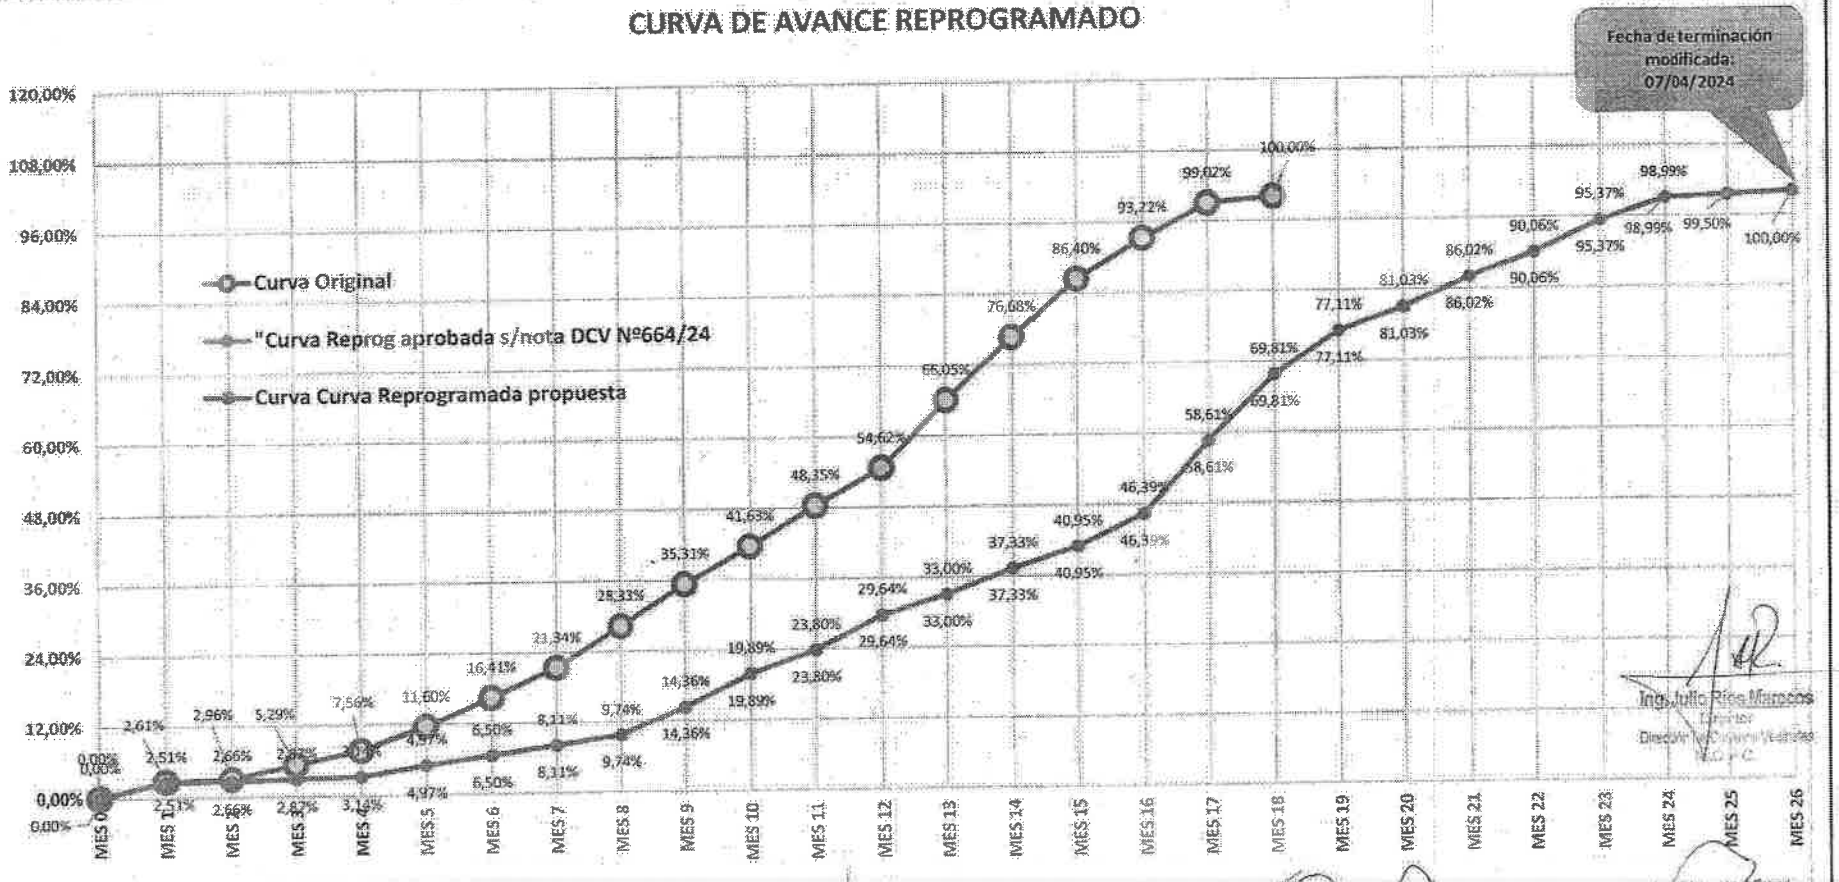

Ing. Julio Rios Marcos
Director
Dirección de Contrataciones
M.O.P.C.

Ing. Emilio Diaz de Vivar
Representante Legal

Ing. Antonio N. Frangozo
Representante Legal

Ing. Estanislao Adorno
Supervisor

Dpto. Ejecución
DCC - MOPC

15 (quince)

LICITACIÓN PUBLICA N... ...CIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZ... ...JARA

LLAMADO MOPC Nº 44/2023

GRUPO 3

ID Nº: 398.705

LOTE 3

TRAMO: ARAY - GENERAL MORINIGO

DEPARTAMENTO CAAZAPÁ

LOTE 3 (0+000 - 34+913) L= 34,92 km

CRONOGRAMA REPROGRAMADO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Fecha Fin: 02/09/24

	Días de lluvias más días de holgadades	20	21	16	19	13	18	17	23	10	4	21	11	20	14	19	11	9	21	12	15	21				12		
	Días de lluvias más días de holgadades) - 6	13	13	8	11	5	7	9	15	2	-4	3	3	12	6	10	5	3	1	6	9	12	15	21	22	5	12	24	25
ITEM	DESCRIPCIÓN	abr-23	may-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Movilización y Desmovilización	10,00%																									10,00%	10,00%	
2	Construcción y Mantenimiento de Campamento y obra de arte, auxiliar			6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%									
3	Mantenimiento del Tránsito Temporal y Seguridad Vial			6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%									
4	Cartel de Obra	40,00%	60,00%																										
5	Desbosque, Destronque y Despeje	5,00%	5,00%	12,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%																				
6	Excavación no Clasificada				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%																			
7	Excavación de Bolsones							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%																	
8	Excavación de Zanjas de Drenaje							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%																	
9	Terraplenes (incluye relleno de sub rasante CBR ≥ 30%)					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%											
10	Ejecución de Obras de Arte					20,00%	20,00%	20,00%																					
11	Demolición de Cabecera de ACH"A" 2 2,00 x 2,00							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%																	
12	Traslado de Alambrados					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%													
13	Traslado de Columnas Eléctricas					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%																				
14	Traslado de cañerías de agua				20,00%	20,00%	20,00%																						
15	Sub Base Macadam Hidráulico (CBR ≥ 80%)								5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%							
16	Base Granular Estabilizada 80/20 (CBR ≥ 100%)												10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%							
17	Imprimación Asfáltica												10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%							
18	Riego de Liga															5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%				
19	Tratamiento Superficial Simple en Bañquina																		10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%				
20	Carpeta de Concreto Asfáltico											10,00%	10,00%																
21	Relleno Granular																												
22	ATH"A" 1@ 1,20 m					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%																	
23	ATH"A" 2@ 1,20 m					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%																	
24	ATH"A" 1@ 1,20 m								12,50%	12,50%	12,50%	12,50%																	
25	ATH"A" 3@ 1,20 m									12,50%	12,50%	12,50%																	
26	ACHPA" 1 1,00 x 1,00								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%																	
27	ACHVA"2 1,50 x 1,50									10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%															
28	ACH"A" 1 2,00 x 2,00								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%																
29	ACH"A" 5 2,00x2,00									12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%															
30	Cuneta revestida de Concreto														5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%					
31	Disipadores de Energía																	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	10,00%					
32	Protección de ACH"A"3 2,00 x 2,00													10,00%	10,00%														
33	Construcción de Cabecera de ACH"A" 3 2,00 x 2,00														10,00%	10,00%													
34	Señalización Vertical																								50,00%	50,00%			
35	Pintura de Señalización																								15,00%	20,00%	15,00%	20,00%	30,00%
36	Delineación Horizontal																								20,00%	30,00%	50,00%		
37	Barandas Metálicas de Contención																										50,00%	25,00%	25,00%
38	Tacha Reflectiva																										50,00%	25,00%	25,00%
39	Tachas Reflectiva																								50,00%	50,00%			
40	Postes de Kilometraje																5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%					
41	Protección Vegetal de Taludes																		40,00%	40,00%	10,00%								
42	Protección de Área de Prestamos																			20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
43	Casetas de Resguardo Peatonal																			20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%				
44	Señalización Intersección Prog. 14+920																												
45	Instalaciones y servicios especializados	10,00%	5,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%									
46	Refacción de las oficinas administrativas de la sección en San Juan Nepomuceno y de la casa en Buenavista (DIS°SECTOR 8 CAAZAPÁ)							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%															
47	Implementación del PGA CIA	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%									
	% Mes. (Reprogramado S por inclemencias)	2,51%	0,15%	0,21%	0,22%	1,03%	1,53%	1,61%	1,53%	4,62%	5,02%	3,91%	3,84%	3,30%	4,33%	2,07%	5,44%	12,22%	11,20%	7,00%	3,52%	4,69%	4,04%	5,74%	3,02%	0,51%	3,50%		
	% Acum. (Reprogramado S por inclemencias)	2,51%	2,66%	2,87%	3,14%	4,17%	6,50%	8,11%	9,74%	14,36%	19,38%	23,60%	29,84%	33,00%	37,33%	39,39%	44,83%	56,81%	68,81%	75,81%	79,33%	84,02%	88,06%	93,87%	96,89%	97,50%	100,00%		

Ing. Oscar [illegible] C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV-MOPC

Ing. Estanislao Adano
Supervisor

Ing. Anacito N. Pangrazio
Representante Legal

Ing. Emiro Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa Constructora
edivisa

Ing. Julio Rios Mareco
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.
