Documentos Integrantes Del Convenio Modificatorio Nº 01

ANEXO 2

Cronograma de Avance Fisico-Financiero y Curva de Avance

Contrato S.G. Ministro Nº 309/2019

Arq. Ana Luci Porro
Empresa Constructora
Rio de Janeiro Nº 1320 - Tel.: (021) 222.224

21 (veinte y uno)
15 (quince)

ARQ. ANA LUCI PORR DIRECCIÓN: RIO DE JANEIRO 1320 ESQ. GRAL MELGAREJO RUC 408153 - 6	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **M.O.P.C.** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO - CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

LOTE Nº 21 - DEPARTAMENTO DE ITAPUA

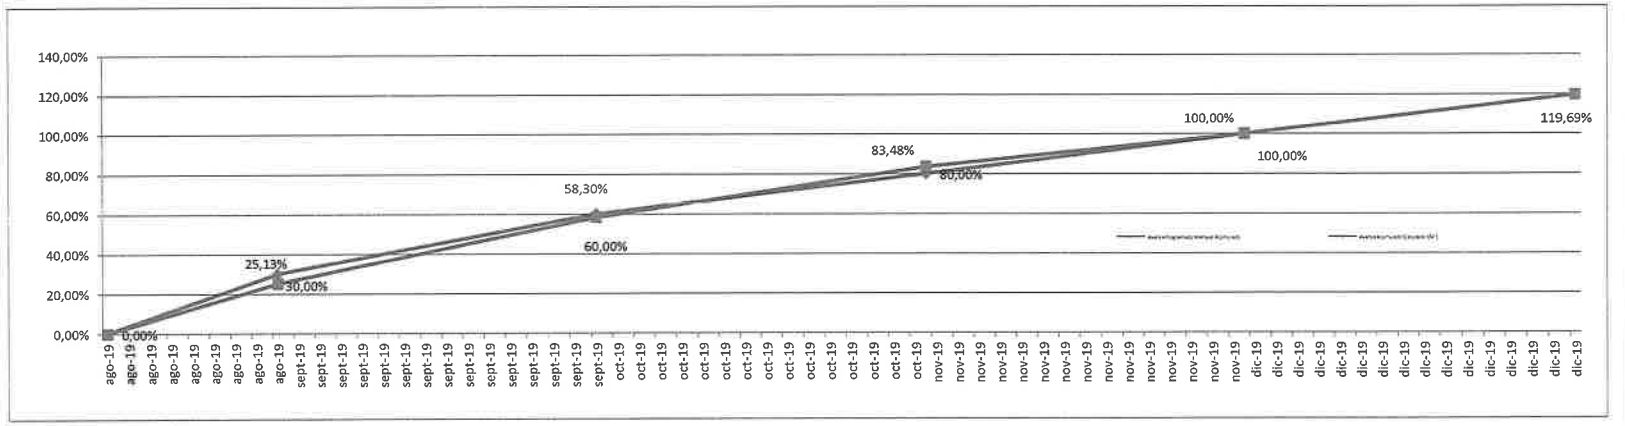

Curva de Avance Físico - Financiero

	ago/19	sept/19	oct/19	nov/19	dic/19	
Fecha de Cierre	31-08-19	30-09-19	31-10-19	30-11-19	31-12-19	
Avance Programado Mensual	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	
Avance Programado Mensual Acumulado	30,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	
Avance Ejecutado	25,13%	33,17%	25,18%	16,52%	19,69%	
Avance Acumulado Ejecutado CM 1	25,13%	58,30%	83,48%	100,00%	119,69%	

ARQ. ANA LUCI PORRO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. CESAR NUNEZ
FISCALIZACION
DCV - MOPC

20 (veinte) de diciembre de 19
