CONTRATISTA

ECOMIPA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJ
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+

CURVA AVANCE FÍS

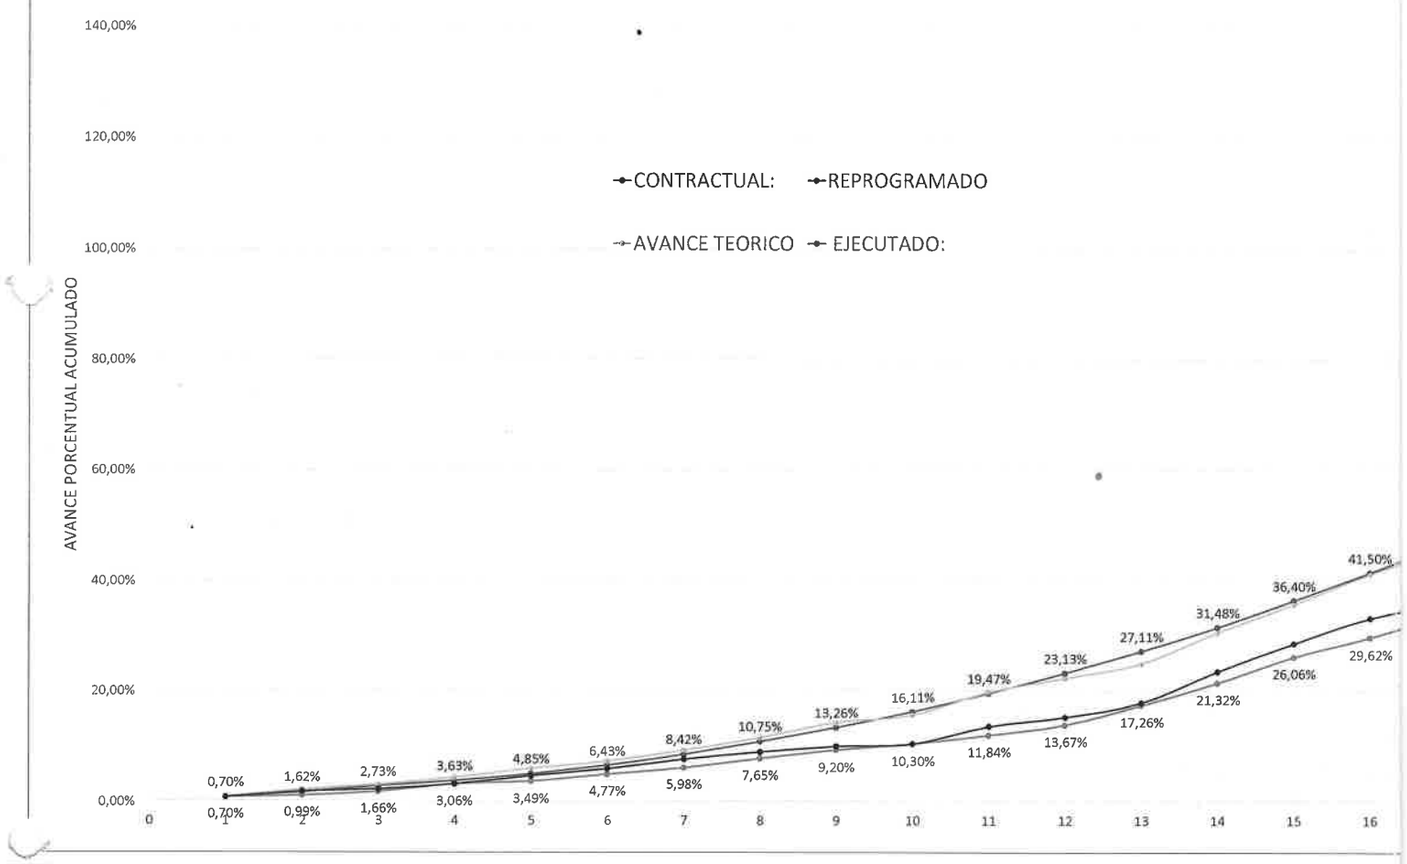

Años	AÑO - 2022						AÑO - 2023									
Meses	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
Certifcado (Nro/Mes)	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DICI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
CONTRACTUAL:	0,70%	1,62%	2,73%	3,63%	4,85%	6,43%	8,42%	10,75%	13,26%	16,11%	19,47%	23,13%	27,11%	31,48%	36,40%	41,50%
EJECUTADO:	0,70%	1,73%	2,12%	3,03%	4,52%	5,82%	7,54%	8,87%	9,88%	10,32%	13,46%	15,13%	17,76%	23,45%	28,56%	33,18%
AVANCE TEORICO	0,70%	2,02%	2,92%	4,20%	5,85%	7,15%	9,14%	11,43%	14,15%	15,50%	19,71%	22,21%	24,84%	30,53%	35,64%	41,19%
REPROGRAMADO	0,70%	0,99%	1,66%	3,06%	3,49%	4,77%	5,98%	7,65%	9,20%	10,30%	11,84%	13,67%	17,26%	21,32%	26,06%	29,62%

6 (seis)

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MERCOSUR FOCEM Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur

FISCALIZACIÓN

CONSORCIO

RAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA
0 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11 a Prog. 50+000 (Long.: 50Km)

CO - FINANCIERO

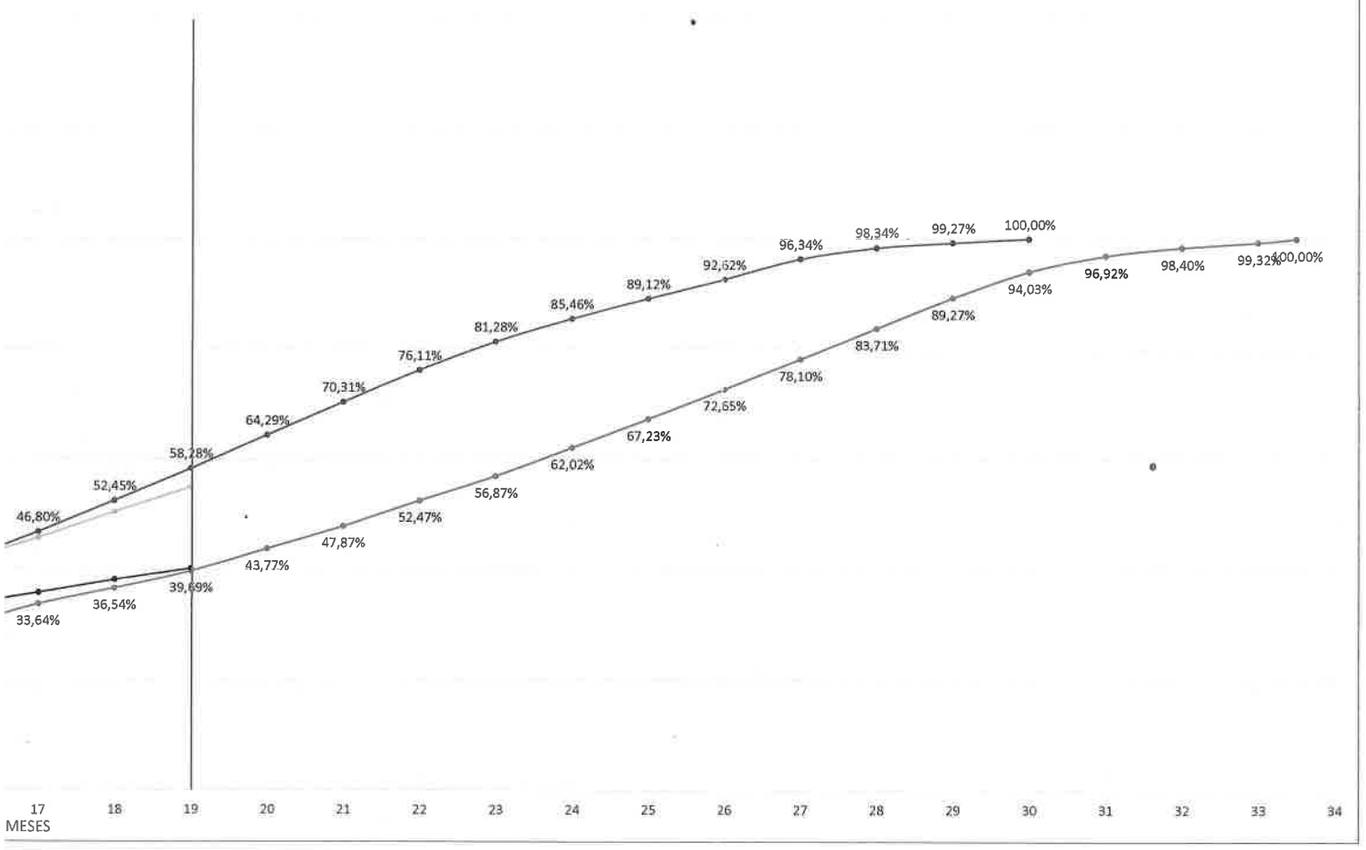

		AÑO - 2024												AÑO - 2025			
ES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	MES 27	MES 28	MES 29	MES 30	MES 31	MES 32	MES 33	MES 34
NOV	DICI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DICI	ENE	FEB	MAR	ABR
6,80%	52,45%	58,28%	64,29%	70,31%	76,11%	81,28%	85,46%	89,12%	92,62%	96,34%	98,34%	99,27%	100,00%				
5,77%	38,15%	40,23%															
5,71%	50,40%	54,86%															
3,64%	36,54%	39,69%	43,77%	47,87%	52,47%	56,87%	62,02%	67,23%	72,65%	78,10%	83,71%	89,27%	94,03%	96,92%	98,40%	99,32%	100,00%

ECOMIPA S.A.
Jorge Luis Oyola
Representante Legal
