1313(Mil trecientos trece)

CONSORCIO CEP	CONTRATO S.GMINISTRO 15/2022

"DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO" - CONTRATO S.G 15/2022- AD REFERENDUM A LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CON ID 402.399.

CERTIFICADO 11

1312 (Mil trescientos doce)
00001189

Licitación Pública Internacional N° 97/2021. DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO.

CONSORCIO CEP

COD. 3182024

M.O.P.C.
Secretaria General - Mesa de Entrada Única
MEU N°: 10641 / 2024
Fecha: 04 / 03 / 2024
Receptor

131 (Mil trecientos once)
00001110

CONSORCIO CEP

CALDETEC S.R.L. – EDIVI S.A. – PUNTAL CONSTRUCCIONES

Asunción, 27 de febrero de 2024

Señores:
CONSORCIO INTEGRACION
Fiscalización de obra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Asunción Paraguay
PRESENTE

REF.: Solicitud de Aprobación del Certificado de Obra No.11 - Enero 2024

Me dirijo a usted, a fin de solicitar la revisión y si corresponde la aprobacion correspondiente del **CERTIFICADO No.11 (ENERO 2024) de la obra "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO" -CONTRATO S.G MINISTRO 15/2022 -AD REFERENDUMM A LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CON ID 402.399**

El Monto del Certificado asciende a la suma de **Guaranies IVA INCLUIDO:** 0

SON GUARANIES CERO .–

Solicitamos tenga en consideración los siguintes datos

RUC EMPRESA CONTRATISTA	80122696-1
RAZON SOCIAL CONTRATISTA	CONSORCIO CEP
NUMERO DE FACTURA	001-001-0000066
NUMERO DE TIMBRADO	16311675 VENCIMIENTO 31/03/2024
NUMERO DE CONTRATO	**CONTRATO S.G MINISTRO No. 15/2022 "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO "- AD REFERENDUM A LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA , CON ID: 402.399**
NUMERO DE ADENDAS	1
NUMERO DE RESOLUCION MINISTERIAL	141/2022
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	31,62
PLAZO DE EJECUCION:	11 MESES
MONTO DEL CONTRATO Gs.:	39.726.337.100
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	EXTERNO
NUMERO CUENTA CORRIENTE BANCARIA	100108853-BANCO BASA CTA. CTE.
MODALIDAD DEL LLAMADO	LLAMADO MOPC No. 97/2021
DIRECCION DE EMAIL DE LA EMPRESA	administracion@puntal.net

Ing. Luis Boveda
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

CONSORCIO CEP

1310 (Mil trecientos diez)
0000~~11~~1

Asunción, 27 de febrero de 2024

Señora:
Ing. Claudia Centurión, Ministra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Asunción Paraguay
PRESENTE

Me dirijo a usted, a fin de solicitar iniciar trámites de pago correspondiente al **CERTIFICADO No. 11 (ENERO 2024)** de la obra **"DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO" - CONTRATO S.G 15/2022- AD REFERENDUM A LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CON ID 402.399**

El Monto del Certificado asciende a la suma de Guaranies IVA INCLUIDO: **0**

SON GUARANIES CERO .--

Para el efecto, Solicito tenga en consideración los siguintes datos

RUC EMPRESA CONTRATISTA	80122696-1
RAZON SOCIAL CONTRATISTA	CONSORCIO CEP
NUMERO DE FACTURA	001-001-0000066
NUMERO DE TIMBRADO	16311675 VENCIMIENTO 31/03/2024
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO S.G MINISTRO No. 15/2022 "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO "- AD REFERENDUM A LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA , CON ID: 402.399
NUMERO DE ADENDAS	1
NUMERO DE RESOLUCION MINISTERIAL	141/2022
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	31,62
PLAZO DE EJECUCION:	11 MESES
MONTO DEL CONTRATO Gs.:	39.726.337.100
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	EXTERNO
NUMERO CUENTA CORRIENTE BANCARIA	100108853-BANCO BASA CTA. CTE.
MODALIDAD DEL LLAMADO	LLAMADO MOPC No. 97/2021
DIRECCION DE EMAIL DE LA EMPRESA	administracion@puntal.net

.....
Ing.Laura Arévalo
Supervisión
M.O.P.C. - D.V.

1309 (Mil trecientos nueve)
0000 ~~IX~~ 12

CONSORCIO CEP

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Sgto. 1° Cespedes Casi Avda. Santisimo Sacramento
Tel.: (021) 290 225 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 16311675
Fecha inicio vigencia: 29/03/2023
Fecha fin vigencia: 31/03/2024
RUC: 80122696 - 1

FACTURA

N° 001-001 0000066

FECHA DE EMISIÓN 27 de febrero de 2024

NOTA DE REMISIÓN N°

RUC: 80004239-5

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Ministerio de Obras Publicos y Comunicaciones - MOPC

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado N°-11 (Enero 24)				
	Contrato MOPC 97/21 Contrato S.G				
	Ministro N°-15/22 "Desarrollo del Pro-				
	yecto ejecutivo y construcción de la				
	terminal de cargas de la ANNP" ID 402394-				
	Trabajos del mes: Gs. —				
	(-) Devoluc. Anticipo: Gs. —				
	(-) Retención Garantía: Gs. —				
	(-) Retención PASA Gs. —				
	= Monto a facturar : Gs. (0)	—			—
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR guaraníes	cero.-				0

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)..... (10%)..... TOTAL IVA:.....

Impresos Omega - RUC: 2661951 - 0 - 01 tal 50x3 del 051 al 100 - 3/2023
HABILITACIÓN N° 1395 - KM. 12 R. TRANS CHACO" TEL 298369 - de Ruth Delgado

ORIGINAL: COMPRADOR - COPIA: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: NO VALIDO COMO CREDITO FISCAL

COD. 3182024

CONTRATISTA CONSORCIO CEP SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO Tel: 290225 Email: licitacionespuntal@gmail.com	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UEP CAF CONTRATO S.G. MINISTRO N° 15/2022	FISCALIZACIÓN: CONSORCIO INTEGRACIÓN HUMAITA Nº145 Tel: 021450360
	OBRA: Licitación Pública Internacional N° 97/2021, DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO. Longitud Total: 1,000 Gl	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 11 Mes/Año: Enero/2024

RESOL. MINISTERIAL N°:	141/2022	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	17/12/2021
FECHA DE CONTRATO:	22/02/2022	ORDEN DE INICIO:	13/03/2023
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 39.726.337.100	PLAZO ORIGINAL:	9 Meses
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 47.648.865.581	PLAZO C.M. 1:	11 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	21,62 %	119,94 %
Avance ejecutado	0,00 %	31,62 %
Teórico	0,00 %	91,86 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									0	0	0
IVA (10%)									0	0	0
TOTAL GENERAL (CON IVA)									0	0	0

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
PUNTAL CONSTRUCCIONES
CONSORCIO CEP

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

1308 Mil trescientos ocho
00011113

00001314
1307 (Mil trecientos siete)

COD. 3182024

CONTRATISTA CONSORCIO CEP SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO Tel: 290225 Email: licitacionespuntal@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UEP CAF	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN HUMAITA Nº145 Tel: 021450360
Obra: Licitación Pública Internacional N° 97/2021, DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO.	**Fecha orden inicio:** 13/03/2023 **Plazo contractual:** 11 Meses	**Certificado Nº:** 11 **Mes/Año:** Enero/2024

HOJA DE MEDICIÓN

Item N°	Descripción - Unidad de medida					
2	Limpieza del terreno.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				3.260,000	0,000	3.260,000
	Total hasta el presente certificado			3.260,000	0,000	3.260,000
8	Desmonte de suelo natural con máquina.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				1.380,000	0,000	1.380,000
	Total hasta el presente certificado			1.380,000	0,000	1.380,000
106	Limpieza del terreno.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				2.500,000	0,000	2.500,000
	Total hasta el presente certificado			2.500,000	0,000	2.500,000
112	Desmonte de suelo natural con máquina.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				825,000	0,000	825,000
	Total hasta el presente certificado			825,000	0,000	825,000
210	Limpieza del terreno.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				2.500,000	0,000	2.500,000
	Total hasta el presente certificado			2.500,000	0,000	2.500,000

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PUNTAL CONSTRUCCIONES
CONSORCIO CEP

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

00000415
1306(Mil trecientos seis)

COD. 3182024

CONTRATISTA CONSORCIO CEP SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO Tel: 290225 Email: licitacionespuntal@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UEP CAF	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN HUMAITA Nº145 Tel: 021450360
Obra: Licitación Pública Internacional N° 97/2021. DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO.	**Fecha orden inicio:** 13/03/2023 **Plazo contractual:** 11 Meses	**Certificado Nº:** 11 **Mes/Año:** Enero/2024

HOJA DE MEDICIÓN

216	Desmonte de suelo natural con máquina.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				725,000	0,000	725,000
	Total hasta el presente certificado			725,000	0,000	725,000

312	Limpieza del terreno.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				1.500,000	0,000	1.500,000
	Total hasta el presente certificado			1.500,000	0,000	1.500,000

318	Desmonte de suelo natural con máquina.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				425,000	0,000	425,000
	Total hasta el presente certificado			425,000	0,000	425,000

358	Limpieza del terreno.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				1.500,000	0,000	1.500,000
	Total hasta el presente certificado			1.500,000	0,000	1.500,000

364	Desmonte de suelo natural con máquina.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				150,000	0,000	150,000
	Total hasta el presente certificado			150,000	0,000	150,000

402	Limpieza del terreno.

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CEP

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

0000116
1Bs(Mil trecientos cinco)

COD. 3182024

CONTRATISTA CONSORCIO CEP SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO Tel: 290225 Email: licitacionespuntal@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UEP CAF	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN HUMAITA Nº145 Tel: 021450360
Obra: Licitación Pública Internacional N° 97/2021, DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO.	**Fecha orden inicio:** 13/03/2023 **Plazo contractual:** 11 Meses	**Certificado Nº:** 11 **Mes/Año:** Enero/2024

HOJA DE MEDICIÓN

	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				1.500,000	0,000	1.500,000
	Total hasta el presente certificado			1.500,000	0,000	1.500,000

408	Desmonte de suelo natural con máquina.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				50,000	0,000	50,000
	Total hasta el presente certificado			50,000	0,000	50,000

448	Limpieza del terreno.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				1.500,000	0,000	1.500,000
	Total hasta el presente certificado			1.500,000	0,000	1.500,000

454	Desmonte de suelo natural con máquina.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				600,000	0,000	600,000
	Total hasta el presente certificado			600,000	0,000	600,000

535	Replanteo y relevamiento planialtimetrico					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				40.890,000	0,000	40.890,000
	Total hasta el presente certificado			40.890,000	0,000	40.890,000

536	Desbroce y retiro de materiales		
	Progresiva		Total certificado

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
PUNTAL CONSTRUCCIONES
CONSORCIO
CEP

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

00011
1304 (Mil trescientos cuatro)

COD. 3182024

CONTRATISTA CONSORCIO CEP SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO Tel: 290225 Email: licitacionespuntal@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UEP CAF	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN HUMAITA Nº145 Tel: 021450360
Obra: Licitación Pública Internacional N° 97/2021, DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO.	**Fecha orden inicio:** 13/03/2023 **Plazo contractual:** 11 Meses	**Certificado Nº:** 11 **Mes/Año:** Enero/2024

HOJA DE MEDICIÓN

	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				35.000,000	0,000	35.000,000
	Total hasta el presente certificado			35.000,000	0,000	35.000,000

541	Replanteo y relevamiento planialtimetrico					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				28.700,000	0,000	28.700,000
	Total hasta el presente certificado			28.700,000	0,000	28.700,000

542	Desbroce y retiro de materiales					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				28.700,000	0,000	28.700,000
	Total hasta el presente certificado			28.700,000	0,000	28.700,000

545	Replanteo y relevamiento planialtimetrico					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				61.660,000	0,000	61.660,000
	Total hasta el presente certificado			61.660,000	0,000	61.660,000

546	Desbroce, desmonte y retiro de materiales					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
				46.200,000	0,000	46.200,000
	Total hasta el presente certificado			46.200,000	0,000	46.200,000

547	Relleno terraplén y compactación de sub rasante, incluye muro de contención					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CEP

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

00001118

1303 (Mil trescientos tres)

COD. 3182024

CONTRATISTA CONSORCIO CEP SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO Tel: 290225 Email: licitacionespuntal@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UEP CAF	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN HUMAITA Nº145 Tel: 021450360
Obra: Licitación Pública Internacional N° 97/2021. DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO.	**Fecha orden inicio:** 13/03/2023 **Plazo contractual:** 11 Meses	**Certificado Nº:** 11 **Mes/Año:** Enero/2024

HOJA DE MEDICIÓN

				60.000,000	0,000	60.000,000
	Total hasta el presente certificado			60.000,000	0,000	60.000,000

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
PONTAL CONSTRUCCIONES
CONSORCIO
CEP

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

COD. 3182024

Curva de avance físico financiero - CONSORCIO CEP - Certificado N°: 11 - Enero/2024

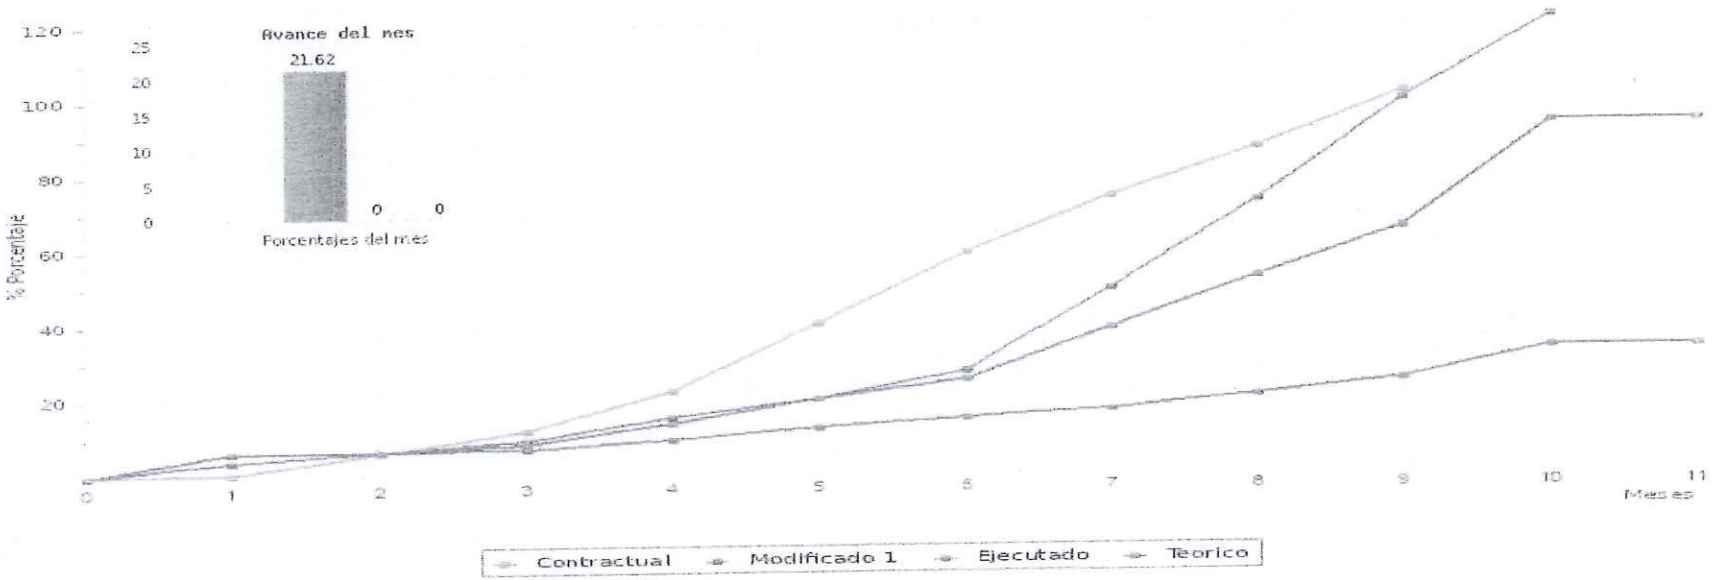

Porcentajes acumulados

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Contr. Parcial	0,41 %	5,10 %	5,70 %	10,26 %	17,75 %	18,77 %	14,80 %	12,93 %	14,28 %		
Contr. Acum.	0,41 %	5,51 %	11,21 %	21,47 %	39,22 %	57,99 %	72,79 %	85,72 %	100,00 %		
Mod. Parcial	3,47 %	2,61 %	2,50 %	2,55 %	3,33 %	4,62 %	7,11 %	21,89 %	23,34 %	26,90 %	21,62 %
Mod. Acum.	3,47 %	6,08 %	8,58 %	11,13 %	14,46 %	19,08 %	26,19 %	48,08 %	71,42 %	98,32 %	119,94 %
Ejec. Parcial	6,04 %	0,00 %	0,08 %	2,48 %	2,89 %	2,47 %	1,92 %	3,65 %	3,70 %	8,39 %	0,00 %
Ejec. Acum.	6,04 %	6,04 %	6,12 %	8,60 %	11,49 %	13,96 %	15,88 %	19,53 %	23,23 %	31,62 %	31,62 %
Teor. Parcial	6,06 %	0,00 %	1,63 %	5,28 %	6,12 %	5,03 %	13,36 %	13,64 %	12,79 %	27,95 %	0,00 %
Teor. Acum.	6,06 %	6,06 %	7,69 %	12,97 %	19,09 %	24,12 %	37,48 %	51,12 %	63,91 %	91,86 %	91,86 %

Obs: El porcentaje programado modificado se tiene en cuenta desde el certificado N° 10

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
PUNTAL CONSTRUCCIONES

CONSORCIO
CEP

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(Doscientos)
30 Marzo 2024

0000120
1301 (Mil trescientos uno)

COD. 3182024

CONTRATISTA CONSORCIO CEP SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO Tel: 290225 Email: licitacionespuntal@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UEP CAF	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN HUMAITA Nº145 Tel: 021450360
Obra: Licitación Pública Internacional N° 97/2021. DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO.	**Fecha orden inicio:** 13/03/2023 **Plazo contractual:** 11 Meses	**Certificado Nº:** 11 **Mes/Año:** Enero/2024

PLANILLA DE PERSONAL - ENERO/2024

#	C.I.	Apellidos y nombres	Cargo
		PRESIDENTE FRANCO	
1	3911527	FRANCOU ROMERO RUFINO DANIEL	ADMINISTRADOR
2	3473064	FUNES TORRES LUIS FRANCISCO	INGENIERO CIVIL
		ASUNCION	
1	3030461	BOVEDA SAMANIEGO LUIS RODRIGO	INGENIERO/A
2	618133	RECALDE VERA BLAS PORFIRIO	ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
PUNTAL CONSTRUCCIONES
CONSORCIO CEP

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

00001121
1300 (Mil trecientos).

COD. 3182024

CONTRATISTA CONSORCIO CEP SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO Tel: 290225 Email: licitacionespuntal@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UEP CAF	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN HUMAITA Nº145 Tel: 021450360
Obra: Licitación Pública Internacional N° 97/2021. DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO.	**Fecha orden inicio:** 13/03/2023 **Plazo contractual:** 11 Meses	**Certificado Nº:** 11 **Mes/Año:** Enero/2024

LISTADO DE EQUIPOS - ENERO/2024

#	Nombre	Codigo	Marca	Modelo	Chapa Nº	Chasis Nº	Cantidad
			PRESIDENTE FRANCO				
1	CAMIONCITO DE APOYO	CAM02	KIA	K2700			1
2	CAMION VOLQUETE	CAM03	SINOTRUCK	HOWO			1
3	MOTONIVELADORA	MOT01	CARTERPILLAR	140 K			1
4	PALA CARGADORA CATERPILLAR	PAL01	JCB	225			1

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
PUNTAL CONSTRUCCIONES
CONSORCIO CEP

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

COD. 3182024

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

Licitación Pública Internacional N° 97/2021. DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO.

Certificado de Trabajo Nº: 11 - Enero/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Mar													10	7	H	10	H	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	5	4	9	10
	Abr	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	H	25	5	H	H	B	B	B	B	35	35	H	H	B	B	B		5	6	11	19
	May	F	20	70	H	H	H	H	H	H	B	B	B	B	B	F	B	B	B	B	B	B	8	H	H	B	B	75	H	H	B	B	4	10	16	15
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	H	20	9	10	8	H	H	H	B	5	19	H	H	H	B	B	B	B	B		7	7	14	16
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	10	80	H	25	30	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	5	5	H	B	B	7	5	12	19
	Ago	B	B	B	B	B	B	8	H	12	H	H	25	H	H	H	B	B	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	7	11	20
	Sep	18	62	H	31	B	B	15	90	H	H	H	H	32	H	H	H	H	B	5	35	H	H	H	H	B	B	15	H	H	H		9	16	25	5
	Oct	H	H	H	28	40	H	40	25	H	H	H	H	8	B	B	B	B	B	70	H	H	H	20	H	H	H	55	140	15	50	H	10	15	25	6
	Nov	35	64	14	H	H	B	B	B	32	H	H	H	B	40	25	H	H	H	B	B	B	B	65	H	H	H	25	12	H	H		9	13	22	8
	Dic	B	20	50	94	21	12	100	H	H	72	H	H	H	B	B	B	B	7	18	38	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	6	16	15

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
PUNTAL CONSTRUCCIONES
CONSORCIO
CEP

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

0001-1722
1259(Mildocientosocuentayocho)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	H	H	H	B	B	B	B	25	H	28	H	B	B	B	8	37	H	B	B	35	35	H	B	B	B	B	30	H	B	B	B	7	8	15	16
	Feb																																0	0	0	0
	Mar																																0	0	0	0

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
PUNTAL CONSTRUCCIONES

CONSORCIO
CEP

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

00017123
1298 Mil doscientos noventa y ocho

00001184
1297(Mil doscientos noventa y siete)

CONSORCIO CEP	CONTRATO S.GMINISTRO 15/2022

"DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO" - CONTRATO S.G 15/2022- AD REFERENDUM A LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CON ID 402.399.

ACTA DE MEDICION -ESTADISTICO CERTIFICADO 11

00001125
1296 Mil doscientos noventay (cu)

COD. 3182024

CONTRATISTA CONSORCIO CEP SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO Tel: 290225 Email: licitacionespuntal@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UEP CAF	FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN HUMAITA N°145 Tel: 021450360

ACTA DE MEDICION
Certificado de Trabajo N° 11 Enero/2024

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	21,62 %	119,94 %
Avance ejecutado	0,00 %	31,62 %
Teórico	0,00 %	91,86 %

En la localidad de PRESIDENTE FRANCO, Departamento de ALTO PARANA, a los 1 dias del mes de Febrero del año 2024, se reúnen, por una parte, el ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS, REPRESENTANTE LEGAL, en representación de CONSORCIO INTEGRACIÓN, el ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO, REPRESENTANTE LEGAL, en representación de PUNTAL CONSTRUCCIONES y el ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA, SUPERVISOR/A DE OBRA, en representación de MOPC; Obra: "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO.", que suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación de los trabajos ejecutados en obra durante el mes de Enero del año 2024.-

De acuerdo a las C.G.C., las cantidades que figuran en el acta del presente certificado no tienen carácter definitivo, por lo tanto cualquier error u omisión serán rectificados en los próximos certificados. Los ítems ejecutados son los siguientes:

Item N°	Descripción de los trabajos	U/M	Cantidades		Cantidades ejecutadas			
			Contractual	C.M. 1	Anterior	Presente	Acumulado	% Ejecut.

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
PUNTAL CONSTRUCCIONES
CONSORCIO
CEP

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

00001126
1295 (Mil doscientos noventa y cinco)

COD. 3182024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO CEP SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO Tel: 290225 Email: licitacionespuntal@gmail.com	**CONSORCIO INTEGRACIÓN** HUMAITA Nº145 Tel: 021450360	**Certificado N°:** 11 **Mes/Año:** Enero/2024

FECHA DE CONTRATO:	22/02/2022
ORDEN DE INICIO:	13/03/2023
PLAZO CONTRACTUAL:	9 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 36,114,851,909
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 39,726,337,100
PLAZO VIGENTE:	11 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 43,317,150,528
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 47,648,865,581

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif. Vig.	21, 62 %	119, 94 %
Avance ejecutado	0, 00 %	31, 62 %
Teórico	0, 00 %	91, 86 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	12.567.853.305
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	12.567.853.305
	3. Monto de los trabajos del mes	0
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	0

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	0
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	0
	5. Devolución de anticipo (20%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-0
	6.1 Retención de garantía - Gestión Ambiental (2%)	-0
	6.2 Devolución retención de garantía - Gestión Ambiental (2%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	0
	9. Son guaranies: Cero	

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
PUNTAL CONSTRUCCIONES

CONSORCIO
CEP

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

00001127
1294 (Mil doscientos noventa y cuatro)

COD. 3182024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO CEP SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO Tel: 290225 Email: licitacionespuntal@gmail.com	**CONSORCIO INTEGRACIÓN** HUMAITA Nº145 Tel: 021450360	**Certificado N°:** 11 **Mes/Año:** Enero/2024

FECHA DE CONTRATO:	22/02/2022
ORDEN DE INICIO:	13/03/2023
PLAZO CONTRACTUAL:	9 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 36.114.851.909
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 39.726.337.100
PLAZO VIGENTE:	11 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 43.317.150.528
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 47.648.865.581

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	21,62 %	119,94 %
Avance ejecutado	0,00 %	31,62 %
Teórico	0,00 %	91,86 %

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 20% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	7.945.267.420
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	2.513.570.661
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	2.513.570.661
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	5.431.696.759
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	628.392.665
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	628.392.665
IV	**RETENCIONES PLAN DE GESTION AMBIENTAL**	**TOTAL GS.**
	1. Retención de garantía - Gestión Ambiental (2%)	0
	2. Retenciones - Gestión Ambiental acumuladas hasta el mes anterior	251.357.066
	3. Retenciones - Gestión Ambiental acumuladas	251.357.066
	4. Devolución de retenciones - Gestión Ambiental	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	12.567.853.305
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	5.431.696.759
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	628.392.665
	6.1 Retenciones - Gestion Ambiental acumuladas	251.357.066
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	17.119.800.333

ING. LUIS RODRIGO OVIEDO SAMANIEGO
CONSORCIO
PUNTAL CONSTRUCCIONES
CEP

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ARQ. MARIA CRISTINA ORTEGA DE HERREROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEGRACIÓN

1293 - (Mil doscientos noventa y tres)

00001123

CONSORCIO CEP	CONTRATO S.GMINISTRO 15/2022

"DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO" - CONTRATO S.G 15/2022- AD REFERENDUM A LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CON ID 402.399.

REAJUSTE INICIAL CERTIFICADO 11

0000129

1292 (Mil doscientos noventa y dos)

COD. 15232024

CONTRATISTA CONSORCIO CEP SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO Tel: 290225 Email: licitacionespuntal@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UEP CAF	FISCALIZACIÓN Tel:

CERTIFICADO NORMAL N° 17

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

Certificado	Boletin	Tipo	Ajuste
Certificado Nº 1 - Marzo/2023	Marzo/2023	INICIAL	453.177.762
Certificado Nº 2 - Abril/2023	Abril/2023	INICIAL	0
Certificado Nº 3 - Mayo/2023	Mayo/2023	INICIAL	1.777.612
Certificado Nº 4 - Junio/2023	Junio/2023	INICIAL	83.598.586
Certificado Nº 5 - Julio/2023	Julio/2023	INICIAL	13.561.032
Certificado Nº 6 - Agosto/2023	Agosto/2023	INICIAL	3.744.974
Certificado Nº 7 - Septiembre/2023	Septiembre/2023	INICIAL	0
Certificado Nº 8 - Octubre/2023	Octubre/2023	INICIAL	12.959.024
Certificado Nº 9 - Noviembre/2023	Noviembre/2023	INICIAL	90.538.702
Certificado Nº 10 - Diciembre/2023	Diciembre/2023	INICIAL	1.006.663.887
Certificado Nº 11 - Enero/2024	Enero/2024	INICIAL	0
Certificado Nº 12 - Febrero/2024	Febrero/2024	INICIAL	84.076.473
Certificado Nº 13 - Marzo/2024	Marzo/2024	INICIAL	106.910.261
Certificado Nº 14 - Abril/2024	Abril/2024	INICIAL	166.885.010
Certificado Nº 15 - Mayo/2024	Mayo/2024	INICIAL	44.638.906
Certificado Nº 16 - Junio/2024	Mayo/2024	INICIAL	345.025.262
Certificado Nº 17 - Julio/2024	Mayo/2024	INICIAL	452.277.129
		TOTAL REAJUSTES INICIALES	**2.865.834.620**
		TOTAL DE REAJUSTES	**2.865.834.620**
		SUBTOTAL	**2.605.304.200**
		IVA 10%	**260.530.420**
		TOTAL	**2.865.834.620**

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL
PUNTAL CONSTRUCCIONES

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC
