SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel. 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

Nº 22/21

Fernando de la Mora, 04 de mayo de 2021

Señor

Ing. Fredy G. Ramírez V., Coordinador de

Fiscalización. Universidad Nacional de Caaguzú

PRESENTE

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS OR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL – ID Nº 360.254 (Lote 4 – Guaira) – CONTRATO Nº 29/2020

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud, en relación al Contrato de referencia a fin de solicitar prórroga del plazo de ejecución de los trabajos contratados debido a inclemencias climáticas en la zona de influencia de las instituciones educativas componentes del lote 4 del departamento Guaira. La prórroga solicitada es de 6 (seis) días por dias de lluvias y sus consecuencias. Adjuntamos copia del **"REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA"** de la localidad de Villarrica del Espíritu Santo (mes de Abril/2021), emitida por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

Atentamente,

Carmelo Desvars Villalba

Representante Legal

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: A. Hon Zevallos

DIA	MES	AÑO	HORA
06	05	2021	15:18

DIAS DE LLUVIAS

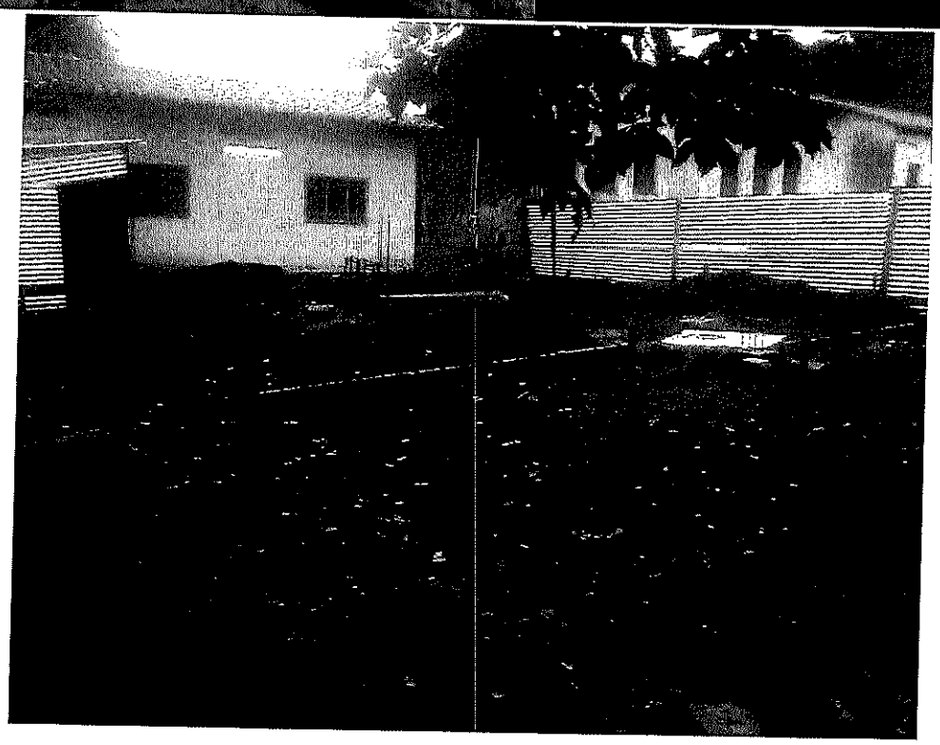

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				8,7								
6				2,1								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				9,1								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				20,6								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				13,4								
24				26,6								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				80,5								
Máx,24h				26,6								
Día Máx.				24								

Lic. María Lourdes Arturo G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Arturo Zarate
DIA 06 MES 05 AÑO 2021 HOR. 15:18

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

MEMORÁNDUM CAC N° 151/2021.

A: **Arq. PATRICIA SÁNCHEZ,** Coordinadora,
Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

DE: **Abg. SIXTO MILCIADES RIVAS LAGUARDIA,** Coordinador,
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones.

FECHA: 31 de mayo de 2021.

REFERENCIA: **CARTA INTERNA CPI N° 05/2021. Exp. N° 2872/21.**

Tengo el agrado de dirigirme a **Usted**, en relación a la Carta Interna de referencia a través del cual se remite el Dictamen Técnico N° 01/2021 y la aprobación de solicitud de prórroga de plazo por inclemencias climáticas del mes de abril/2021 de la empresa SENDERO S.A, según Contrato N° 29/2020 - Lote N° 04 - Departamento de Guairá.

Al respecto, de acuerdo al análisis del expediente, se verifica que:

- En el Informe Técnico de fecha 25 de mayo del corriente, transcriben los plazos del PBC que no corresponde al llamado de la Licitación Pública Nacional/ Subasta a la Baja Electrónica N° 02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reposiciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI" – Plurianual – ID N° 360.254

- En el Informe Técnico UNCA N° 01/2021 de fecha 12 de mayo del corriente, estipula que el Fiscal **RECOMIENDA** proceder a la prórroga por lluvias y sus consecuencias, pero en este caso debe **APROBAR** las prórrogas por inclemencias climáticas y/o fuerza mayor y el Supervisor de la CPI deberá **RATIFICARSE** en los términos de la aprobación del Fiscal de Obras – UNCA, según el Anexo I "Alcance y Especificaciones Técnicas del Servicio" del Convenio Específico de Cooperación entre el MEC y UNCA.

Por lo tanto, procedemos a la devolución del expediente original y sus antecedentes, a fin de realizar la verificación de conformidad a lo que dispone el "Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú", suscripto con UNCA, y las disposiciones establecidas en el PBC y su respectivo Contrato.

Atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. N° 3003
Natalia P
01 06 2021 8:04

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 2872 **Año:** 2021

Fecha 26/05/2021 **Fecha Ingreso:** 26/05/2021

Fecha Límite: 26/05/2021

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FONACIDE>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >Informes >

Referencia: CARTA INTERNA N° 00015, CPTI

Tipo de Doc: Carta

Asunto: Remitir informe técnico - Justificación con relación a la OS N° 01/20, que no se ejecutan al 100 % -

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Luis Romero	Luis Romero	26/05/2021	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Luis Romero	UOC	26/05/2021	Coordinación de	Pendiente	

A: Departamento de Contratos y Garantías.

Asunción, 26 de mayo de 2021.

MEMORÁNDUM CAC N° 173/2021.

A: **Arq. PATRICIA SÁNCHEZ,** Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

DE: **Abg. SIXTO MILCIADES RIVAS LAGUARDIA,** Coordinador
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones.

FECHA: 08 de junio de 2021.

REFERENCIA: **MEMORÁNDUM N° 462/2021. Exp. N° 3168/21.**

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS • Unid. Ejec. de Prog. y Proy. • Coord. de Adq. y Contrataciones • Asunción - Paraguay

Tengo el agrado de dirigirme a **Usted**, en relación al Memorándum de referencia a través del cual se remite el Informe Técnico N° 01/2021 de la fiscalizadora UNCA, y la aprobación de solicitud de prórroga de plazo por inclemencias climáticas del mes de abril/2021 de la empresa SENDERO S.A, según Contrato N° 29/2020 - Lote N° 04 - Departamento de Guairá.-

De acuerdo a la verificación del expediente se observa, cuanto sigue:

1. El **Informe Técnico N° 01/2021** de fecha 12/05/2021 elaborado por el Arq. Hugo Bernal - Fiscal de Obras (UNCA) - Lote 04 – Guairá, en la Pag N° 2 dice: *"**ANALISIS**...según se establece en los "**ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS**", en la **Sección C. Plazos, Inciso "4 .Inclemencias Climáticas"**, que expresa: "En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de **plazo máximo de seis (6) días** del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato...".*

   Al corroborar, los "**ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS",** en la **Sección C. Plazos, Inciso "4. Inclemencias Climáticas",** se observa cuanto sigue*: "En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de **plazo máximo de siete (7) días** del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará*

RECIBIDO POR: Felix Duré
DIA 08 | MES 06 | AÑO 2021 | HORA 16:15

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Diaz esq. Hernandarias – Edificio Natura
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato... ".

En cuanto a los "Aspectos Generales para la Contratación de Obras", no pueden ser alterados los plazos establecidos en la Sección C. Plazos, Inciso "4. Inclemencias Climáticas", independientemente a lo establecido en el apartado "8. Certificaciones Mensuales", que estipula: *"Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de certificaciones mensuales que abarcarán un mes calendario. **Dentro de los seis (6) días** siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, el contratista presentará al fiscal de obra, una certificación mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecución del contrato... ".*

2. **CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS Y VIGENCIA DE GARANTÍAS - (PRO-004):** En cuanto a la emisión de la Orden de Servicio N° 2 figura en fecha 08/04/21 y fecha de vencimiento del plazo 04/09/21. El PBC numeral 16 de las Condiciones Contractuales, dispone: *"16. Plazo de ejecución. **El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras**, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:*
-Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
*-Plazo de ejecución de las Obras: **será de 150 días.***
-La entrega de la zona de Obras: será TOTAL.

En este sentido, a los efectos de la correcta contabilización de los plazos, se solicita adjuntar copia de la Orden de Servicio N° 02/2021.-

Por todo lo expuesto, procedemos a remitir el Expediente original y sus antecedentes, a los efectos de su verificación y ajustes pertinentes, a fin de continuar con los tramites de rigor.-

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Dpto. de Prog. y Proy.
Coord. de Adq. y Contrat.
Asunción - Paraguay

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Diaz esq. Hernandarias – Edificio Natura
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 3168 **Año:** 2021

Fecha 07/06/2021 **Fecha Ingreso:** 07/06/2021

Fecha Límite: 07/06/2021

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FONACIDE>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >Informes >

Referencia: MEMO 0462 CPI

Tipo de Doc: Memo

Asunto: Remitir Informe Técnico - Lluvias abril 2021. Remisión aprobada de solicitud. Empresa SENDERO S.A Lote 04

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Natalia	Natalia	07/06/2021	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Natalia	UOC	07/06/2021	Coordinación de	Pendiente	

A: Departamento de Contratos y Garantías.

Asunción, 07 de junio de 2021.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

NOTA UNCA / MEC Nº 131/2021 / LOTE 4

Coronel Oviedo, 11 de junio de 2021

C.P. Dalila Zarza
Coordinador General de la UEPP
Presente:

Ref.: **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - ID Nº 360.254"

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de **remitir corrección solicitada en cuanto a la fecha de Inicio de Obras – Orden de Servicio 2.** De dicha solicitud fueron aprobadas **4 DÍAS DE PRÓRROGA,** correspondiente al **Lote 04**, presentada en fecha **06 de mayo de 2021**, debido a lluvias y sus consecuencias del mes de abril del corriente.

Se adjuntan a la nota

- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de abril 2021 (01/04/2021 al 30/04/2021).
- Informe de Fiscalización N° 1- PRO-004

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

3381
Notaría
11 : 00 : 21 15:20

MES DE ABRIL				
	LIBRO DE OBRA y PLANILLA DINAC			
DIA	LLUVIAS EN LIBRO GUAIRA	REGISTRO DINAC GUAIRA	TOTAL	APROBADA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	Lluvia	9.1	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
12				
13				
14				
15	Lluvia	20.6	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23	Lluvia	13.4	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
24	Lluvia	26.6	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
				4

Días de lluvia según registro de DINAC: 4 días
Días de lluvia según libro de obra: 4 días
Días de Afectación según libro de obra: 0 días
Días en Total: **4 días**

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Prorrogas mes de Abril		
		Fecha de fin de plazo corrida (solicitada)
Plazo OS2	150 dias	
Fecha de Inicio de Obras - Orden de Serivicio 2	08/04/2021	04/09/2021
Prorroga por lluvia de Abril (solicitada)	4 dias	08/09/2021

Teniendo en cuenta:

- **4 días** de prorroga solicitados en la presente nota.

La fecha de fin de plazos se correría **154 días en total**, siendo la misma el **08 de septiembre de 2021.**

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
GUAIRA	IV	LOTE 4 – Guaira	Del 08-abril-21 a 30-abril-21	Nº 01 (Abril-2021)

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	GUAIRA	
Contratista:	SENDERO S.A.	
Contrato Nº.	29/2020	
Objeto del Contrato:	LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"	
Fiscalizadores:	**UNCA (Convenio Específico c/Univers. Nac. Caaguazú)**	
Fecha de suscripción del Contrato:	11-Diciembre -2020	
Monto Total del Contrato en Gs.:	6.230.971.774 Gs.	**Plazo Contrato(Días):** 150 DIAS
Fecha de Entrega del anticipo:	28- Diciembre -2020	**Monto del anticipo (20%):** Proyecto N° 272: Gs.1.246.194.355
Fecha de inicio de las obras:	05-abril -2021 - Orden Servicio 2	-
Fecha de inicio efectivo de las obras:	08-abril -2021 - Orden Servicio 2	**Fecha de vencimiento del plazo según Cronograma Fisco Financiero:** 04/09/2021 ✓

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario (08-abril -2021 al 30-abril-2021)	23
b.	Cantidad de días de lluvias registradas (desde el 08-04-2021 al 30-04-2021), Regist. DINAC y Libros de Obra	4
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	0
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	*
e.	Días de Ejecución Efectiva al mes del Certificado 1 (cuyo periodo tiene en total: 23 días)	19
f.	Condiciones de accesibilidad:	
g.	Otras Observaciones:	

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 12 instituciones del Lote N° 4 - Guaira Capital, Villarica.

b. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): **150** días
b. Plazo de Ejecución efectiva (días): **19 días (1° Fiscalización)**
   i. Certificado 1: 19días.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

c. Plazo Restante (días): -131días **(respecto al plazo de ejecución original)**

c. **AVANCE FISICO DE OBRAS: 17.46%**
Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

d. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 17.46 % = Gs. 853.598.078**
Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

e. **MULTAS APLICADAS**

a. Monto del mes: Gs. 0

b. Multa Acumulada (%): 0 %

f. **VIGENCIA DE GARANTIAS**

a. Garantía de cobertura de anticipo: VIGENTE.
   i. Cubre hasta 31/12/2021
   ii. Empresa de Seguros: ***SEGUROS CHACO S.A.***

b. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE.
   i. Cubre hasta 31/01/2022.
   ii. Empresa de Seguros: ***SEGUROS CHACO S.A.***

c. Seguro contra accidentes de trabajo:
   i. Cubre hasta 15/08/2021.
   ii. Empresa de Seguros: ***SEGUROS CHACO S.A.***

d. Seguro contra los riesgos en zona de obras:
   i. Cubre hasta 14/10/2021.
   ii. Empresa de Seguros: ***SEGUROS CHACO S.A***

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000004

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 373 HILARIA SANABRIA (COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA Y CENTRO 4-9)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	11/04/2021	En la jornada se registran precipitaciones de consideración		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
Marcación de zapatas.				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Nataí Cayoso
Cayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000008

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 373 HILARIA SANABRIA (COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA Y CENTRO 4-9)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 15/04/2021	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	15/04/2021	Se registran		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS		precipitaciones		
Excavación		de consideración		
de zapatas.				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Natalia Bayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.582
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIONY CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 373 HILARIA SANABRIA (COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA Y CENTRO 4-9)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 23/04/2021	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
No se realizan actividades en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 23/04/2021	En la fecha se registran precipitaciones considerables.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Carga de hormigón para troncos de columnas.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD.

EMPRESA CONTRATISTA
Natalia Gayoso
FIRMA Y SELLO FECHA

Hugo Bernal
Arquitecto
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000017

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 373 HILARIA SANABRIA (COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA Y CENTRO 4-9)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 24/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
No se realizan actividades en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	24/04/2021		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Se registran en la fecha precipitaciones de considerable intensidad.		
Carga de hormigón para troncos de columnas			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Natalia ...
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Benítez
Arquitecto
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000004

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 950 CIPRIANO OCAMPOS (COLEGIO NACIONAL CIPRIANO OCAMPOS)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
En la fecha se inician los trabajos de excavacion para zapatas; tambien se realiza la provisión de 4.000 ladrillos prensados	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 11/04/2021			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Sin actividad debido a la lluvia a partir de las 9 hs.		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	Se verifican que dichos trabajos fueron realizados

Natalia Gaypo
EMPRESA CONTRATISTA
Natalia Gaypo Barrios
FIRMA Y SELLO
ARQUITECTA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 / 527 296 - Tel. 50 ...

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000008

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 950 CIPRIANO OCAMPOS (COLEGIO NACIONAL CIPRIANO OCAMPOS)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 15/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 15/04/2021	Dia lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
-Excavación de zapatas.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	

OBSERVACIONES: SIN ACTIVIDAD

Natalia Cayoso Barrios
ARQUITECTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
FISCAL N° 2.[illegible]
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Impresión S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 / 527 295 - Tel. 50 x 3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 950 CIPRIANO OCAMPOS (COLEGIO NACIONAL CIPRIANO OCAMPOS)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 23/04/2021.	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	23/04/2021	Dias lluviosos		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD

Natalia Gayoso Barrios
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Impresora S.R.L. - Telefax: (021) 611 906 / 627 206 - Tel. 50 x 2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000017

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 950 CIPRIANO OCAMPOS (COLEGIO NACIONAL CIPRIANO OCAMPOS)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 24/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
En la fecha se realizan trabajos de preparado para cargar zapatas; pero se empieza a mojar por lluvias y se suspende el cargamento.	EN FECHA 24 DE ABRIL SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 24/04/2021	Dia lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SE VERIFICA SIN ACTIVIDAD

Natalia Barrios
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
FISCAL Nº 2.532
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000004

INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE Nº 10 VICTORINA CABALLERO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 11/04/2021	Dia lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN NOVEDAD.

Natalia Gayoso Martínez
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000008

INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE Nº 10 VICTORINA CABALLERO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 15/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 15/04/2021	Día lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD

Natalia Gayoso
Natalia Gayoso Santos
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2332
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE Nº 10 VICTORINA CABALLERO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DIA: 23/04/2021	

CONTRATISTA	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
23/04/2021	Dia lluvioso.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
- Cargado de excedente.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Natalia Goyos
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000017

INSTITUCION EDUCATIVA:	CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE Nº 10 VICTORINA CABALLERO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 24/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad en Obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS
9/4/2021	Dia lluvioso
	-Cargado de encadenado.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD.

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000004

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 137 SAN PASCUAL
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11-04-2021	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	11-04-2021	En la jornada se		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS		registraron lluvias		
		de consideración.		
Marcación de				
zapatas				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD.

Natael Cayo

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.582

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000009

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 137 SAN PASCUAL
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 15.04.2021	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	15.04.2021	Se registraron		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS		lluvias de		
		consideración		
Excavación de zapatas.				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD.

Natalia Lopez
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000017

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 137 SAN PASCUAL
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 13.04.2021	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	23.04.2021		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	En la fecha se registran precipitaciones de consideración		
Carga de Hormigon de Zapatas.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD

EMPRESA CONTRATISTA
Natalia [illegible]
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.952
FISCAL
FIRMA Y SELLO

Ingeniero
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000018

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 137 SAN PASCUAL
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DIA: 24.04.2024	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
No se realizan actividades en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 24 / 04 / 2024			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	En la fecha se registran precipitaciones en zona de Obras		
Carga de HO en zapatas			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN NOVEDAD

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000005

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 183 VALERIO GODOY
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 11/04/2021	Sin actividad debido a la lluvia producida en la jornada		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000009

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 183 VALERIO GODOY
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 15/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 15/04/2021	Sin actividad por lluvias en la jornada		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Cargado de H° de limpieza excavacion de zapatas armado de armaduras			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. MOPC N° 2.532
FIRMA Y SELLO

C.I. UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000017

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 183 VALERIO GODOY
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 23/04/2021	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
En la Fecha no se registra actividades en obra;	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
23/04/2021	Jornada de lluvias		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Cargado de Zapatas			
Cargado de troncos			
Relleno de Foso			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal Arquitecto Reg. Prof. Nº 2432 FISCAL FIRMA Y SELLO

CPI UEPP FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000018

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 183 VALERIO GODOY
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 24/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 24/04/2021	Dia lluvioso.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Cargado de Zapatas			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Rep. FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000004

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 183 DIGNA E. BENÍTEZ CENTRO 4-114 ESCUELA DE ARTE PÚBLICA
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 11/04/2021	En la fecha se registraron lluvias de intensidad considerable.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Marcación de zapatas para su excavación.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD

Natalia Gayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ImpreGraf S.R.L.- Telefax: (021) 511 906 / 527 296 - Tel. 50 - 3

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000008

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 183 DIGNA E. BENÍTEZ CENTRO 4-114 ESCUELA DE ARTE PÚBLICA
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 15/04/2021	

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS:

Sin actividad en obra.

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	15/04/2021
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Se registran lluvias de consideración en zona de obra. Excavación de zapatas.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN NOVEDAD

Natalia Cayos Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

Ingeniero
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ImpreGraf S.R.L.- Telefax: (021) 511 906 / 527 296 - Tel. 60 - 2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 183 DIGNA E. BENÍTEZ CENTRO 4-114 ESCUELA DE ARTE PÚBLICA
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 23/04/2021	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	23/04/2021	En la fecha		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS		Se registran precipitaciones de considerable intensidad.		
Corgo de hormigón de Zapatas.				

FUERZA MAYOR

ACCESOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN NOVEDAD.

Natalia Cayoso Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Mat. Prof. Nº 2532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

Ingeniero Civil
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000017

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 183 DIGNA E. BENÍTEZ CENTRO 4-114 ESCUELA DE ARTE PÚBLICA
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 24/04/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
No se realizan actividades en obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 24/04/2021			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	En la fecha se registran precipitaciones de considerable intensidad.		
Carga de hormigón de zapatas.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	Sin novedad.

Natalia Bayoso Bantos
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 611 006 / 607 000 - Tel. 60...

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000004

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL PASO YOBAI
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 11-04-2021	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad en la Obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 11-04-2021			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Sin actividad en la obra a causa de la lluvia producida en la jornada.		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN NOVEDAD

Marcelo Caposo Barrios
Representante
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000005

INSTITUCION EDUCATIVA:	COLEGIO NACIONAL PASO YOBAI
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A.
LOTE 4 - GUAIRA - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA: 12.04.2021	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	12.04.2021		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Lluvia del día anterior. embarró zona de obra. Se procede a limpieza de la zona		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	SIN ACTIVIDAD.

Natalia Galeano Barrios
ARQUITECTA
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO
