SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Asunción, 5 de enero de 2021

Señora:
Arq. Patricia Josefina Sánchez de Ávila
Coordinadora
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: "Contratación Vía Excepción Nº 01/2019: Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas constructivas alternativas mixtas. Plurianual. ID Nº 356937. Contrato Nº 10/2019: Lote 2: Guairá, Caazapá. Lote Nº 4: Central. Lote Nº 5: Alto Paraná. Lote Nº 6: Capital, Paraguarí.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en relación a los cálculos de afectación por días de lluvia, del Mes de **diciembre de 2020** de nuestro Lote. Conforme a las nuevas disposiciones, hemos realizado los ajustes y conteo de las incidencias climáticas, conforme al Libro de Obras e Informe de Registros de lluvia de la DINAC para el siguiente periodo.

Periodo	Certificado	Registro **Dinac incidencias**	Incidencias **Libro de Obras**	Cantidad de días de prórroga
Diciembre 2020 (Caazapá)	Certificado del mes	12 días	12 días	**12 días**
Diciembre 2020 (Guaira)	Certificado del mes	9 días	9 días	**9 días**

Sin nada más que agregar, me despido cordialmente.

Ing. Luis Maria Gulino
Representante legal

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 0047
Recibido por: Natalia P.

DIA	MES	AÑO	HORA
06	01	2021	1132

Dirección: Pariri Nro. 1013 casi Av. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550283 - **Sitio web:** www.scc.com.py

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CAAZAPÁ	26° 10' 31,70"	56° 21' 16,92"	142 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												2,0
2												29,0
3												0,0
4												8,5
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												T
13												1,1
14												0,0
15												6,7
16												14,4
17												0,0
18												2,2
19												44,4
20												11,8
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												50,0
27												0,0
28												0,0
29												7,6
30												3,6
31												0,0
Total												181
Máx. 24h												50
Día Máx.												26

Ing. María Lourdes Aveiro G.
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

13 DIAS

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												50,4
3												4,0
4												9,8
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												10,4
14												0,0
15												14,5
16												17,3
17												0,0
18												0,0
19												45,6
20												5,9
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												0,0
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												19,5
31												0,0
Total												177
Máx,24h												50,4
Día Máx.												2

Lic. Mario Lourdes Aveiro C.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

CAAZAPÁ-Esc. Básica Nº 60 Comercio Fray luis de Bolaños-
CAAZAPA VISCAINO KUE

	CRONOGRAMA FISICO - FIANCIERO	ORDEN 01	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08
			sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21
3	ALBAÑILERIA GENERAL									
4	SISTEMA DE FUNDACIÓN									
5	AISLACIONES INFERIORES									
6	INSTALACIONES SANITARIAS									
9	PISOS HORMIGON, REVESTIMIENTOS CERÁMICOS									
10	MURO DE TIERRA									
11	TABIQUES DE YESO CARTÓN									
12	ESTRUCTURAS DE HºAº									
13	AISLACIÓN LOSAS									
14	ABERTURAS - HERRERIA									
15	ABERTURAS - VIDRIOS									
16	INSTALACIÓN ELECTRICA									
17	PINTURAS									
18	SISTEMA PCI									
19	JARDINERIA									
	% PARCIALES DE AVANCE	5,09%	2,01%	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	22,00%	24,00%	26,90%
	ACUMULADO PREVISTO	5,09%	7,10%	9,10%	13,10%	19,10%	27,10%	49,10%	73,10%	100,00%
	EJECUTADO	7,65%	24,72%	16,13%	3,74%					
	% ACUMULADO EJECUTADO	7,65%	32,37%	48,49%	52,24%					

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

GUAIRÁ- Esc. Básica Nº 52 Félix Pérez Cardozo- FELIX PEREZ CARDOZO, CENTRO

	CRONOGRAMA FISICO - FIANCIERO	ORDEN 01	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08
			sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21
3	ALBAÑILERIA GENERAL									
4	SISTEMA DE FUNDACIÓN									
5	AISLACIONES INFERIORES									
6	INSTALACIONES SANITARIAS									
9	PISOS HORMIGON, REVESTIMIENTOS CERÁMICOS									
10	MURO DE TIERRA									
11	TABIQUES DE YESO CARTÓN									
12	ESTRUCTURAS DE HºAº									
13	AISLACIÓN LOSAS									
14	ABERTURAS - HERRERIA									
15	ABERTURAS - VIDRIOS									
16	INSTALACIÓN ELECTRICA									
17	PINTURAS									
18	SISTEMA PCI									
19	JARDINERIA									
	% PARCIALES DE AVANCE	5,09%	2,01%	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	22,00%	24,00%	26,90%
	ACUMULADO PREVISTO	5,09%	7,10%	9,10%	13,10%	19,10%	27,10%	49,10%	73,10%	100,00%
	EJECUTADO	7,57%	17,38%	6,11%	3,39%					
	% ACUMULADO EJECUTADO	7,57%	24,95%	31,06%	34,45%					

Ing. Luis M. Guijno C.
Representante Legal

OFERENTE : SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Ítems del llamado Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas constructivas mixtas con ID: 356937

LOTE NRO: 2-4-5-6

GENERAL DEL CONTRATO 10/2019

DETALLE	CERT.01 DIO SERV 01	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	(Plazo 65 dias)	(Plazo 245 dias)											
% Mensual Previsto	5,09%	2,00%	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	22,00%	24,00%	26,90%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%
% Acumulado Previsto	5,09%	7,10%	9,10%	13,10%	19,10%	27,10%	49,10%	73,10%	100,00%				
% Mensual EJECUTADO	5,09%	5,08%	9,42%	1,85%	2,77%	5,95%	9,36%	12,18%	8,87%	14,02%	13,71%	8,01%	6,19%
% Acumulado EJECUTADO	5,09%	10,17%	19,59%	26,73%	29,50%	35,46%	44,83%	57,01%	63,59%	67,85%	81,56%	89,58%	89,89%
% AJUSTADO POR LLUVIAS	No APLICA	0,80%	0,67%	0,93%	1,40%	1,60%	6,53%	4,80%	8,07%	2,65%	1,13%	2,27%	2,27%
% AJUSTADO POR COVID-19	No APLICA	No APLICA	No APLICA	1,47%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	8,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% AJUSTADO GUAIRA - CAAZAPA	No APLICA	No APLICA	No APLICA	No APLICA	No APLICA	No APLICA	No APLICA	No APLICA	No APLICA	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Acumulado Ajustado por lluvia	5,09%	6,30%	7,63%	10,70%	11,43%	17,83%	33,31%	52,51%	63,27%	51,97%	62,18%	71,26%	80,34%
Monto de Oferta en Millones de Guaranies :		16.731.049.876											

PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL - PLAN DE DESEMBOLSO CERTIFICACIONES MENSUALES

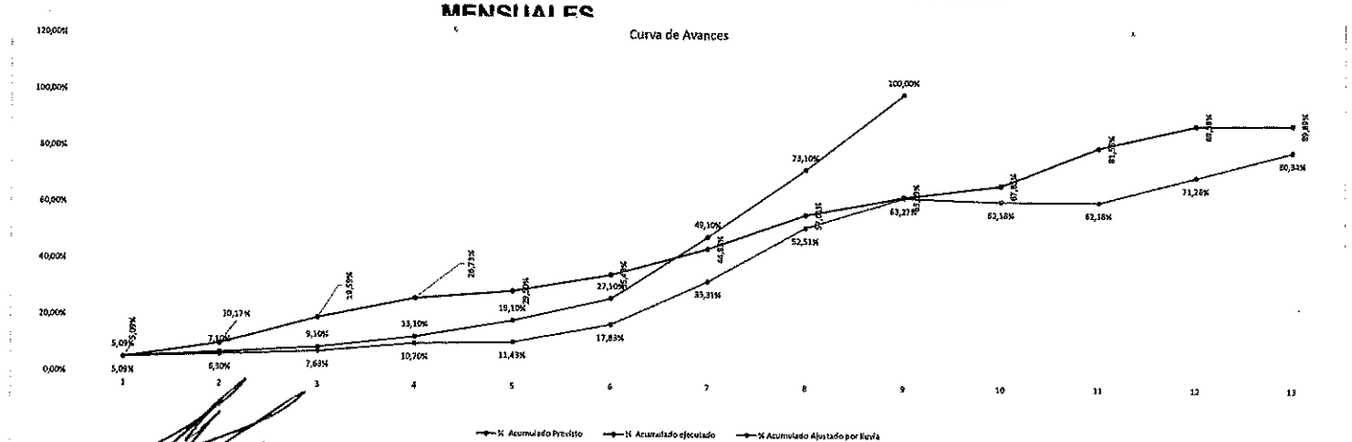

FIRMA
Oferente o Representante Legal
Nombre legal : SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SA

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000082

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica N° 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 01/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

ISABEL CÉSPEDES
ARQUITECTA
Reg. N° 3.345

SANDRA ELENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Preyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000083

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica N° 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 02/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

ISABEL CESPEDES
ARQUITECTA
Reg. N° 3.344

SANDRA ELENA RHEINECK
a. Apoderada
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000085

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica N° 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 4/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

ISABEL CÉSPEDES
ARQUITECTA
Reg. N° 3.345

SANDRA ELENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/002200 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000093

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica N° 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 12/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

ISABEL CÉSPEDES
ARQUITECTA
Reg. N° 3.345

SANDRA ELENA RHEINECK
a r q u i t e c t a

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000094

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica N° 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 13/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA

ISABEL CÉSPEDE
ARQUITECTA
Reg. N° 3345
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Enero -2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000097

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica Nº 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 16/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	
Tiempo lluvioso.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Noviembre - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000099

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica Nº 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 18/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

ISABEL CESPEDES
ARQUITECTA
Reg. N° 3.345

SANDRA ELENA RHEINECK
a EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreles
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000100

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica N° 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 19/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Noviembre - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000101

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica N° 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 20/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

ISABEL CÉSPEDE
ARQUITECTA
Reg. N° 6.34F

SANDRA ELENA RHEINECK

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 274 620 / 0981 885 000

ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000108

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica Nº 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 26/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad	LLUVIA
Tiempo lluvioso	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 00000111

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica Nº 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 29/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

ISABEL CESPEDES
ARQUITECTA
Reg. Nº 2345
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000112

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica Nº 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 30/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

ISABEL CÉSPEDES
ARQUITECTA
Reg. N° 3.345

SANDRA ELENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000113

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica N° 60 Comercio Fray Luis de Bolaños - Caazapá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 31/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por humedad excesiva	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

ISABEL CESPEDE
ARQUITECTA
Reg. N° 3.345

SANDRA ELENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000084

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica N° 52 Félix Pérez Cardozo - Guairá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 3/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad Lluvioso	SIN ACTIVIDAD - LLUVIOSO -

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR
Ingeniero

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Propietarias) b/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Noviembre 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000085

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica N° 52 Félix Pérez Cardozo - Guairá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 4/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad Lluvioso	LLUVIA.-

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Noviembre - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000086

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica Nº 52 Félix Pérez Cardozo - Guairá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 5/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	Lluvia. —
Lluvioso	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
Arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Noviembre - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

Antonio Pelaez García

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000087

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica N° 52 Félix Pérez Cardozo - Guairá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 6/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Domingo - Sin actividad por humedad excesiva	SIN ACTIVIDAD. -

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreles
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Noviembre - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000094

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica Nº 52 Félix Pérez Cardozo - Guairá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 13/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Domingo sin actividad por lluvia.	Sin actividad. —

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Noviembre - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000097

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica Nº 52 Félix Pérez Cardozo - Guairá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 16/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad Lluvioso	LLUVIA. —

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Noviembre - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000101

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica Nº 52 Félix Pérez Cardozo - Guairá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 20/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Domingo. Sin actividad por lluvia.-	Se verifica que no hubo actividad.-

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA
apoderada

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Enero - 2021

Antonio Pelaez García
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000104

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica N° 52 Félix Pérez Cardozo - Guairá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 23/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por llovizna y mucha humedad	SIN ACTIVIDAD -

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

Antonio Pelaez Garcia
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000111

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Básica Nº 52 Félix Pérez Cardozo - Guairá
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 30/12/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad Lluvioso	Se verifica que no hay actividad por lluvia. —

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

Antonio Pelaez Garcia

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
LOTE 2 – DICIEMBRE 2020
CONTRATO N°10/2019-EDIS

CAAZAPÁ-Esc. Básica Nº 60 Comercio Fray luis de Bolaños-CAAZAPA,VISCAINO KUE

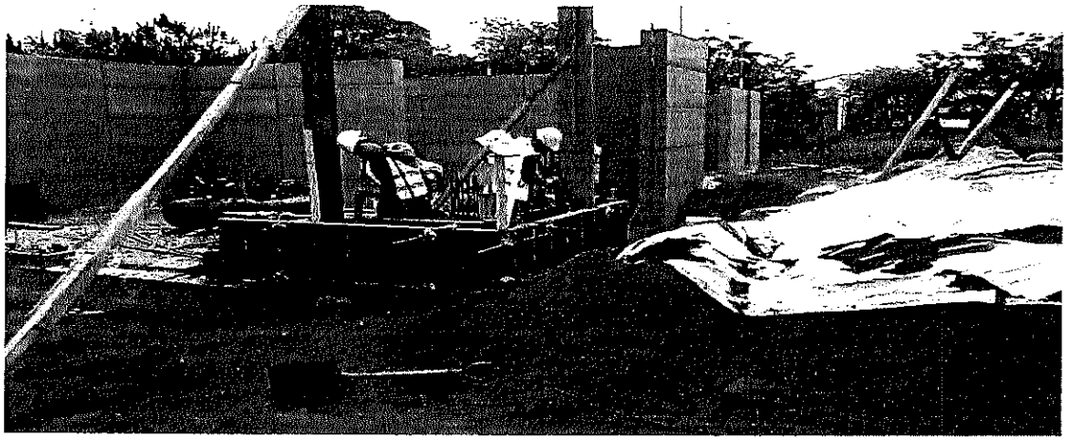

Mejora de suelo, terraplenado de suelo cemento compactado, promedio de relleno h:1,20 - exteriores y talud

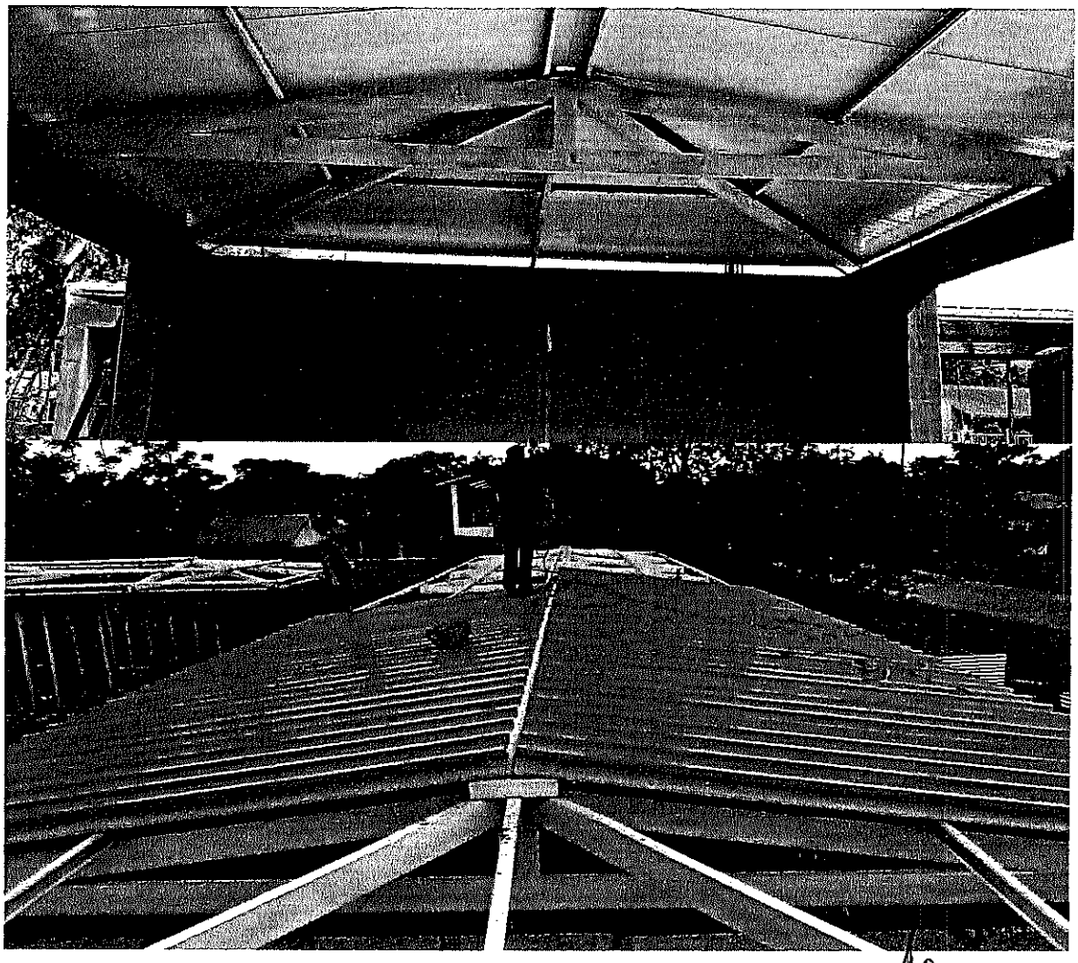

Ing. Luis M. Gulino G.
Representante Legal

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
LOTE 2 – DIEICEMBRE 2020
CONTRATO N°10/2019-EDIS

GUAIRÁ- Esc. Básica Nº 52 Félix Pérez Cardozo- FELIX PEREZ CARDOZO, CENTRO

Mejora de suelo, terraplenado de suelo cemento compactado, promedio de relleno h:1,20 - exteriores y talud

Ing. Luis M. Gulino G.
Representante Legal
