NOTA UNCA / MEC Nº 470/2021 / LOTE 17

Coronel Oviedo, 12 de Octubre de 2021.

Ing. Zoilo Benítez
Coordinador de Proyectos de Infraestructura
Presente:

Ref: **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - ID Nº 360.254"

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **ENGINEERING,** dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS de 8 días, según notas de pedido por parte de la contratista,** correspondiente al **Lote 17** presentada en fecha **06 de octubre de 2021**, por inclemencias climaticas del mes de septiembre del corriente.

Se adjunta Informe Técnico N°07/2021

Teniendo en cuenta:

- **5 días** de prorroga solicitados según **nota presentada en fecha 06/05/2021** correspondientes al mes de abril.
- **9 días** de prorroga solicitados según **nota presentada en fecha 04/06/2021** correspondientes al mes de mayo.
- **9 días** de prorroga solicitados según **nota presentada en fecha 06/07/2021** correspondientes al mes de junio.
- **6 días** de prorroga solicitados según **nota presentada en fecha 06/08/2021** correspondientes al mes de julio.
- **1 día** de prorroga solicitados según **nota presentada en fecha 06/09/2021** correspondientes al mes de agosto.
- **16 días** de prórroga solicitados según notas **presentadas en fechas 11 de agosto y 06 de septiembre del 2021** correspondiente al mes de agosto del corriente.
- **8 días** de prorroga solicitados según **nota presentada en fecha 06/10/2021** correspondientes al mes de septiembre

La fecha de fin de plazos se correría **54 días en total**, siendo la misma el **27 de octubre de 2021.**

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ
Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 8618
Recibido por: Daiana
DIA | MES | AÑO | HORA
15 | 10 | 21 | 11:05

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
Central	**XI**	**LOTE 17 – Central**	**Del 01-septembre-21 a 30-septiembre-21**	**Nº 06 (Septiembre-2021)**

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 06

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	Central	
Contratista:	**ENGINEERING S.A.E.C.A**	
Contrato N.º.	42/2020	
Objeto del Contrato:	LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"	
Fiscalizadores:	**UNCA (Convenio Específico c/Univers. Nac. Caaguazú)**	
Fecha de suscripción del Contrato:	11-Diciembre -2020	
Monto Total del Contrato en Gs.:	14.391.180.222 Gs.	**Plazo Contrato(Días):** 150 DIAS
Fecha de Entrega del anticipo:	29- diciembre -2020	**Monto del anticipo (20%):** Proyecto N° 272: **Gs. 2.878.236.044**
Fecha de inicio efectivo de las obras:	07-abril -2021 - Orden Servicio 2	**Fecha de vencimiento del plazo según Cronograma Fisco Financiero:** 03/09/2021

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario – Mes trabajado: 6 (01-septiembre -2021 al 30-septiembre -2021)	**30**
b.	Cantidad de días de lluvias registradas (desde el 01-09-2021 al 30-09-2021), Regist. DINAC y Libros de Obra	**8**
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	**0**
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	*
e.	Días de Ejecución Efectiva al mes del Certificado 5 (cuyo periodo tiene en total: 31 días)	**22**
f.	Condiciones de accesibilidad:	
g.	Otras Observaciones:	

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 14 instituciones del Lote N° 17 - Central.

b. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): **150** días
b. Plazo de Ejecución efectiva (días): **25 días (4° Fiscalización)**
   i. Certificado 1: **19 días.**
   ii. Certificado 2: **22 días.**
   iii. Certificado 3: **21 días.**
   iv. Certificado 4: **25 días.**

v. Certificado 5: **14 días.**

c. Plazo Restante (días): **-49 días (respecto al plazo de ejecución original)**

c. **AVANCE FISICO DE OBRAS: 60.05 %**
Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

d. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 60.45 % = Gs. 3.569.177.757**
Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

e. **MULTAS APLICADAS**

a. Monto del mes: **Gs. 0**

b. Multa Acumulada (%): **0 %**

Para el proyecto Gral. (Calculada):

- Multa Parcial (%): 0 % (con respecto al monto total del contrato)
- Multa Acumulada (%): 0% (con respecto al monto total del contrato)

f. **VIGENCIA DE GARANTIAS**

a. Garantía de cobertura de anticipo: VIGENTE.
   i. Cubre hasta 31/Enero/2022
   i. Empresa de Seguros: ***SANCOR SEGUROS.***

b. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE.
   i. Cubre hasta 31/Enero/2022.
   ii. Empresa de Seguros: ***SANCOR SEGUROS.***

c. Seguro contra accidentes de trabajo:
   i. Cubre hasta 30/Noviembre/2021.
   ii. Empresa de Seguros: ***SANCOR SEGUROS.***

d. Seguro contra los riesgos en zona de obras:
   i. Cubre hasta 30/Noviembre/2021.
   ii. Empresa de Seguros: ***SANCOR SEGUROS.***

Coordinador de Fiscalización

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Antonio Pelaez García
Ingeniero Civil

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

Informe Técnico N°7/2021

Arq. Efraín González – Fiscal de Obras del Lote 17 – Central
Arq. Roberto Escalada – Fiscal de Obras del Lote 17 – Central

Fecha: 12 de octubre del 2021

UNCA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: SEPTIEMBRE 2021**
LPN/SBE N° 02/2020 - "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI " ID N° 360.254 – Plurianual.	
CONTRATISTA:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
ID N°	360.254
CONTRATO N°	42/2020
MONTO CONTRATO GS:	Mínimo: Gs. 7.195.5.222.- Máximo: Gs. 14.391.180.222.-
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	11 de diciembre de 2020
LOTE N°	17
PLAZO	Trabajos preliminares y proyecto Ejecutivo: 30 días Plazo de Ejecución de las Obras: 150 días
PROYECTO:	"Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país"
FISCALIZACIÓN	UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú
TOTAL INSTITUCIONES:	14
DEPARTAMENTO:	CENTRAL
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	La póliza de ejecución del Contrato se encuentra vigente hasta el 31/01/2022.

6

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

ANTECEDENTES DOCUMENTALES			
ITEM	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**DESCRIPCIÓN**
1	06/10/2021	Nota ENGINEERING S.A.E.C.A. de fecha 06 de octubre de 2021	Solicitar prórroga de plazo para la ejecución de obras por lluvias, ocurridas en el Periodo N°6 mes de septiembre.
2	-	Informe de Fiscalización N° 06 – PRO 004	Certificado de Contabilización y Registro de Plazos del 01/09/21 al 30/09/21.
3	-	Registro de precipitación diaria (mm) 2021	Mes de SEPTIEMBRE – Registro de Precipitación Diaria DINAC - Dpto. Central.
4	03/09/2021 07/09/2021 08/09/2021 13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Libro de Obras	En los Libros de Obras, de fecha 3, 7, 8, 13, 14,15, 28 y 30 de septiembre de 2021, en los mismos se visualiza lo siguiente: **"Sin actividad en obra por lluvia".**

ANÁLISIS

La empresa ENGINEERING S.A.E.C.A., presentó en tiempo y forma la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas, según se establece en los AGCO, punto **2. Prórroga de los Plazos de Ejecución.** *Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas.*

Sigue mencionando en el punto **4. Inclemencias Climáticas**. *En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.*

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Antes de los quince (15) días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la contratante antes de los quince (15) días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: *"Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"*

MES DE SEPTIEMBRE 2021

Día	Registro Dinac	1 Escuela Basica N° 91 Medalla Milagrosa	2 Escuela Basica N° 706 Don Antonio J. Delvalle.	3 Escuela Básica N° 1988 María Auxiliadora.	4 Escuela Básica N° 427 Avay	5 Escuela Básica N° 804 Republica de El Salvador	6 Escuela Básica N° 246 Maestra María Concepción Leyes de Chaves	7 Escuela Básica N° 241 Estanislao Sanabria	8 Escuela Básica N° 703 Profesora María Luisa Gómez de Franco	9 Escuela Básica N° 808 Doctor Bernardo Ocampos	10 Escuela Básica N°3404 Niños Mártires de Acosta Ñu	11 Escuela Básica N° 2125 Don Eliodoro Estigarribia	12 Escuela Básica N° 4724 Fray Luis de Bolaños	13 Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús	14 Escuela Básica N° 25 Carlos A. López	TOTAL DE DÍAS APROBADOS
1																
2																
3	3,0	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	1
4																
5																
6																
7	0,5			LLUVIA				LLUVIA	LLUVIA							1
8	11,2	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	1
9		LLUVIA					LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA				LLUVIA	LLUVIA		
10																
11																
12																
13	21,4			LLUVIA		LLUVIA		LLUVIA	LLUVIA							1
14	3,2		LLUVIA	LLUVIA		LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA			LLUVIA	LLUVIA			1
15	T		LLUVIA	LLUVIA		LLUVIA		LLUVIA	LLUVIA			LLUVIA	LLUVIA			1
16					LLUVIA									LLUVIA		
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28	0,8		LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA		LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA	LLUVIA		LLUVIA				
29																
30	10,5		LLUVIA						LLUVIA							1
Total días	8	3	6	7	4	5	5	7	8	3	2	5	4	4	2	8

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

En este sentido, se procede a verificar lo solicitado por la empresa ENGINEERING S.A.E.C.A.:

Es importante considerar, que esta fiscalización tiene en cuenta el registro de precipitación diaria de la DINAC (LUQUE), teniendo en cuenta el radio de influencia de las mismas y considerando que las instituciones se encuentran en los distritos y localidades correspondientes.

Considerando las precipitaciones que se generaron en fecha 3, 7, 8, 13, 14, 15, 28 y 30 de septiembre en los sitios de obras, se aprueban 8 (ocho) días de lluvias.

Se adjunta las siguientes imágenes:

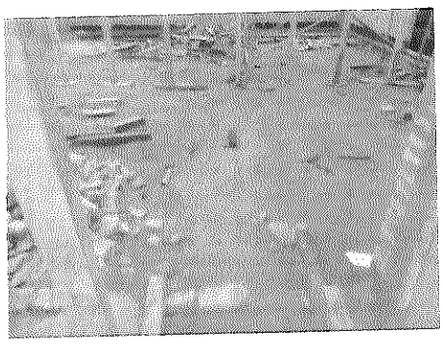

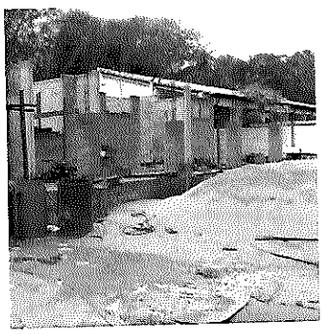

De acuerdo a los puntos expuesto y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, a la luz de lo establecido en el PBC y los AGCO, esta fiscalización considera pertinente la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución por 8 (ocho) días por inclemencias climáticas y sus consecuencias correspondientes al mes de septiembre, según el Registro de precipitación diaria emitida por la DINAC.

Por lo expuesto, se concluye que, en este caso, se aplica a todas las Instituciones Educativas, la prórroga por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de septiembre, teniendo en cuenta que las mismas forman parte del Lote N°17 – Central, del Contrato N°42/2020, y según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

9

Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórrogas aprobados por la fiscalización:

PERIODO	REGISTRO DINAC	AFECTACIONES	CANTIDAD DE PRORROGA APROBADAS
Septiembre/21	8	0	8
Total de días por inclemencia climática y afectaciones			**8 (ocho) días**

Se adjunta:

- Copia de la Nota de ENGINEERING S.A.E.C.A.
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2021 septiembre.
- Copia del Libros de Obras del Lote 17.
- Corrimiento de plazos del Lote 17.
- Copia del PRO 004 del mes de septiembre 2021.

Es mi informe.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

10

CORRIMIENTO DE PLAZO - EMPRESA: ENGINEERING S.A.E.C.A. - LICITACIÓN ID: 360.254 - LOTE N° 17 - LPN/SBE N° 02/2020

Lotes de obras adjudicadas	Empresa adjudicada	Orden de Inicio	Solicitud N° 01	Solicitud N° 02	Solicitud N° 03	Solicitud N° 04	Solicitud N° 05	Solicitud N° 06	Solicitud N° 07
Lote 17 (CENTRAL)	**ENGINEERING S.A.E.C.A. 30 INSTITUCIONES 14 ENTREGADAS**	07/04/2021	Inclemencias Climáticas Abril 2021	Inclemencias Climáticas Mayo 2021	Inclemencias Climáticas Junio 2021	Inclemencias Climáticas Julio 2021	Inclemencias Climáticas Agosto 2021	Prorroga por escasez e materiales Agosto 2021	Inclemencias Climáticas Septiembre 2021
Corrimiento de plazo de ejecución de la obra.		150 Días	5 Días	9 Días	9 Días	6 Días	1 Días	16 Días	8 Días
		03/09/2021	08/09/2021	17/09/2021	26/09/2021	02/10/2021	03/10/2021	19/10/2021	27/10/2021

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P.I. Nº 022/2021

A: **Abog. Sixto Milciades Rivas.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones - UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: Remisión de Informe Técnico: Aprobación de la solicitud de Prórroga de Plazos por Inclemencias Climáticas del Lote N° 17 – Engineering SAECA.

Fecha: 15/10/2021

Por la presente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias; se dirige a UD a fin de poner a su conocimiento y consideración, el Memorándum Interno N° 022/2021, elaborado por el Arq. Guillermo Godoy (Jefe de Supervisión y Certificación) y el Ing. Antonio Peláez (Supervisor de Obras).

El mismo se adjunta a la presente con el fin de remitir la Aprobación de la Solicitud de Prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas del Lote N°17, a cargo de la Empresa ENGINEERING SAECA. Solicito sus buenos oficios para dar continuidad al proceso correspondiente.

Se anexa 1 (una) carpeta archivadora.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 9121
Recibido por: [illegible]

DIA	MES	AÑO	HORA
22	10	21	1345

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMO INTERNO Nº 022/2021

A: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

De: **Arq. Guillermo Godoy.** Jefe de Supervisión
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Ing. Antonio Peláez. Supervisor de Obras
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Ref.: Informe Técnico – Lluvias SETIEMBRE 2021
Remisión de APROBACIÓN de Solicitud de Prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas. Empresa ENGINEERING SAECA – Lote N° 17

Fecha: 15/10/2021

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de remitir el Informe Técnico en referencia a la Contratación N° 42/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FEEI" - PLURIANUAL – ID 360.254.

Al respecto, esta Supervisión ratifica la **"Aprobación de fiscalización a cargo de UNCA"**, la prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas del **LOTE N° 17 – CENTRAL**, a cargo de la **Empresa ENGINEERING SAECA.**

Se detalla a continuación: **CUADRO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA Y CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS EN BASE A LO APROBADO POR LA FISCALIZACION A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU (UNCA),** cuyo fiscalizador remite aprobada.

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura – 3er. Piso)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

1- CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS.

LOTE DE OBRA ADJUDICADA	LOTE N° 17 - CENTRAL	CORRIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
EMPRESA ADJUDICADA	ENGINEERING SAECA	
PLAZO A PARTIR DE LA OS N° 2	150 DIAS	03 DE SETIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 01	5 DIAS	08 DE SETIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 02	9 DIAS	17 DE SETIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 03	9 DIAS	26 DE SETIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 04	6 DIAS	02 DE OCTUBRE DE 2021
PRORROGA N° 05	1 DIA	03 DE OCTUBRE DE 2021
PRORROGA N° 06	16 DIAS	19 DE OCTUBRE DE 2021
PRORROGA N° 07	8 DIAS	27 DE OCTUBRE DE 2021

Se adjuntan copias de:

a- Notas de la Empresa
b- REGISROS DE PRECIPITACION DIARIA (mm) AÑO 2021, de la Dirección de Meteorología e Hidrología (Silvio Pettirossi Luque) del mes de SETIEMBRE.
c- Registros de lluvias en los Libros de Obras del mes de SETIEMBRE.

Antonio Pelaez Garcete
Ingeniero Civil

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura – 3er. Piso)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py
