Universidad Nacional de Caaguazú
Sede Coronel Oviedo
Creada por Ley Nº 3198 del 4 de Mayo de 2007
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
Tel: +595 521 201548

MISIÓN de la FCyT: Formar profesionales excelentes con conocimientos científicos y tecnológicos, competentes, con sentido crítico, ético y responsabilidad social.
VISIÓN de la FCyT: Ser una facultad líder, con excelencia en la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo del país.

NOTA FCYT N° 99/2019 / LOTE 3 / SAN PEDRO

Coronel Oviedo, 27 de noviembre de 2019

Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Presente:

> ***Ref:*** **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú** para la realización de la fiscalización de las obras de "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos Financiados por el FEEI 2016-2017 – Segundo Llamado", Lotes No 2 y 03 del departamento de San Pedro y Lote 12 del Departamento de Canindeyú, de la LPN No 02/2016 ID No 305.078.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la solicitud realizada por la empresa contratista CARAGUATAY S.A, dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS DE 8 (ocho) DÍAS** debido a lluvias y sus consecuencias del **mes de octubre** del corriente año.-

El pedido fue **verificado y aprobado** por la fiscalización, teniendo en cuenta el registro de precipitación diaria correspondiente al **mes de octubre** emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología, y las constancias dejadas en los Libros de Obras de los días en los cuales se suspendió el trabajo.-

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.-

Ing. Fredy Gabriel Ramírez
Coordinador General de Fiscalización
Facultad de Ciencias y Tecnologías

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 10608
Recibido por: Blanca

DIA	MES	AÑO	HORA
27	11	19	15:50

CARAGUATAY S.A.
SERVICIO INTEGRAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

Asunción, 7 de noviembre de 2019

CARA 203/19

Señor
Ing. Fredy Gabriel Ramírez, Coordinador General de Fiscalización
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOCLOGÍAS
Presente

Ref.: CONTRATO Nº03/17 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI" LOTE Nº 3

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a Ustedes, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar la solicitud de prórrogas por lluvias, correspondiente al mes de octubre. Adjuntamos las documentaciones correspondientes.

Sin otro particular, nos despedimos saludando atentamente.

ING. RUBÉN CARDOZO
REPRESETANTE LEGAL
CARAGUATAY S.A.

CARAGUATAY S.A.
Ing. Rubén Cardozo Ruiz Díaz
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI Segundo Llamado" – ID Nº 305078
EMPRESA CONTRATISTA: CARAGUATAY S.A.

ESTADÍSTICAS DE LLUVIAS **AÑO: 2.019**

DÍAS / MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Precipitaciones Registro mm	Precipitaciones Registro DIAS	Dias Calendario Año 2,017 / 2.018	Dias de Trabajo	Dias Perdidos
JULIO	2,0	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7,4	B	B	B	12,2	8,9	B	B	B	B	B	5,1	B	B	B	B	B	B	36	5	31	26	5
AGOSTO	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B	B	B	B	B	B	H	B	7,4	B	B	B	H	B	7	5	31	26	5
SEPTIEMBRE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2,4	B	B	B	B	B	B	B	1,2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4		30	28	2
OCTUBRE	B	B	B	4,0	29,4	H	B	B	B	B	B	B	B	4.4	3,3	B	B	2,4	B	12,4	1,1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	53	7	31	23	8
																																0			0	
																																0			0	
																																0			0	
																																0			0	
																																0			0	
																																			0	
																																			0	
																															TOTAL	64	17	123	103	20

REFERENCIAS:
B= TIEMPO BUENO
Nro = PRECIPITACIONES REGISTRADAS (en mm)
H = AFECTACIÓN O INCIDENCIA DEL DIA DE LLUVIA

POR CARAGUATAY S.A.
CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

POR LA FISCALIZACION

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2019

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN ESTANISLAO	24° 40' 01,00"	56° 26' 53,29"	161 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0		
2										0,0		
3										0,0		
4										4,0		
5										29,4		
6										0,0		
7										0,0		
8										0,0		
9										0,0		
10										0,0		
11										0,0		
12										0,0		
13										0,0		
14										4,4		
15										3,3		
16										0,0		
17										0,0		
18										2,4		
19										0,0		
20										12,4		
21										1,1		
22										0,0		
23										0,0		
24										0,0		
25										0,0		
26										0,0		
27										0,0		
28										0,0		
29										0,0		
30										0,0		
31										0,0		
Total										57,0		
Máx. 24h										29,4		
Día Máx.										5		

Julián Olmedo
Jefe Sección Servicio Met. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, T = Precipitación no medible - = Sin datos de precipitación

Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay
Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 1192-1197 - E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI Segundo Llamado" – ID Nº 305078

EMPRESA CONTRATISTA: CARAGUATAY S.A.

Fecha de término vigente 31 10 19	10/31/19
Total de días de lluvias julio	5
Total de días de lluvias agosto	5
Total de días de lluvias septiembre	2
Total de días de lluvias octubre	8
Total de días de prórrogas por razones ajenas a la responsabilidad al Contratista	20
Fecha de término solicitado	11/20/19

Fredy G. Ramirez V.
Dir. Académico
FCyT - UNCA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado" – ID Nº 305078

LOTE Nº: 03 - CONTRATO Nº 03/2017

EMPRESA CONTRATISTA: CARAGUATAY S.A. - EMPRESA FISCALIZADORA: CIALPA S.A.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO – CAMINOS INTRANSITABLES – ZONAS DE OBRAS Y ACCESOS – DÍAS DE LLUVIAS – **PERIODO OCTUBRE 2019**

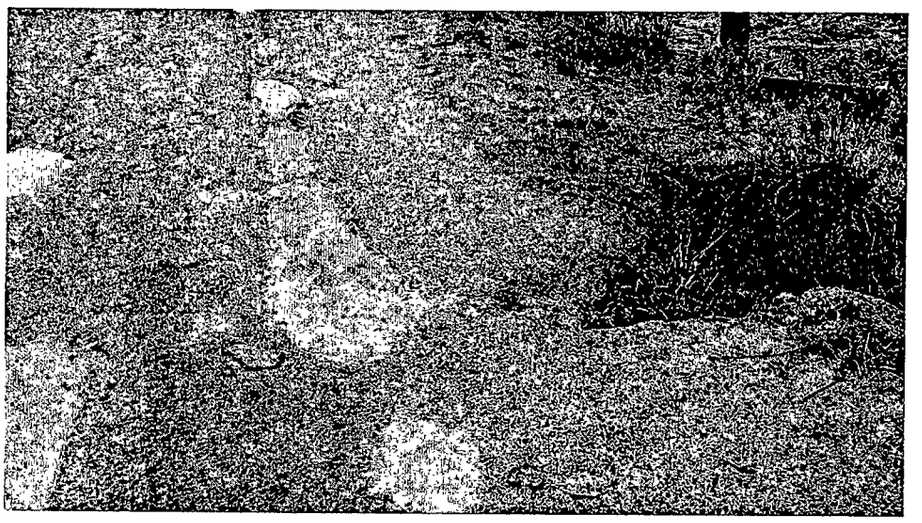



Arq. Patricia J. E. Sánchez E. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Arq. Aurora Vera C.
Reg. Nº 2394

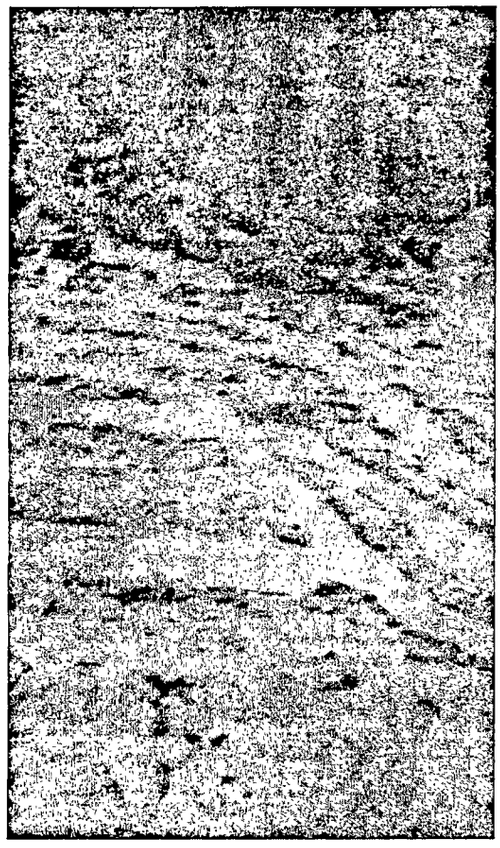

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de
Infraestructura
UEPP - MEC

Arq. Aurora Vera C.
Reg. Nº 2394

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000171

Institución Educativa: ***Colegio Nacional San Carlos - Distrito de Unión***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: 03

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DEL 01 AL 07 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SE REALIZAN TRABAJOS EN BLOQUE DE 3 AULAS SEGÚN PLANILLA	
SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICAS EXTERNA Y DE CAÑERÍAS DE AGUA CONDICIÓN	
LOS LOTES 4, 5, 6 SIN ACTIVIDAD POR LLUVIAS	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000173

Institución Educativa: ***Colegio Nacional San Carlos - Distrito de Unión***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DEL 14 AL 21/10 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
CONTINUAN LOS TRABAJOS EN	
BLOQUE DE 3 AULAS SEGÚN	
PLANOS, PINTURA Y TERMINA	
CIONES DEFECTUOSAS.	
EN SSHH COLOCACIÓN ABERTU-	
RAS, APAGADOS Y CONCLUYEN	
TRABAJOS DE REDES DE INSTALA-	
CIÓN.	
LOS DÍAS 14, 15, 18 y 21	
DIAS DE LLUVIA SIN ACTIVIDAD	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

SUPERVISIÓN MEC

ImpreGraf S.R.L. Teléfono (021) 511 906 / 527 296

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000207

Institución Educativa: ***Colegio Nacional General Díaz - Distrito de Yataity del Norte***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DEL 01 AL 06/10 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD LLUVIAS LOS DIAS 04, 05 y 06.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Triplicado

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 / 527 296

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000209

Institución Educativa: ***Colegio Nacional General Díaz - Distrito de Yataity del Norte***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DEL 14 AL 21/10 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
CONTINUAN LOS TRABAJOS	
DE PINTURAS PERO LOS DÍAS	
14, 15, 18, 20 y 21 HUBIERON	
DÍAS QUE IMPOSIBILITARON RE-	
ALIZAR ACTIVIDADES	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Ing. Luis Becerra
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº0000116

Institución Educativa: ***Escuela Nacional de Comercio Cuarepoti - Distrito Villa del Rosario***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: 09 AL 20/10 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
VISITA CONJUNTA ENTRE	
FISCALIZACIÓN Y	
CONTRATISTA SE SOLICITÓ A LA	
CONTRATISTA COMPLETAR TERMINAR	
PENDIENTES	
TAREAS 14, 15, 18, 20	
SE PUSO DE OBSERVA-	
CIONES A LA RECEP	
CIÓN.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000117

Institución Educativa: ***Escuela Nacional de Comercio Cuarepoti - Distrito Villa del Rosario***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DEL 21 AL 26/10 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SE REDUCEN LOS TRABAJOS	
DE REPARACIONES Y OBSERVA-	
CIONES DE LA FISCALIZACIÓN	
EN EL PISO DE OBRACIONES	
TECHOS Y SE SOLICITA LA	
RECEPCIÓN PROVISORIA.	
LOS DIAS 21 LLUVIAS	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Ing. Luis Becerra
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000184

Institución Educativa: ***Colegio Nacional Niño Salvador y Escuela Básica Nº 1682 Guavirá Poty***

Distrito de Yataity del Norte - Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: 05 al 10 / 09 / 18 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Se realizan trabajos de	
terminación en todos	
los bloques	
11 al 21 / 09 lluvias	
Se producen lluvias en	
zona de obra.	
No hay avances.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Aurora Vera C.
Reg. Nº 2394
CARAGUATAY S.A.

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000166

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 6621 Virgen de Caacupe - Distrito de San Estanislao***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DEL 08 AL 18/10 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
EL 08/10 RECORRIDO CONJUNTO	
CON LA FISCALIZACIÓN Y LA	
SUPERVISIÓN DEL MEC EN COM	
PAÑÍA DEL REPRESENTANTE	
DE LA EMPRESA	
SE LE SOLICITÓ A LA CONTRA-	
TISTA QUE VERIFIQUE LOS TA-	
MAÑOS CORRIENTES EN LA AULAS, QUE	
SE VERIFIQUEN LOS SOLDADURAS DE	
LA PUERTA EN EL COMEDOR Y SE	
VERIFIQUEN LOS BALANCINES	
EN AMBOS BLOQUES. EN EL	
AÑO SE SOLICITÓ COMPLETAR	
EL TOTAL DE PINTURAS Y GRIFE	
RÍAS EN BEBEDERO.	
LOS DÍAS 14, 15 y 18 LLUVIAS.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000060

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 7320 Arasa Poty - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DEL 01 AL 13/10/19 Estado del Tiempo:.....

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
NO POSIBILIDAD LLUVIAS LOS	
4 Y 5. DÍA 6 HUMEDAD	
IMPOSIBILIDAD INGRESO DE	
CAMIONES Y MOTOBOMBAS	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHAVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000176

Institución Educativa: ***Colegio Nacional San José del Rosario - Distrito de Villa del Rosario***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DEL 01 AL 08/10 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SE REALIZAN TRABAJOS DE	
TERMINACIÓN DE PINTURA EN	
PROTECCIÓN 6 (SEIS) AULAS. LOS	
TECHOS METÁLICOS PROVISTOS	
EN REMPLAZO DE LOS TECHOS DE	
TEJAS EXTREMADAMENTE DAÑA-	
DAS, YA ESTÁN CONCLUIDAS PREVIA	
AUTORIZACIÓN DE LA FISCALIZA-	
CIÓN, Y LOS CUALES FORMAN PAR	
TE DE LA OBRA EN PROCESO	
DE APROBACIÓN.	
LOS DÍAS 4 y 5 y 6 LLUVIAS IN-	
TENSOS IMPIDEN REALIZAR	
TRABAJOS.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

S.R.L. Telefax: (021) 511 908 / 527 296

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº0000178

Institución Educativa: ***Colegio Nacional San José del Rosario - Distrito de Villa del Rosario***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DEL 10 AL 22/10 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
CONTINUAN LOS TRABAJOS DE	
EJECUCIÓN EN BLOQUE DE	
UN AULA SEGÚN PLANILLA	
DE PRECIOS EN PROCESO DE	
APROBACIÓN.	
LOS DIAS 14, 15, 18, 20 y 21	
CON LLUVIAS SIN ACTIVIDAD	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000198

Institución Educativa: ***Colegio Yataity del Norte - Distrito de Yataity del Norte***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DEL 01 AL 27/10 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD LLUVIAS	
LOS DIAS 4, 5, 6, 14, 15, 18	
20 y 21.	
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	
MANIFIESTAN QUE LOS TRABAJOS	
DE REPARACIONES DE AULAS	
QUE ESTABAN PENDIENTES YA	
FUERON CONCLUIDOS POR CUENTA	
DE ELLOS Y SOLICITAN	
LA REALIZACIÓN DE UN BLOQUE	
SANITARIO.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
EMPRESA FISCALIZADORA
Ing. Civil
Fiscal

SUPERVISIÓN MEC

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 908 / 527 296

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000193

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 417 Juana María de Lara - Distrito de Yataity del Norte***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DEL 01 AL 08/10 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SE REALIZARON TAREAS DE	
TERMINACIONES DE PINTURA	
Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉC	
TRICOS EN BLOQUES DE 4 AULAS	
DE MODO A LIBERARLO DEL PLUMBRO	
Y SE PUEDA TRABAJAR EN EL	
SIGUIENTE REHABILITACIÓN DE 4 AULAS	
LUEGO DE LAS MUDANZAS RESPEC-	
TIVAS	
SE RECIBIO VISITA DE	
LA SUPERVISORA DEL MEC	
Y SE REALIZO RECORRIDO	
CONJUNTO CON LA FISCALIZA-	
CIÓN Y CONTRATISTAS.	
LOS DÍAS 4 Y 5 SE SIN ACTI-	
VIDAD POR LLUVIAS	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 908 / 527 296

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000195

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 417 Juana María de Lara - Distrito de Yataity del Norte***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DIC 14 DL 21/10 Estado del Tiempo: NUBLADO / LLUVIAS

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
CONTINUAN LOS TRABAJOS	
DE REPARACIONES EN PABELLON	
Y AULAS, ELECTRICIDAD, Y	
TRABAJOS VARIOS DE ALBAÑI-	
LERIA REVOQUES CONTRAPISOS	
PISOS REPARACIONES.	
LOS DIAS 14, 15 18 20	
Y 21 SIN ACTIVIDAD POR LLUVIAS.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000085

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 4694 San Luis - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del Cual 13/10/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
SE INICIAN LOS TRABAJOS	
SEGÚN PLANILLA DE AVANCE DE	
MODO A GANAR AVANCES PUDIENDO	
LA APROBACIÓN DE LA MISMA	
LA FISCALIZACIÓN AUTORIZÓ A LA	
REMUNERACIÓN DEL SANEADO Y	
REPARACIÓN DE LAS VIGAS CON	
PIEZAS DEL BLOQUE DAÑADOS	
EL CAMBIO DE TECHO DE TEJAS	
DAÑADOS POR TECHO CHAPAS EN	
BLOQUE EN ESTADO 2 DAÑADOS Y	
LA REPARACIÓN DE UN AÑO EN	
SU TECHADO CON ADMINISTRACIÓN DE	
MEMBRANAS Y CAMBIO DE VIDRIOS	
DE MADERAS DAÑADAS	
~~[illegible]~~ llovió los días	
4 y 5. limitado el día 6 por	
lo que no hubieron actividades	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000086

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 4694 San Luis - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 14 al 22/10/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
SE REALIZAN TRABAJOS EN	
BLOQUES DE 3 DIAS.	
Los dias 14, 15, 18, 20 y 21	
con mucha lluvia, sin	
actividad	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000042

Institución Educativa: ***IFD Gral. Aquino - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: DEL 01 AL 08/10 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SE REALIZAN TRABAJOS DE	
REPARACIONES SEGÚN PLA-	
NILLAS PINTADAS Y COLOCA-	
CIÓN DE CONDUCTORES EN BLO-	
QUE DE 4 BULBS	
LOS DIAS 04, 05 y 06 DIDS	
DE LLUVIAS SIN ACTIVIDAD	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA
CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000092

Institución Educativa: ***Colegio Nacional San Luis - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 13/10/16 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SE INICIAN LOS TRABAJOS SE-	
GÚN PLANILLAS DE MEDIDAS	
DE MODO A GANAR AVANCES	
MIENTRAS SE APRUEBE LO MISMO.	
LA FISCALIZACIÓN AUTORIZO	
LA DEMOLICIÓN DE LAS VIGAS	
Y APOYOS DE HORMIGÓN EN LA	
BIBLIOTECA Y AULAS DEBIDO	
A QUE PRESENTAN MÚLTIPLES	
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS.	
Sin actividad los días 4 y 5.	
Día 6 Humedad.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000093

Institución Educativa: ***Colegio Nacional San Luis - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 14 al 22/10/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SE REINITIAN TRABAJOS EN EL BLOQUE BIBLIOTECA.	
los días 14, 15, 18, 20 y 21 con mucha lluvia Sin actividad	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

flow Vos tenés el control. Personal

NACIONALES

Activan alerta por tormentas para el norte del país

La Dirección de Meteorología advierte de que se podrían registrar más precipitaciones con tormentas eléctricas en las próximas horas de este lunes en el norte del país.

19 DE OCTUBRE DE 2017 - 10:14

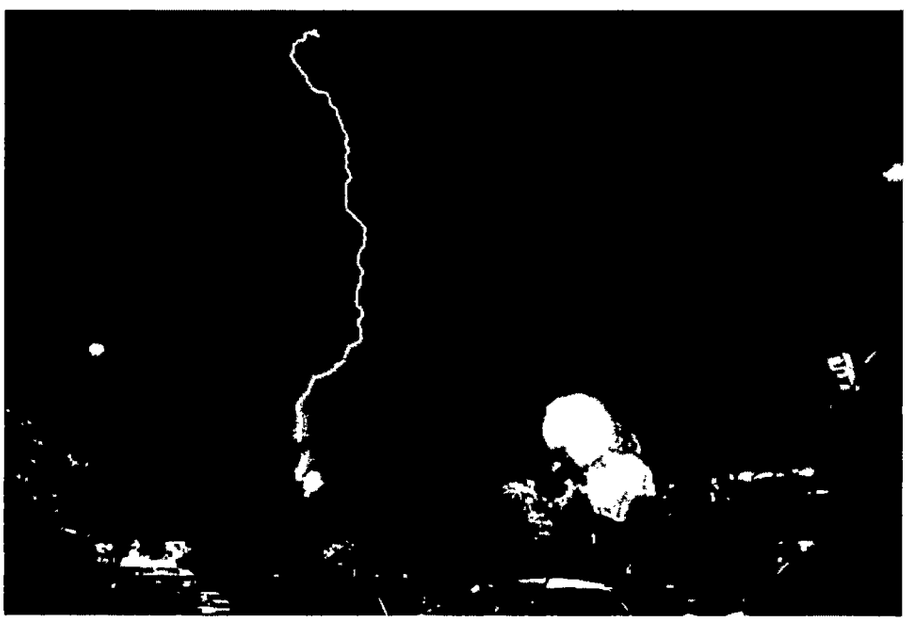

El boletín también pronostica tormentas eléctricas

Ana Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
DEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

flow Pausá. Grabá. Volvé al inicio. Personal

NACIONALES

Domingo con posibles lluvias

El tiempo continuaría inestable hoy en Paraguay, con posibilidades de nuevas precipitaciones y tormentas eléctricas en gran parte del país

POR ABC COLOR
1 DE OCTUBRE DE 2019

Lo más

01
NACIONALES
"Paraguay nada" en acuerdo p contratacı potencia d

02
NACIONALES
Allanan Municipal Asunción

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Universidad Nacional de Caaguazú
Sede Coronel Oviedo
Creada por Ley Nº 3198 del 4 de Mayo de 2007
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
http://www.fctunca.edu.py/ Tel: +595 521 201548 info@fctunca.edu.py

MISIÓN de la FCyT: Formar profesionales excelentes con conocimientos científicos y tecnológicos, competentes, con sentido crítico, ético y responsabilidad social.
VISIÓN de la FCyT: Ser una facultad líder, con excelencia en la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo del país.

NOTA FCYT N⁰ 96/2019 / LOTE 3 / SAN PEDRO

Coronel Oviedo, 19 de diciembre de 2019

Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Presente:

> ***Ref:*** **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú** para la realización de la fiscalización de las obras de "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos Financiados por el FEEI 2016-2017 – Segundo Llamado", Lotes No 2 y 03 del departamento de San Pedro y Lote 12 del Departamento de Canindeyú, de la LPN No 02/2016 ID No 305.078.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la solicitud realizada por la empresa contratista CARAGUATAY S.A, dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS DE 2 DÍAS** debido a lluvias y sus consecuencias del **mes de septiembre** del corriente-.

El pedido fue **verificado y aprobado** por la fiscalización, teniendo en cuenta el registro de precipitación diaria correspondiente al mes de septiembre emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología, y las constancias dejadas en los Libros de Obras de los días en los cuales se suspendió el trabajo-.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente-.

Ing. Fredy Gabriel Ramírez
Coordinador General de Fiscalización
Facultad de Ciencias y Tecnologías

Fredy G. Ramírez V.
Dir. Académico
FCyT - UNCA

CARAGUATAY S.A.

SERVICIO INTEGRAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

Asunción, 7 de octubre de 2019

CARA 172/19

Señor
Ing. Fredy Gabriel Ramírez, Coordinador General de Fiscalización
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
Presente

Ref.: CONTRATO Nº03/17 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI" LOTE Nº 3

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a Ustedes, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar la solicitud de prórrogas por lluvias, correspondiente al mes de septiembre. Adjuntamos las documentaciones correspondientes.

Sin otro particular, nos despedimos saludando atentamente.

ING. RUBÉN CARDOZO
REPRESETANTE LEGAL
CARAGUATAY S.A.

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Recibí: 07/10/19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI Segundo Llamado" – ID Nº 305078

EMPRESA CONTRATISTA: CARAGUATAY S.A.

Fecha de término vigente 31 10 19	10/31/19
Total de días de lluvias julio	5
Total de días de lluvias agosto	5
Total de días de lluvias septiembre	2
Total de días de prórrogas por razones ajenas a la responsabilidad al Contratista	12
Fecha de término solicitado	11/12/19

Fredy G. Ramírez V.
Dir. Académico
FCyT - UNCA

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

■ GOBIERNO Paraguay
■ NACIONAL de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2019

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN ESTANISLAO	24° 40' 01,00"	56° 26' 53,29"	161 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0			
2									0,0			
3									0,0			
4									0,0			
5									0,0			
6									0,0			
7									0,0			
8									0,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									2,4			
12									0,0			
13									0,0			
14									0,0			
15									0,0			
16									0,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									1,2			
20									0,0			
21									0,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									0,0			
28									0,0			
29									-			
30									0,0			
31												
Total									3,6			
Máx. 24h									2,4			
Día Máx.									11			

Dirección de Meteorología y Servicios Meteorológicos - DMH - DINAC

Julián Olmedo
Jefe Sección Servicio Met. para el Pú...
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, T = Precipitación no medible - = Sin datos de precipitación

Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 1192-1197 - E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay

Fredy G. Ramírez V.
Dir. Académico
FCvT - UNCA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado" – ID Nº 305078

LOTE Nº: 03 - CONTRATO Nº 03/2017

EMPRESA CONTRATISTA: CARAGUATAY S.A. - FISCALIZADORA: UNCA.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO – CAMINOS INTRANSITABLES – ZONAS DE OBRAS Y ACCESOS – DÍAS DE LLUVIAS – **PERIODO SEPTIEMBRE 2019**



Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000273

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 99 General Elizardo Aquino***

Distrito General Elizardo Aquino - Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/01/19 Estado del Tiempo:.....

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Se realizaron trabajos solicitados en la orden de encomienda nuevas. El 11, 18 y 25 fueron días de lluvia	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

CARAGUATAY S.A.
Ingeniero Civil
Residente de Obra

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº0000166

Institución Educativa: ***Colegio Nacional Villa del Rosario - Distrito de Villa del Rosario***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Se realizaron los trabajos solicitados en los ciclos de exámenes previos. El 18, 19 y 20 fueron días de lluvia	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº0000188

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 977 Sto. 1ro. Eduardo Sánchez Berdun***

Distrito de Villa del Rosario - Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: [illegible] Estado del Tiempo: .....

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Se inicia con los trabajos	
señalados en las actas	
de operaciones previas el 11,	
19 y 27 [illegible] días de	
llovia	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000170

Institución Educativa: ***Colegio Nacional San Carlos - Distrito de Unión***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 16 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Se realizaron la totalidad de	
los trabajos en baños de	
colocación de ranaleta, artefactos	
y instalación eléctrica, en	
de ampliación. Se retiró	
los canaletas en mal estado. No	
hubo actividades por llovizna	
los días 19 y 29	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000206

Institución Educativa: ***Colegio Nacional General Díaz - Distrito de Yataity del Norte***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
No hubieron actividades p. llena los días 11, 17, 29	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000080

Institución Educativa: **Escuela Básica Nº 1623 Santo Tomás - Distrito General Elizardo Aquino**

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Realizaron los trabajos soli	
tados en las actas de obra	
nuevas pruebas - El 11, 19 y 29	
fueron días de lluvia	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000084

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 7140 Punta Porá - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha:..... Estado del Tiempo:.....

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Se trabajó normalmente	
marteados	
El 11, 19 y 29 fueron días	
de lluvia	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Tripicado

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 908 / 527 296

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº0000183

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 1620 Prof. Tomasa Vázquez - Distrito de Villa del Rosario***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Se adjuntan los trabajos realizados en las actas de operaciones mes: El 11, 19 y 20 fueron días lluvia	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.R.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Triplicado

ImpreOraf S.R.L. - Teléfax: (021) 511 906 / 527 296

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000113

Institución Educativa: ***Escuela Nacional de Comercio Cuarepoti - Distrito Villa del Rosario***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: 01/01 al 15/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Los trabajos de los techos	
de Techos de la instalación	
eléctrica se han venido	
a la actualidad. El día 11	
del mes hubo lluvia por	
lo que no hubo actividades	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

SUPERVISIÓN MEC

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 / 527 206

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000114

Institución Educativa: ***Escuela Nacional de Comercio Cuarepoti - Distrito Villa del Rosario***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 16 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Terminado el 90% de la	
pintura de 7 aulas con	
también se instalaron el	
los artefactos eléctricos	
los días 19 y 29 fueron	
días de lluvia por lo	
que no hubo mas actividad	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

Luis Becerra
Ing. Civil
CIALPA

SUPERVISIÓN MEC

Tecno Graf S.R.L. - Teléfax: (021) 511 906 / 521 296

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000190

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 1874 Coronel Vicente Mongelós***

Distrito de San Estanislao - Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha:..... Estado del Tiempo:.....

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

..... EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

..... EMPRESA FISCALIZADORA

..... SUPERVISIÓN MEC

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 / 527 296

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000163

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 6621 Virgen de Caacupe - Distrito de San Estanislao***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del ... Estado del Tiempo: .....

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Terminamos	
compactación	
en la totalidad	
Mañana colocamos	
del mes	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra.
Ing. Civil
Fiscal

..... EMPRESA CONTRATISTA

..... EMPRESA FISCALIZADORA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

..... SUPERVISIÓN MEC

IngreGraf S.R.L. - Teléfono: (021) 511 906 / 527 296

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000164

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 6621 Virgen de Caacupe - Distrito de San Estanislao***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 16 al 30/6/2017 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Se colocaron [illegible]	
los ladrillos. No [illegible]	
dio por lluvia los [illegible]	
21 del mes	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Triplicado

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 / 527 296

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000260

Institución Educativa: **Escuela Básica Nº 4428 San Rafael - Distrito General Elizardo Aquino**

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo:.....

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Finalizamos los trabajos solicitados en las actas de paralizaciones previas. El 17, 19 y 20/09 días de lluvia	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Triplicado

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 / 527 296

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000255

Institución Educativa: ***Colegio Nacional 1º de Marzo - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Se realizó [illegible] solicitados en los meses de operaciones [illegible] 7a [illegible] de Marzo	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Triplicado

ImpreGraf S.R.L. - Teléfono: (021) 511 906 / 527 296

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000215

Institución Educativa: ***Colegio Nacional General Elizardo Aquino - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 a 30/09/17 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Se realizaron los trabajos solicitados en los días de operación previas: el 11, 12 y 21 fueron días de lluvia	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

ImpreGraf S.R.L. - Tel/Fax: (021) 511.906 / 527 296

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000296

Institución Educativa: ***Colegio Nacional Adolfo Rojas Silva - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Se continúa con los trabajos	
iniciados en las aulas de	
[illegible]	
El plazo [illegible] días de	
[illegible]	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000263

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 3466 San José - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/17 Estado del Tiempo:.....

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Finalizamos los trabajos	
pintados en las aulas de obra	
menos previas. El 11, 19 y 29	
fueron días de lluvia.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA
Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

SUPERVISIÓN MEC

ImprGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511.906 / 527 296

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000119

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 1275 San Antonio - Distrito de Gral. Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo: .....

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
[illegible]	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Jefe de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº0000175

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 978 San Antonio de Padua - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/16 Estado del Tiempo:.....

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Continúan los trabajos [illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

EMPRESA FISCALIZADORA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000190

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 100 República de Colombia***

Distrito de Villa del Rosario - Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Continuaron los trabajos de	
acuerdo con las ordenes de cambio	
previas. El 11, 12 y 13	
los días de lluvia	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº0000169

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 33 Don Carlos Antonio López***

Distrito de Villa del Rosario - Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Se realizaron los trabajos pla	
tados en los ambos del pro	
yecto. Entre 11 y 21	
horas día de lluvia	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHAVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 908 / 527 296

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000151

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 1473 Mariscal Estigarribia***

Distrito de San Estanislao - Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha:..... Estado del Tiempo:.....

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 / 527 296

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000158

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 357 Coronel Zollo Gonzalez***

Distrito de San Estanislao - Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Continúan los trabajos iniciados	
en los días de operaciones	
previas. El 17, 19 y 29 fueron	
días de lluvia.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000069

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 1643 Mariano Dinatale***

Distrito General Elizardo Aquino - Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del día 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Realizaron los trabajos	
solicitados en las actas de	
operaciones previas los días	
17, 19 y 27 fueron días de	
lluvia	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHAVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000059

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 7320 Arasa Poty - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
No se pudieron realizar	
actividades los dias 11, 19 y	
29 por lluvia	
Aguardando aprobación de adm	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000174

Institución Educativa: ***Colegio Nacional San José del Rosario - Distrito de Villa del Rosario***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 15/01/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Se realizó [illegible]	
de los [illegible]	
y albañilería	
Se [illegible]	
las instalaciones [illegible]	
eléctricas [illegible]	
eléctricas [illegible]	
El 11 [illegible]	
lugar [illegible]	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000175

Institución Educativa: ***Colegio Nacional San José del Rosario - Distrito de Villa del Rosario***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 16 al 30/04/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Se realizaron la limpieza de terreno, lleno y compactación de cimiento corrido y pozo ciego para instalaciones en baños	
Los días 19 y 29 hubo clase no hubo p. lo que no hubo actividades	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
CARAGUATAY S.R.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA
Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000197

Institución Educativa: ***Colegio Yataity del Norte - Distrito de Yataity del Norte***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha:..... Estado del Tiempo:.....

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

..... EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

..... EMPRESA FISCALIZADORA

..... SUPERVISIÓN MEC

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000191

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 417 Juana María de Lara - Distrito de Yataity del Norte***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha:..... Estado del Tiempo:.....

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

..... EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

..... EMPRESA FISCALIZADORA

Luis Becerra
Ing.
Fiscal

..... SUPERVISIÓN MEC

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 908 / 527 296

Original - Duplicado - Triplicado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000192

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 417 Juana María de Lara - Distrito de Yataity del Norte***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha:..... Estado del Tiempo:.....

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

..... EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

..... EMPRESA FISCALIZADORA

Ing. Civil
Fiscal

..... SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000084

Institución Educativa: ***Escuela Básica Nº 4694 San Luis - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
los días 11, 19 y 20 hubo	
días de lluvia por lo que	
no se pudo realizar	
otras tareas.	
Se aguarda aprobación de	
adenda.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000040

Institución Educativa: ***IFD Gral. Aquino - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 15/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Se concluyeron las actividades de techo, albañilería y pintura en el bloque de 2 salón multiuso. También se concluyeron los techos y pinturas en el bloque cantina. El 11 fue día de lluvia por lo que no hubo actividades	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000041

Institución Educativa: ***IFD Gral. Aquino - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 16 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	*FISCALIZACIÓN MEC*
Se realizaron pruebas en	
el bloque de 4 aulas y	
[illegible]	
[illegible] de cabeletas de	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A.
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE X Nº 03

LIBRO DE OBRA Nº 0000091

Institución Educativa: ***Colegio Nacional San Luis - Distrito General Elizardo Aquino***

Departamento de San Pedro

Empresa Contratista: **Caraguatay S.A.** Fiscalización Contratista: **CIALPA S.A.** Lote Nº: **03**

Supervisión MEC: Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Fecha: Del 01 al 30/09/19 Estado del Tiempo:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
El 11, 19 y 29 fueron días	
de lluvia por lo que no	
se realizaron actividades	
Se espera aprobación del	
Informe	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

CARAGUATAY S.A
LUIS M. CHÁVEZ
Ingeniero Civil
Residente de Obra

EMPRESA FISCALIZADORA

Luis Becerra
Ing. Civil
Fiscal

SUPERVISIÓN MEC

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 / 527 296

Original - Duplicado - Triplicado

flow Vos tenés el control. Personal

NACIONALES

Lluvias continuarán este domingo

Los últimos análisis proveídos por la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología indican que las lluvias continuarán este domingo. Además, se mantendrá la probabilidad de tormentas eléctricas.

POR ABC COLOR
[illegible] DE SEPTIEMBRE DE [illegible]

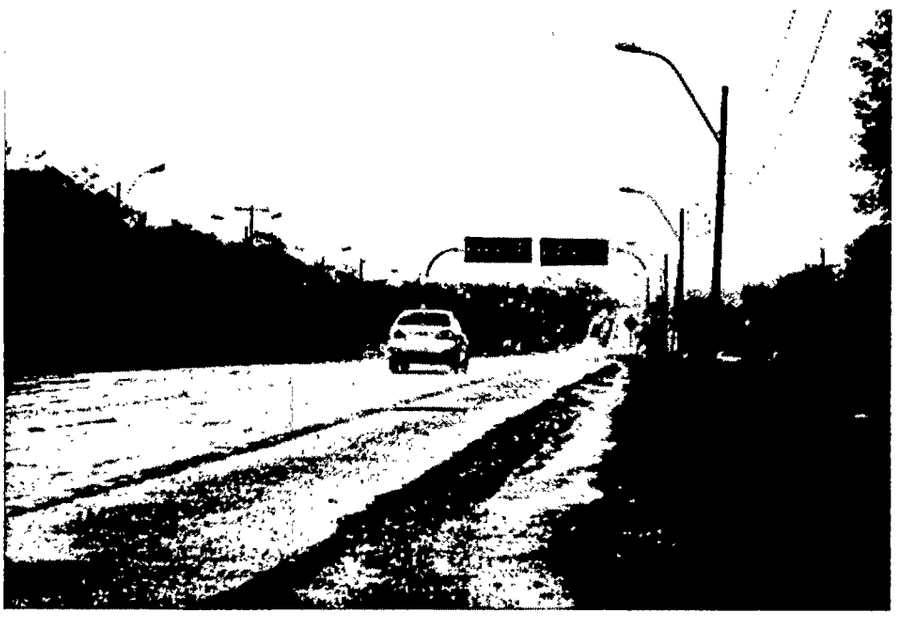

Si planea viajar este domingo, tenga en cuenta que el clima se presentará lluvioso.

Lo

O:

"Pa
nac
acu
con
pot

O:

All
Mu
Ast

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC
