HN
ING. HUGO NAVARRO
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROINDUSTRIALES

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

LLAMADO MOPC Nº 97/2022 MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE HAYES- REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
con ID: 419427

OFERENTE: ING. HUGO NAVARRO

MOPC Nº 97/2022

ITEM DE TRABAJO	17-ene-24	Dias Calendario									
		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	13-oct-24
Tramo 1.1: Ruta PY12 km 145 Triangulo - Ruta PY12 km 180 Zona Cadete Pando L= 35,00 km											
Limpieza de franja lateral		0,00%	15,00%	15,00%	10,00%	1,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	4,00%
Carga y conformación de suelo			15,00%	15,00%	10,00%	1,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	4,00%
Abovedamiento de calzada y cuneteado			15,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
Construcción de Alcantarilla Tubular Simple ATS Ø = 1,00 m								30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
Construcción de Alcantarilla Celular Simple ACS 1,00m x 1,00m								30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
Instalaciones y Servicios Especializados											
Tramo 1.2: Ruta PY12 Acceso a Cadete Pando L= 11,00 km											
Abovedamiento de calzada y cuneteado				20,00%	5,00%	0,00%	0,00%	35,00%	40,00%		
Tramo 1.3: Ruta PY12 km 180 km 243 L= 63,00 km											
Abovedamiento de calzada y cuneteado				10,00%	5,00%	0,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
TOTAL											
Avance mensual proyectado	0,00%	0,23%	12,15%	16,91%	20,85%	20,85%	16,88%	12,13%			
Avance acumulado mensual proyectado	0,00%	0,23%	12,39%	29,29%	50,14%	71,00%	87,87%	100,00%			
Avance mensual Proyectado - CMN° 1	0,00%	0,05%	11,97%	16,73%	20,67%	20,67%	16,70%	11,95%			
Avance acumulado proyectado - CMN° 1	0,00%	0,05%	12,02%	28,75%	49,42%	70,09%	86,79%	98,74%			
Avance mensual proyectado - prorroga por lluvias hasta may-24	0,00%	0,00%	11,92%	12,40%	8,09%	0,77%	8,37%	17,41%	17,45%	17,14%	5,18%
Avance acumulado proyectado - prorroga por lluvias hata may-24	0,00%	0,00%	11,92%	24,32%	32,41%	33,18%	41,55%	58,97%	76,42%	93,56%	98,74%

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

ING. HAROLD ELADIO MARTINEZ
FISCAL DE OBRAS
D.C.V. M.O.P.C.

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

70 (setenta)

HN
ING. HUGO NAVARRO
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROINDUSTRIALES
[illegible]
[illegible]@gmail.com
[illegible]

Curva de Avance de Obra

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODA EL TERRITORIO NACIONAL

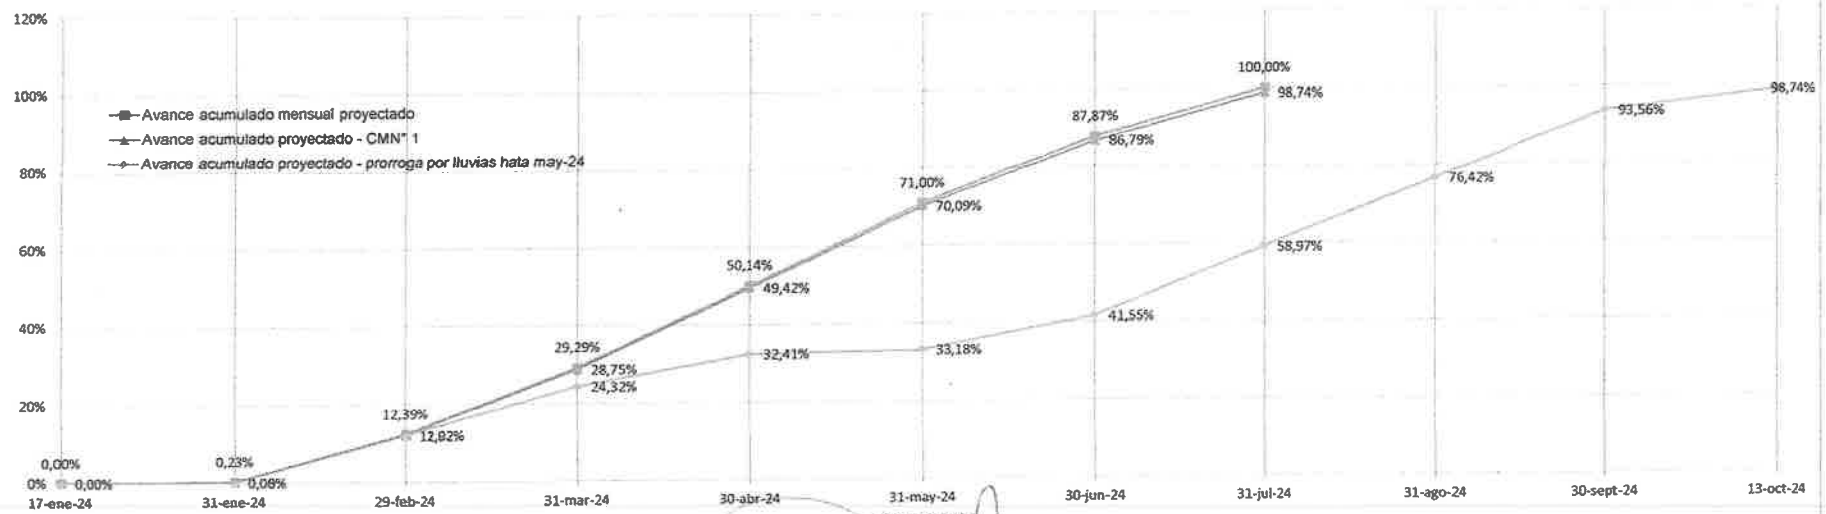

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

ING. HAROLD ELADIO MARTINEZ
FISCAL DE OBRAS
D.C.V. M.O.P.C

Ing. Oscar E. P C.
Jefe Dpto. Ej
DCV - M

69 (sesenta y nueve)
