Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORÁNDUM C.P.I. Nº 254/2020

A
CAC

A: **Abg. Yenny Carolina Ovelar de Torres**
Coordinadora de la Unidad Operativa de contrataciones

DE: **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila**
Coordinadora. Coordinación de Proyectos de Infraestructura-**UEPP**
Arq. Raquel Ugarte. Supervisor del Lote 8.**CPI-UEPP**

Asunto: **Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas** ITAPÚA -MISIONES /ÑEEMBUCÚ – Lote Nº 8 Contrato **Nº20/2019- CONTRATISTA: CORPORACIÒN CONSTRUCTIVA S.R.L.**

REF LPN: **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº2/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS ,185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA "-PLURIANUAL –ID Nº 356.942**

Fecha: 06/03/2020

Por la presente la Supervisión del Lote Nº 8 - Itapúa – Misiones – Ñeembucú de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en referencia a la **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº2/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS ,185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA "- PLURIANUAL –ID Nº 356.942**, presenta por este medio el CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, en el plazo de ejecución de las obras correspondientes al Contrato Nº 20/2019 - Lote Nº 8, a cargo de la empresa **CORPORACIÒN CONSTRUCTIVA S.R.L.**

1 - CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÀTICAS				
Nº	**MES**	**CANT. DE LLUVIAS - DINAC**	**INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras**	**DÍAS ACUMULADOS**
1	FEBRERO/2020	5	9	14
			TOTAL	**14**

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**

CGC 23.1 Prórroga de los Plazos

- Fuerza Mâyor.

- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: según los Certificados de uso de Tiempo presentado por el fiscal en las Certificaciones de obra mensual, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obra correspondiente y de sus incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe con imágenes del estado debido a las inclemencias climáticas.

Condiciones Generales del Contrato (CGC), apartado C. Plazos

25. Inclemencias climáticas

25.1 En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

25.2 Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

25.3 Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Corresponde remitir la contabilización de la suspensión por lluvias e incidencias del mes de febrero de 2020, **APROBADA** por la **fiscalización** de la **Universidad Nacional de Caaguazú**, por Nota UNCA/MEC Nº 98/2020/LOTE 8, del 4 de marzo de 2020, por un total de **14 (catorce) días** calendarios.

NOTA UNCA / MEC N° 116/2020 / LOTE 8

Coronel Oviedo, 4 de marzo de 2020

Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Presente:

> *Ref:* **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL ID N° 356.942" Convocado por el MEC en el marco del programa de expansión de la atención educativa para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance ampliado.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **Corporación Constructiva.**, dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS DE 14 DÍAS** debido a lluvias y sus consecuencias del **mes de febrero** del corriente.-

El pedido fue verificado por la fiscalización, teniendo en cuenta el registro de precipitación diaria correspondiente al mes de febrero emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología, y las constancias dejadas en los Libros de Obras de los días en los cuales se suspendió el trabajo.

Se adjuntan a la nota;

- Nota de pedido por parte de la contratista
- Registro de lluvias de la DINAC
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de febrero 2020 (01/02/2020 al 29/02/2020)
- Cuadro de prórroga de plazos
- Libros de obra

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.-

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA

ING. ROBERTO CHÁVEZ AYALA
Representante Legal
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA EL LOTE N° 8

N°	MES	CANT. DE LLUVIAS - DINAC	REGISTROS EN EL LIBRO DE OBRA	DIAS CONSIDERADOS
1	ENERO/2020	7	21	21
2	FEBRERO/2020	5 ✓	14	14
			TOTAL	35 días

CUADRO DE DESPLAZAMIENTO DE PLAZOS DEL CONTRATO

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **5.602.593.035**
Contrato N°: 20/2019
Contratista: CORPORACION CONSTRUCTIVA

DESCRIPCIÓN	INICIO	FIN	DÍAS	OBSERVACIONES
Suscripción del Contrato	14/10/2019			Contrato inicial
Acta de Inicio del Contrato	30/10/2019			150 días para tipo 1, 170 días para painf.
Desplazamiento por inclemencias Climáticas	ENERO/2020	FEBRERO/2020	35	Según registros pluviométricos de la DINAC y registros en libros de obras
Total días de prórroga por inclemencias climáticas y falta de materiales = 35 días (treinta y cinco)				

Rene Villalba Martínez
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.670
Fiscal de Obras

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.
Calle Gral. Bruguez Nº 668- Encarnación - Tel. 071-202056- e-mail: marianosarquis@hotmail.com

Enc, 03 de marzo de 2020

Señor
Ing. Roberto Chavez
Representante Legal
UNCA
Presente

Ref. CONTRATO N° 20/2019 – CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/2019 "CONSTRUCCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 356.942

Por este medio el INGENIERO MARIANO SARQUIS con CI: 2.329.331, solicita a usted y por su intermedio a quien corresponda prorroga en los plazos del mes de febrero conforme al siguiente cuadro

CUADRO DE DESPLAZAMIENTO DE PLAZOS DEL CONTRATO

Contrato Vía Excepción N° 02/2019 "Construcción de Espacios Educativos, 185 Espacios Educativos para Primera Infancia" – Plurianual – Id. Nº 356.942

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **5.602.593.035**
Contrato N°: 20/2019
Contratista: Corporación Constructiva S.R.L.

DESCRIPCIÓN	Inicio	Fin	Días	Observaciones
Suscripción del Contrato	14/10/2019			Contrato inicial
Acta de Inicio del Contrato	30/10/2019			150 días para tipo 1, 170 días para painf.
Orden de Servicio Nº 2	01/01/2020			100 días para tipo 1, 120 días para painf.
Desplazamiento por Inclemencias Climáticas (febrero 2020)			14	Según Registros Pluviométrico de la DINAC y Registros en Libros de obras
Plazo 170 días - Considerando inclemencias climáticas = 14 días (04/06/2020)				
Plazo 150 días - Considerando inclemencias climáticas = 14 días (15/05/2020)				

Se corre la finalización del plazo del contrato hasta el día 06 de junio de 2.020.
Para las obras con plazo de 170 días.
Se corre la finalización del plazo del contrato hasta el día 15 de mayo de 2.020.
Para las obras con plazo de 150 días.

Sin otro particular, se despide no sin antes agradecer su deferente atención.

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

Ing. Mariano Sarquis
Representante Legal
Corporación Constructiva S.R.L

INFORME DE LLUVIAS E INCIDENCIAS CLIMÁTICAS EN LAS OBRAS	PERIODO: 02/2020
"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL ID N° 356.942"	
CONTRATISTA:	CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L. - LOTE N°8
CONTRATO N°	20/2019
MONTO CONTRATO Gs:	5,602,593,035
PLAZO	150 días tipo 1 170 días tipo PAINF
Fiscalizacion :	Arq. Leonor Rene Villalba Martinez

REGISTRO LIBRO DE OBRAS - DIAS DE INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Fechas	Registro Asentado en Libro de Obras	Institucion Educativa
08/02/2020 - 14/02/2020 - 15/02/2020 - 17/02/2020 - 25/02/2020	Sin actividades por concecuencia de las lluvias intensas	Esc. Bás. N° 1429 Walter Becker
08/02/2020 - 14/02/2020 - 15/02/2020 - 17/02/2020 - 25/02/2020	Sin actividades por concecuencia de las lluvias intensas	Esc. Bás. N° 2432 - Tte. Segundo R. Davila
08/02/2020 - 14/02/2020 - 15/02/2020 - 17/02/2020 - 25/02/2020	Sin actividades por concecuencia de las lluvias intensas	Esc. Bás. N° 1220 Juan Pablo Segundo
08/02/2020 - 14/02/2020 - 15/02/2020 - 17/02/2020 - 25/02/2020	Sin actividades por concecuencia de las lluvias intensas	Esc. Bás. N° 572 John F. Kennedy
08/02/2020 - 14/02/2020 - 15/02/2020 - 17/02/2020 - 25/02/2020	Sin actividades por concecuencia de las lluvias intensas	Esc. Bás. N° 244 Rca. Oriental del Uruguay

Villalba Martinez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.570
Fiscal de Obras

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.

INFORME DE LLUVIAS E INCIDENCIAS CLIMÁTICAS EN LAS OBRAS	PERIODO: 02/2020

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL ID Nº 356.942"

IMAGENES - ESTADO DE LAS OBRAS DEBIDO A INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Resumen General de Instituciones - Departamento de Itapua

Distrito de Alto Vera - Esc. Bás. N° 1429 Walter Becker

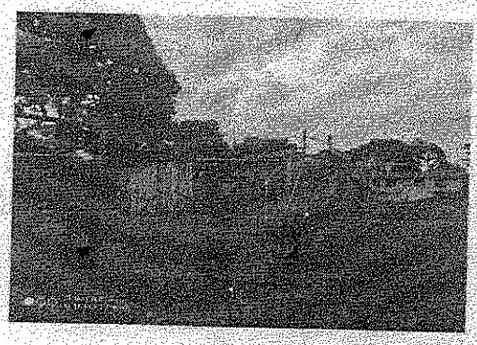

Distrito de Encarnacion - Esc.Bas. N° 2432 Tte. Segundo R. Davila

Distrito de Itapua Poty - Esc.Bas. N° 2120 Juan Pablo Segundo

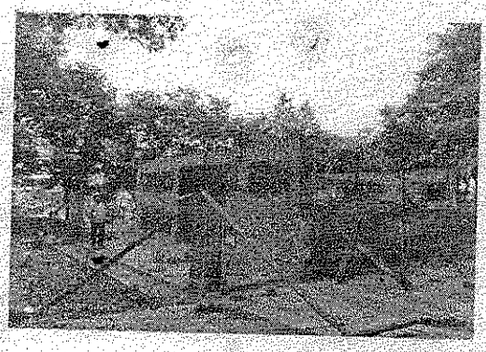

Distrito de Encarnacion - Esc.Bas. N° 572 John F. Kennedy

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.

Rosa Valdez Martinez
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 2010
Fiscal de Obras

INFORME DE LLUVIAS E INCIDENCIAS CLIMÁTICAS EN LAS OBRAS	PERIODO: 02/2020
"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL ID Nº 356.942"	



Distrito de Pilar - Esc.Bas. Nº 244 Rca. Oriental del Uruguay

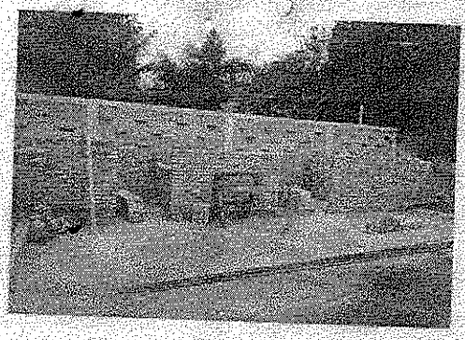

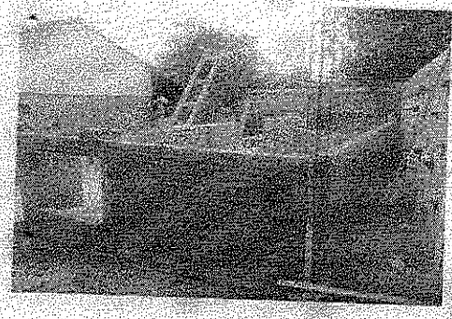

Rene Villalba Martínez
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.570
Fiscal de Obras

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.

INFORME DE LLUVIAS E INCIDENCIAS CLIMÁTICAS EN LAS OBRAS	PERIODO: 02/2020

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL ID Nº 356.942"

CONCLUSIÓN:

Por la situación geografica de la ubicación de estas obras se registra un alto grado de humedad en el ambiente por las continuas lluvias, característica de la zona.

En el Libro de Obras se observan registros de los días de lluvias, lo que ocasiona exceso de humedad en los materiales utilizados y a utilizarse durante la ejecución de las obras, especificacmente en los rubros de mampostería de elevacion, estructura de H° A°, revoques.

Considerando lo expuesto se concluye, según las circunstancias alegadas, que estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Es mi informe.

Rene Villalba Martinez
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.670
Fiscal de Obras

Arq. Leonor Rene Villalba
Fiscal de Obras Lote N°8

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora - Fiscal
U.E.P.P. - C.P.I.

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA			
185 Establecimientos Itapua - Neembucu y Misiones			
	Encar		
DIAS	feb-20	Observación	Día computable
1	0	Sin actividad por afectación de lluvia	1
2	0	Sin actividad por afectación de lluvia	1
3	0		0
4	0		0
5	0		0
6	0		0
7	0		0
8	3,2	Sin actividad por lluvia	1
9	0		0
10	0		0
11	0		0
12	0		0
13	0		0
14	18,8	Sin actividad por lluvia	1
15	28	Sin actividad por lluvia	1
16	0	Sin actividad por afectación de lluvia	1
17	12	Sin actividad por lluvia	1
18	0	Sin actividad por afectación de lluvia	1
19	0	Sin actividad por afectación de lluvia	1
20	0		0
21	0		0
22	0		0
23	0		0
24	0		0
25	31,1	Sin actividad por lluvia	1
26	0	Sin actividad por afectación de lluvia	1
27	0	Sin actividad por afectación de lluvia	1
28	0	Sin actividad por afectación de lluvia	1
29	0	Sin actividad por afectación de lluvia	1
			0
			0
Precipitación caída (DINAC)	404,3	Total de días de lluvias y afectaciones	**14**

Escala		
** > 6 = 5 mm	<	1 día
** 10 mm	+1 día de afectación	2 días
** 20 mm	+2 día de afectación	3 días
** 30 mm	+3 día de afectación	4 días

9 días
5 días

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

Corporación Constructiva S.R.L.
Ing. Mariano G. Sarquis
Representante Legal

REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA (mm) ANO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		3,2										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		18,8										
15		28,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		12,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		31,1										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29		0,0										
30												
31												
Total		93,1										
Máx. 24h		31,1										
Día Máx.		25										

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, T = Precipitación no medible - = Sin datos de precipitación

Centro Meteorológico Nacional Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 1192-1197 - E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py Asunción - Paraguay
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Julián Olmedo
Jefe Sección Meteorología Aeronáutica
DMN - DINAC

Corporación Constructiva S.R.L.
Ing. Mariano G. Sarquis
Representante Legal

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondéha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

NO

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS — N° 0000018

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 5187 Juan Carlos Hrase - Encarnación -

EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.

FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú

SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

DÍA: 03/02/2020 al 04/02/2020

CONTRATISTA — FISCAL: Arq. René Villalba.

TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
01- MAMPOSTERIA DE ELEVACION. POR LA TARDE LLOVIENDO - SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD	Sin actividad
02- HUMEDAD EN EL TECHO	
03- PROSIGUEN LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Jesús Villalba Martínez Arquitecto Reg. Prof. N° 2.070 Dir. Técnico de Obras

Escaneado con CamScanner

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondéha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	Nº 0000021
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 5187 Juan Carlos Hrase - Encarnación -	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.	
DÍA: 13/02/2020 AL 19/02/2020	
CONTRATISTA	FISCAL: Arq. René Villalba.
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
13- MARTES DIA 1º - CARGAMENTO	Sin actividad.
14- S/ ACTIVIDAD POR LLUVIA	
15- S/ ACTIVIDAD POR LLUVIA	
16- EXCESIVA HUMEDAD EN EL TERRENO	✓
17- S/ ACTIVIDAD POR LLUVIA	
18-19- HUMEDAD EN EL TERRENO	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Escaneado con CamScanner

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	N° 0000024

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 5187 Juan Carlos Hrase - Encarnación -

EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.

FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú

SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

DÍA: 20/01/2020 al 29/01/2020

CONTRATISTA	FISCAL: Arq. René Villalba
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
20- VIGA DE CADENAS.	Sin actividad.
21- MAMPOSTERIA INTERIOR	
22- IDEM DIA ANTERIOR	
23- S/ ACTIVIDAD POR LLUVIAS	
26, 27, 28, 29 EXCESIVA HUMEDAD EN EL TERRENO	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

René Villalba Martínez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.670
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner

TEKOMBO´E NA TEMBIKUAA
Motenondéha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	N° 0000044
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2514 Vicente Ignacio Iturbe - San Rafael del Paraná -	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.	
DÍA: 28/02/2020	
CONTRATISTA	FISCAL: Arq. René Villalba
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIAS	Sin actividad.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Villalba, Martín
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.670
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

Escaneado con CamScanner

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbosenodeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS | N° 0000042

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2445 San Francisco de Asis - Cambyretá -

EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.

FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú

SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

DÍA: 13/04/2020 AL 20/02/2020

CONTRATISTA	FISCAL: Arq. René Villalba
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
13- MA. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS	Sin actividad.
14- 15 LLUVIA S/ACTIVIDAD	
16- EXCESIVA HUMEDAD EN EL TERRENO	
17- S/ACTIVIDAD POR LLUVIA	
18 Y 19 S/ACTIVIDAD POR CONSECUENCIA DEL DIA ANTERIOR	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS TRANSITABLES			
PUERTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

René Villalba Martínez
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.670
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner

Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS

N° 0000047

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2514 Vicente Ignacio Iturbe - San Rafael del Paraná -

EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.

FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú

SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

DÍA: 20/02/2020 al 29/02/2020

CONTRATISTA

FISCAL: Ar. René Villalba

TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
20/02 RAMPIS TERAL DE CAMINO	Sin actividad.
25/02 LLUVIA (SIN ACTIVIDAD)	
26/02 Humedad en el terreno	
27/02 Humedad en el terreno	
28/02 Humedad en el terreno	
29/02 Humedad en el terreno.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA	COMIENZO:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA:

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

Ar. René Martínez Villalba Matrícula Nº 2.670 Fiscal de Obras

SUPERVISIÓN

Escaneado con CamScanner

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mosarendeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS — N° 0000044

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2445 San Francisco de Asis - Cambyretá -

EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.

FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú

SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

DÍA: 20/02/2020 AL 29/02/20

CONTRATISTA

FISCAL: Arq. René Villalba

TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
20 - VIGA DE CAMELIA	Sin actividad
21 - IDEM DIA ANTERIOR	
22 - MAMPOSTERIA ELEV. AT	
23 - 24 IDEM DIA ANTERIOR	
25 - S/ACTIVIDAD POR LLUVIAS	
26 - 27 - 28 y 29 EXCESIVA HUMEDAD EN EL TERRENO	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA	COMIENZO:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS TRANSITABLES		
PUENTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Escaneado con CamScanner

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	N° 000033
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2336 Espíritu Santo - Natalio -	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
FISCALIZACIóN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.	000007
DÍA: 17.02/2020.-	
CONTRATISTA	FISCAL: Arq. René Villalba
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA.-	Sin Observaciones.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
DÍA: 17.02/2020.-				
HORA	COMIENZO: 05:00.-			
	FIN: 15:00.-			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
- DILAT. DE LADRILLO EN GALERIA.				
- CARGA Hº ENCADENADO SUP.				

INCIDENCIAS

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
DÍA:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIóN

René Villalba Martínez
Reg. Prof. N° 2470
Fiscal de Obras

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondéña
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	0000036
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2336 Espiritu Santo - Natalio -	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.	000008
DÍA: 20/02/2020. –	

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: Arq. René Villalba. TRABAJOS VERIFICADOS:
1. SIN ACTIVIDAD A CONSECUENCIA DE LA LLUVIA. –	Sin Observaciones.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIóN

Rte. Salvador Rejis

Rene Villalba Martínez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2670
Fiscal de Obras

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeiva
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS — N° 0000031

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2336 Espíritu Santo - Natalio -

EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.

FISCALIZACIóN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú

SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

000005

DÍA: 13/02/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: Arq. René Villalba TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.-	Sin Observaciones.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 13/02/2020

HORA — COMIENZO: 07:30 — FIN: 14:00

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
- CARGA HORMIGON ENCADENADO SUPERIOR.-			

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — Rte Salvador Pelts

FISCALIZADOR — Arq. Natalia Martínez, Arquitecto, Reg. Prof. N° 2670, Fiscal de Obras

SUPERVISIóN

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS — N° 000033

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2336 Espíritu Santo - Natalio -

EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.

FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú

SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

DÍA: 17/02/2020 — 000010

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: Arq. René Villalba TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA:-	Sin Observaciones.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 17/02/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 05:00			
	FIN: 15:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
- PILAR DE LADRILLO EN GALERIA				
- CARGA H° ENCADENADO SUP.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Arq. Verónica Martínez
Arquitecto
Prof. Nº 2.670
Fiscal de Obras

Rec: Salvador Rejis

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mbarendondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS N°000035

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2336 Espíritu Santo - Natalio -

EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.

FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú

SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

000011

DÍA: 19/02/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: Arq. René Villalba TRABAJOS VERIFICADOS:
*SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	Sin Observaciones.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 19/02/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 01:00			
	FIN: 18:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
- PILAR DE LADRILLO EN GALERIA				
- RECOGIDA DE LAD. COMUN.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Arq. René Villalba Martínez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.870
Fiscal de Obras

RESIDENTE: SALVADOR REYES

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	N° 0000031
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 939 Rvdo. Padre Ricardo Musch - Natalio -	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	000012
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.	
DÍA: 13/02/2020	
CONTRATISTA	FISCAL: Arq. Pablo Villalba
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia.-	Sin Observaciones.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 13/02/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
HORA	COMIENZO: 07:30			
	FIN: 15:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
* Excavacion C.S y Pozo Absorvente.-				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — Re: Salvador Reis

FISCALIZACIÓN — Arq. Pablo Villalba Martínez, Arquitecto, Reg. Prof. N° 2.670, Fiscal de Obras

SUPERVISIóN

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	N° 0000033

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 939 Rvdo. Padre Ricardo Musch - Natalio -

EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.

FISCALIZACIóN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú

SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

0000015

DÍA: 17-02-2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: Arq. Pablo Villalba Mtz. TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.-	SIN OBSERVACIONES.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 17/02/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
HORA	COMIENZO: 08:00			
	FIN: 13:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
- MAMPOST. EN C.S Y P.C.				
- RECOGIDA DE ADD. COMUN.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Pablo Villalba Martínez
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.670
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA — Re: Salvador Rejis

FISCALIZADOR

SUPERVISIóN

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	0000032
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 940 Prof. Emma Leonor Pereira de Paiva - Natalio -	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	000014
FISCALIZACIóN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.	
DÍA: 17/02/2020	
CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: Arq. Rene Villalba TRABAJOS VERIFICADOS:
Lluvia.-	Sin observaciones.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 17/02/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
HORA	COMIENZO: 03:00			
	FIN: 13:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
- CARGA DE HORMIGON ENCADENADO SUPERIOR.-				
- PILARES DE HORMIGON COMUN				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIóN

Rene Martínez Martínez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.670
Fiscal de Obras

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

0000034

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 940 Prof. Emma Leonor Pereira de Paiva - Natalio -

EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.

FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú

000015

SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

DÍA: 19/02/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: Arq. René Villalba Ibz. TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA.	Sin Observaciones.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 19/02/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 01:00			
	FIN: 09:30			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:
- PILARES DE GALERIA.

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

Arq. Guillermo Martínez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.670
Fiscal de Obras

SUPERVISIÓN

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	N° 0000033
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 5209 Critsin Galeano Godoy - Natalio	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
FISCALIZACIóN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.	
DÍA: 17/02/2020	
CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: Arq. René Villalba TRABAJOS VERIFICADOS:
lluvia	Sin Observaciones.

000016

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 17/02/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
HORA	COMIENZO: 08:00			
	FIN: 13:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
- CASTILLO DE HORMIGON ENCADENADO SUPERIOR.-				
- PILARES DE LADRILLO COMÚN.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA
SHWEDOR REJIS

FISCALIZADOR
Arq. René Villalba Martínez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.670
Fiscal de Obras

SUPERVISIóN

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	N° 0000035
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 5209 Critsin Galeano Godoy - Natalio	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
FISCALIZACIóN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.	
DÍA: 19/02/2020	000017
CONTRATISTA	FISCAL: Arq. René Villalba Hoa
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Lluvia.-	Sin Observaciones.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 19/02/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
HORA	COMIENZO: 03:00			
	FIN: 10:30.			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
MAMPOSTERIA RECOGIDA.				
* CARGA HORMIGON PPAL.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — Rte: Salvador Rejis

FISCALIZADOR — Arq. René Villalba Martínez, Arquitecto, Reg. Prof. Nº 2.670, Fiscal de Obras

SUPERVISIóN
