Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

CAC

A
CAC

MEMORÁNDUM C.P.I. Nº 800/2020

A : **Abg. Yenny Carolina Ovelar de Torres** - Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

De : **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila**- Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP

Asunto : **Remisión de Aprobación de Prórroga de Plazo de Ejecución del contrato por Inclemencias Climáticas por 07 días correspondiente al mes de junio** – LOTE N° 1 (EDI) – Empresa: Ing. Fernando Moreno; en el marco del Contrato Vía Excepción N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL – ID N° 356.937, realizada por MEMORANDUN CPI N° 794/2020

Fecha: : 13 de julio de 2020.

Por la presente los **Fiscales del LOTE N° 1** (EDI) – **Concepción/Pdte. Hayes/San Pedro/Caaguazú,** de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en referencia a la **Contratación Vía Excepción N° 01/2019 "Construcciones de Espacios Educativos de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas" – Plurianual – ID N° 356.937,** presentan por éste medio el CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMATICAS – en el plazo de ejecución de las Obras correspondientes al Contrato N° 09/2019 - Lote N° 1 (EDI), a cargo de la Empresa ING. FERNANDO MORENO. Periodo JUNIO.

1- CUADRO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS				
N°	MES	CANT. DE LLUVIAS - DINAC	INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras	DIAS ACUMULADOS
1	JUNIO/2020	5	2	7
			TOTAL	7 días

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato. CGC 23.1

Prórroga de los Plazos de Ejecución:

- Fuerza Mayor.

- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: según los Certificados de uso de Tiempo presentado por el fiscal en las Certificaciones de obra mensual, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obra correspondiente y de sus

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 3662
Recibido por: Vera

DIA	MES	AÑO	HORA
14	07	2020	9:06

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe con imágenes del estado debido a las inclemencias climáticas.

Condiciones Generales del Contrato (CGC), apartado C. Plazos

25. Inclemencias climáticas.

25.1 En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

25.2 Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

25.3 Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Corresponde remitir la contabilización de la prórroga del plazo del contrato por lluvias e incidencias del mes de junio de 2020, **APROBADA** por la **fiscalización de la CPI UEPP**, por Informe Técnico CPI/UEPP N° 03/2020 del LOTE 1 (EDI), por un total de **siete (07) días** calendarios.

Se adjuntan copias de:

a- *MEMORANDUM CPI N° 794/2020*
b- *REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020, de la **Dirección de Meteorología e Hidrología** (Concepción, Silvio Pettirossi Luque, San Pedro del Ycuamandiyú, Coronel Oviedo) del mes correspondiente.*
c- *Registros de lluvias en los Libros de Obras del mes de junio*
d- *INFORME TECNICO CPI/UEPP N° 03/2020*

Atendiendo a lo solicitado y la documentación entregada, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, recomienda la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución del Contrato N° 09/2019- Lote 1 y dar continuidad a los trámites pertinentes.

Atentamente.

Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila
Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
CPI – UEPP - MEC

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORÁNDUM C.P.I. Nº 794/2020

A
CAC

A : **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP

De : **Arq. Juan Fernando Noguera.** Fiscal del Lote 1 (EDI) - CPI-UEPP
Dpto. Concepción/Pdte. Hayes

Arq. Juan F. Noguera T.
Reg. MOPC Nº 1819

Arq. Aurora Vera Cárdenas. Fiscal del Lote 1 (EDI) - CPI-UEPP
Dpto. Concepción/Pdte. Hayes

Arq. Ignacio Marecos. Fiscal del Lote 1 (EDI) - CPI-UEPP
Dpto. Caaguazú

Arq. Ignacio Marecos
Reg. Prof. Nº 1.418

Asunto : **Remisión de aprobación de prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas por 7 días correspondiente al mes de junio** – LOTE N° 1 (EDI) - Empresa: Ing. Fernando Moreno; en el marco de la LPN de referencia: "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL – ID N° 356.937, UEPP MEC Exp. N° 3519 de fecha 07/07/2020

Fecha: : 13 de julio de 2020.

Por la presente los **Fiscales del LOTE N° 1** (EDI) **– Concepción/Pdte. Hayes/San Pedro/Caaguazú,** de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en referencia a la **Contratación Vía Excepción N° 01/2019 "Construcciones de Espacios Educativos de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas" – Plurianual – ID N° 356.937,** presentan por éste medio el **CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMATICAS –** en el plazo de ejecución de las Obras correspondientes al **Lote N° 1 (EDI),** a cargo de la Empresa ING. FERNANDO MORENO.

1- CUADRO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS					
N°	MES	CANT. DE LLUVIAS - DINAC	INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras	DIAS ACUMULADOS	CON ADENDA
1	JUNIO/2020	5	2	7	No
			TOTAL	7 días	Para Adenda (CAC)

VoBo

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato. CGC 23.1

Prórroga de los Plazos de Ejecución:
- Fuerza Mayor.
- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: según los Certificados de uso de Tiempo presentado por el fiscal en las Certificaciones de obra mensual, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obra correspondiente y de sus incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe con imágenes del estado debido a las inclemencias climáticas.

25. Inclemencias climáticas.
25.1 En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

25.2 Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

25.3 Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

25.4 Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el Contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la Contratante antes de los quince días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras.

Corresponde remitir la contabilización de la prórroga del plazo del contrato por lluvias e incidencias del mes de junio de 2020, APROBADA por la fiscalización de la CPI UEPP, por INFORME TECNICO CPI/UEPP N° 03/2020 del LOTE 1, Concepción, Pdte. Hayes, San Pedro y Caaguazú, por un total de **siete (07) días**, considerando la mayor cantidad de lluvias caídas y sus consecuencias en uno de los Departamentos del país que conforma el Lote de referencia.

Arq. Juan F. Noguera T.
Reg. MOPC N° 1819

Arq. Aurora Vera
Fiscal de Obras

Arq. Ignacio Marecos
Reg. Prof. N° 1.418

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Se adjuntan copias de:

a- *REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020, de la* ***Dirección de Meteorología e Hidrología*** *(Concepción, Silvio Pettirossi Luque, San Pedro del Ycuamandiyú, Coronel Oviedo) del mes correspondiente.*

b- *Registros de lluvias en los Libros de Obras del mes de junio*

c- *INFORME TECNICO CPI/UEPP N° 03/2020*

Atendiendo a lo solicitado y la documentación entregada por la constructora, la Fiscalización de Obras aprueba la ampliación del plazo de Ejecución del Contrato N° 09/2019- Lote 1 - Empresa Fernando Moreno y dar continuidad a los trámites pertinentes.

Atentamente.

Ministerio de Educación y Ciencias · Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos · Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Arq. Ignacio Marecos Arq. Ignacio Marecos Reg. MOPC N° 1.418	Arq. Juan F. Noguera T. Reg. MOPC N° 1819 Arq. Juan Fernando Noguera *Fiscales Lote N° 1*	Arq. Aurora Vera

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 3519 **Año:** 2020

Fecha 08/07/2020 **Fecha Ingreso:** 08/07/2020

Fecha Límite: 08/07/2020

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FONACIDE>FEEI>BIENES Y SERVICIOS>

Referencia: NOTA S/N, FERNANDO MORENO

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Solicitar prórroga por dias de lluvia y sus consecuencias, FERNANDO MORENO

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Laura López	Laura López	08/07/2020	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Laura López	Infraestructur	08/07/2020	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

Arq. Ignacio Marecos

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº:
Recibido por: Alfredo R

DIA	MES	AÑO	HORA
8	7	20	12:00

Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
Email:morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 07 de Julio de 2020.-

Señor
Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: Contrato N° 09/19 – LOTE N° 1 - Contratación Vía Excepción N° 01/2019- Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas alternativas constructivas mixtas Plurianual - ID N° 356937 – Ministerio de Educación y Ciencias.-

De mi consideración:

Por la presente, me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar para su verificación, aprobación; la solicitud de **PRORROGA POR DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS**, correspondiente al mes de **JUNIO DE 2020 (del 05 al 30 de Junio).-**

Se presenta en anexo:

- Copia de los Libros de Obra correspondientes al mes de Junio/2020, de las 4 Instituciones Educativas.-
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de Junio/2020 (05/06/2020 al 30/06/2020).-
- Copia de informe de DINAC – Dptos. de Concepción (Aeródromo de Concepción); Caaguazú (Coronel Oviedo); San Pedro (San Pedro de Ycuamandyju); Pdte. Hayes (se adopta la Estación Pluviométrica del Aeropuerto Silvio Pettirossi).-

Fundamentados en las CEC, clausula CGC 22.1, y en las CGC., ítem C, clausula 24 y sus anexos, solicitamos (conforme lo demostrado en los Libros de obra, planilla anexa e informe de la DINAC) los siguientes días de Prorroga por lluvia y sus efectos por el mes de Junio 2020:

- **Escuela Básica N° 592-San Juan Bosco-Dpto. de Concepción: 3 días.-**
- **Escuela Básica N° 1251-San Francisco de Asís-Dpto. de Caaguazú: 8 días.-**
- **Escuela Básica N° 568-Las Residentas-Dpto. de San Pedro: 3 días.-**
- **Escuela Básica N° 182-Dr. Antolín Garcete-Dpto. de Pdte. Hayes: 2 días.-**

Atentamente.-

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 3519
Recibido por: Laura

DIA	MES	AÑO	HORA
07	07	2020	9:55

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
PROPIETARIO

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 592-SAN JUAN BOSCO-CONCEPCION

DIA	MES DE JUNIO-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/06/20		
02/06/20		
03/06/20		
04/06/20		
5/06/2020 (Acta de Inicio)	1	
06/06/20		
07/06/20		
08/06/20		
09/06/20		
10/06/20		
11/06/20		
12/06/20		
13/06/20		
14/06/20		
15/06/20		
16/06/20		
17/06/20		
18/06/20		
19/06/20		
20/06/20		
21/06/20		
22/06/20		
23/06/20		
24/06/20		
25/06/20		
26/06/20	1	
27/06/20		1
28/06/20		
29/06/20		
30/06/20		
01/07/20		
TOTAL	2	1

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS-MES DE JUNIO/2020	3

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO

ESCUELA BASICA N° 1251-SAN FRANCISCO DE ASIS-CAAGUAZU

DIA	MES DE JUNIO-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/06/20		
02/06/20		
03/06/20		
04/06/20		
5/06/2020 (Acta de Inicio)	1	
06/06/20		1
07/06/20		
08/06/20	1	
09/06/20		
10/06/20		
11/06/20		
12/06/20		
13/06/20		
14/06/20		
15/06/20		
16/06/20		
17/06/20		
18/06/20		
19/06/20		
20/06/20		
21/06/20		
22/06/20		
23/06/20		
24/06/20	1	
25/06/20		
26/06/20		
27/06/20		
28/06/20	1	
29/06/20		1
30/06/20	1	
01/07/20		1
TOTAL	5	3 2

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS-MES DE JUNIO/2020	8 7

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO

ESCUELA BASICA N° 568-LAS RESIDENTAS-SAN PEDRO

DIA	MES DE JUNIO-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/06/20		
02/06/20		
03/06/20		
04/06/20		
5/06/2020 (Acta de Inicio)	1	
06/06/20		1
07/06/20		
08/06/20		
09/06/20		
10/06/20		
11/06/20		
12/06/20		
13/06/20		
14/06/20		
15/06/20		
16/06/20		
17/06/20		
18/06/20		
19/06/20		
20/06/20		
21/06/20		
22/06/20		
23/06/20		
24/06/20		
25/06/20		
26/06/20	1	
27/06/20		
28/06/20		
29/06/20		
30/06/20		
01/07/20		
TOTAL	2	1

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS-MES DE JUNIO/2020	3

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO

ESCUELA BASICA N° 182-DR. ANTOLIN GARCETE-PDTE. HAYES

DIA	MES DE JUNIO-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/06/20		
02/06/20		
03/06/20		
04/06/20		
5/06/2020 (Acta de Inicio)	1	
06/06/20		1
07/06/20		
08/06/20		
09/06/20		
10/06/20		
11/06/20		
12/06/20		
13/06/20		
14/06/20		
15/06/20		
16/06/20		
17/06/20		
18/06/20		
19/06/20		
20/06/20		
21/06/20		
22/06/20		
23/06/20		
24/06/20		
25/06/20		
26/06/20		
27/06/20		
28/06/20		
29/06/20		
30/06/20		
01/07/20		
TOTAL	1	1

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS-MES DE JUNIO/2020	2

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						1,0						
2						0,0						
3						16,6						
4						25,8						
5						4,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						2,7						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						28,4						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						79						
Máx.24h						28,4						
Día Máx.						26						

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Meteo. e Hidr. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	25° 29' 01,48"	56° 22' 39,87"	159 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0						
2						0,0						
3						8,4						
4						40,2						
5						20,8						
6						0,0						
7						0,0						
8						4,2						
9						0,1						
10						0,0						
11						0,0						
12						1,2						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						0,0						
24						5,8						
25						0,0						
26						0,3						
27						0,0						
28						7,4						
29						0,0						
30						9,4						
31												
Total						98						
Máx, 24h						40,2						
Día Máx,						4						

Lic. Ricardo Andres Aveiro C.
Mat. Dpto. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						1,0						
2						0,0						
3						21,2						
4						21,6						
5						8,8						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,7						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						1,2						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						3,0						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						58						
Máx.24h						21,6						
Día Máx.						4						

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						T						
2						0,0						
3						17,1						
4						36,0						
5						8,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						0,0						
24						T						
25						0,0						
26						0,0						
27						0,0						
28						T						
29						0,8						
30						0,0						
31												
Total						62						
Máx. 24h						36						
Día Máx.						4						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Tel. 021-4381192

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

Nº 0000001

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 05/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
En el Distrito de Concepción, Dpto. de Concepción; en la Escuela Básica Nº 592 San Juan Bosco, siendo los 05 días del mes de junio; se reunen en el desempeño del Contratista, el Ing. Fernando Moreno, y el Arq. Celso Moreno y por la Fiscalización del CPI UEPP-MEC el Arq. Juan Fernando Noguera a las etapas de dar inicio a las obras en esta Institución Educativa –	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
Lluvia - Sin actividad en obra				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Juan F. Noguera T.
Reg. MOPC N° 1619

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356,937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000002

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 06/06/20 al 12/06/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra –	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Juan F. Noguera T.
Reg. MOPC N° 1819

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000003

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 13/06/20 al 19/06/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
DÍA:				
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
DÍA:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Juan F. Noguera T.
Reg. MOPC N° 1819

Arq. Celso L. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000004

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 20/06/2021 20/06/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 06/06/20

HORA: COMIENZO: FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
Lluvia - Sin actividad			

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Juan F. Noguera T.
Reg. MOPC Nº 7819

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000005

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 27/06/20 al 30/06/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra –	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
Efecto de lluvia – sin actividad –				

INCIDENCIAS

DÍA: 27/06/20	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Efecto de lluvia – sin actividad			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Juan F. Noguera T.
Reg. MOPC Nº 1819

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000001

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 05/06/2020

CONTRATISTA

TRABAJOS EJECUTADOS:

En el distrito de José Falcón, Dpto. de Pte. Hayes; en la Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete a los 05 días del mes de Junio; se reunen en representación del contratista el Ing. Fernando Moreno y el Arq. Celso Moreno; y para la Fiscalización CPI-UEPP-MEC el Ing. Juan Fernando Noguera; a los efectos de dar inicio a las obras en esta Institución Educativa –

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05/06/2020

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Lluvia – Sin actividad en obra –

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Juan F. Noguera T.
Reg. MOPC N° 1819

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000002

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antollano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 06/06/2020 al 12/06/2020

CONTRATISTA	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
DÍA:				
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
DÍA: 06/06/2020			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Efecto de lluvia - Sin actividad			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso J. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Juan E. Noguera T.
Reg. MOPC N° 1619
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000003

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 13/06/2020 AL 19/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Juan F. Noguera T.
Reg. MOPC Nº 1819

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N°.01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000004

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 25/06/2020 al 26/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Inactividad en obra –	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Juan F. Noguera T.
Reg. MOPC N° 1819

Arq. Celso J. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000005

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 17/06/2020 al 30/06/2020

CONTRATISTA/ TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra –	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
DÍA:				
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
DÍA:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Juan F. Noguera I.
Reg. MOPC N° 1819
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

0000001

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356,937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000001

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 05/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
En el Distrito de San Estanislao, Dpto. de San Pedro; en la Escuela Básica Nº 568 Las Residentas; a los 05 días del mes de Junio de 2020, se reunen en Representación del Contratista el Ing. Fernando Moreno y el Arq. Celso Moreno; y por la Fiscalización CPI UEPP MEC la Arq. Zarza Vera; a los efectos de dar Inicio a las Obras en esta Institución Educativa —	En la fecha se registra el Acta de inicio de Obra que corresponde a la Orden de Servicio Nº2.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
Lluvia. Sin actividad en obra		Sin actividad por lluvia		

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Arq. Celso M. Moreno M.

0000002

MINISTERIO DE EDUCACIóN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	N° 0000001

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIóN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIóN Y CERTIFICACIóN CPI UEPP MEC

DÍA: 06/06/2020 al 12/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra –	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 06/06/2020	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Efecto de lluvia – Sin actividad			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celsa M. Moreno M.

0000003

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356,937

LIBRO DE OBRAS — N° 0000001

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 13/06/2020 al 19/06/2020

CONTRATISTA

TRABAJOS EJECUTADOS:

Trabajos realizados:

→ Replanteo y Marcación de Obra (se procede con la previa aprobación de la Fiscalización a realizar el replanteo de Implantación del edificio quedando la distancia en paralelo con la construcción existente de 12.00 mts. entre ejes y 10.00 mts) se envía plano detallando la implantación.

→ Mejora del Suelo: Terraplenado de suelo arenoso compactado.

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS:

Implantación Final

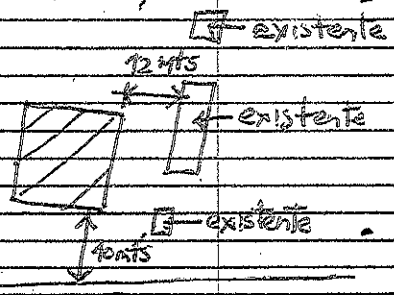

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso M. Moreno M.

Vera

0000004

MINISTERIO DE EDUCACIóN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	N° 0000001

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIóN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIóN Y CERTIFICACIóN CPI UEPP MEC

DÍA: 22/06/2020 al 26/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Trabajos realizados:	Sin actividad en Obra
→ Mezcla de suelo, terraplenado de suelo cemento	
Compactado.-	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 26/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
Lluvia - Sin actividades obra.-		Sin actividad en Obra		

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIóN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celsoll. Moreno M.

0000005

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.837

LIBRO DE OBRAS	N° 0000001

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 27/06/2020 al 30/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Trabajo en Realizados:	Con actividad en Obra
+ Excavación y Colado de Pilotes de 30x45 –	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDNº 356.937

Nº 0000001

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 05/06/2020

CONTRATISTA	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
En el Distrito de Caaguazú, Dpto. de Caaguazú, en la Escuela Básica Nº 1251, San Francisco de Asís, a los 05 días del mes de Junio de 2020 se reunen en representación del Contratista el Ing. Fernando Moreno y el Arq. Celso Moreno, y por la Fiscalización CPI-UEPP-MEC el Arq. Ignacio Marecos a los efectos de dar inicio a las obras en esta Institución Educativa —	En la fecha se redacta el Acta de inicio de Obras correspondiente a la Orden de Servicio Nº 9

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 05/06/2020

HORA: COMIENZO: FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

lluvia - Sin actividad en obra

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
Se suspenden las actividades en el día hoy las intensas lluvias caídas en el sitio de Obras		

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Arq. Celso M. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Ignacio Marecos

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

1.418

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000002

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 06/06/2020 al 12/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra –	No se registra actividad en el sitio de Obras Se ruego dar inicio a las obras

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 08/06/2020

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

lluvia – Sin actividad en obra –

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
En fecha 08 de junio no se realizaron actividades, por las lluvias caídas en el día		

INCIDENCIAS

DÍA: 06/06/2020

TRABAJOS SUSPENDIDOS: Efecto de lluvia – Sin actividad

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso J. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Ignacio Marcos
Reg. Prof. N° 1.418
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000003

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 13/06/2020 al 19/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Actividades realizadas:	– Replanteo
-Replanteo y marcación de la obra-	– Marcación de obras

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Ignacio Marecos
Reg. Prof. N° 1418
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000004

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 22/06/2020 al 26/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Trabajos realizados: - Excavación y carga de pilotes 1-4: 30 cms.	- Se realizó la excavación de los pilotines y la carga de la misma - En fecha 24 sin actividades

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 24/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: FIN:	En fecha 24 de junio se suspenden las actividades de colados de pilotines por las lluvias caídas en el día.		
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Lluvia - Sin actividad en obra.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Ignacio Marecos
Reg. Prof. N° 1.418
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000005

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 27/06/2020 al 30/06/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Trabajos realizados:	- Se continuan con la excavación y cargas de pilotes
27/06/2020: excavación y carga de pilotes -	- En la fecha 28 sin actividad
de bolas -	- En fecha 30 sin actividad

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 28/06/2020 – 30/06/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
28/06/2020 - lluvia - Sin actividad		- En fecha 28 de junio se suspendieron las actividades por las fuertes caídas de lluvias en el lugar		
30/06/2020 - lluvia - Sin actividad		- En fecha 30 de junio se suspendieron las actividades por caídas de lluvias en el lugar.		

INCIDENCIAS

DÍA: 29/06/2020	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Efecto de lluvia - Sin actividad			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso M. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. [illegible] Marecos
Reg. Prof. N° 1.416
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN
