RUTA DE LA LECHE - LOTE 1

CRUCE PIONEROS – PARATODO DESDE PROGRESIVA 0+000 HASTA PROGRESIVA 48+400 INCLUIDOS LOS ACCESOS A SANTA CECILIA Y LOLITA

ANEXO Nº 1 - CRONOGRAMA DE GANTT

ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA

Item	Descripción	Unid.	Cant.	P. Unit.	P. Total	% Incid.
	SUBA PROVISIONAL					
1.0	**OBRAS PROVISIONALES**					
1.0.1	Suma Provisional	gl	1.00	31.020.000.000	31.020.000.000	1,3%
	ITEMS NUEVOS CONVENIO MODIFICATORIO Nº1					
2	**PAVIMENTOS**					
	TRAMO PRINCIPAL					
2.0.a1	Sub-base granular CBR ≥ 80 %	m3	115.960,30	410.000	48.123.352.646	12,3%
2.10.a1	Subrasante mejorada con Cal CBR ≥ 20 % e=0,20	m3	194.544,77	130.000	25.304.205.807	6,6%
	CALZADA INTERSECCIONES					
2.0.a2	Sub-base granular CBR ≥ 80 %	m3	5.735,40	410.000	2.351.703.400	0,6%
2.10.a2	Subrasante mejorada con Cal CBR ≥ 20 % e=0,20	m3	9.606,34	130.000	1.248.821.267	0,3%
	ACCESOS. CALZADA					
2.0.a3	Sub-base granular CBR ≥ 80 %	m3	23.293,49	410.000	9.549.330,11	2,4%
2.10.a3	Subrasante mejorada con Cal CBR ≥ 20 % e=0,30	m3	47.771,21	130.000	6.209.257,553	1,6%
	BOULEVARD. CALZADA					
2.0.a4	Sub-base granular CBR ≥ 80 %	m3	3.137,50	410.000	1.286.314.753	0,3%
2.10.a4	Subrasante mejorada con Cal CBR ≥ 20 % e=0,20	m3	6.475,00	130.000	842.080.807	0,2%
3	**DESAGUES Y DRENAJES**					
3.1	**ALCANTARILLAS CELULARES**					
3.1.8	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,2x1,2 m	ml	25,42	2.801.352	39.636.355	1,0%
3.1.9	Alcantarilla Celular Doble de H°A° ml2,0x1,2 m	ml	27,73	8.387.973	216.478.108	1,1%
3.1.10	Alcantarilla Celular Doble de H°A° ml1,2x1,2 m	ml	124,02	9.144.268	1.235.314.797	1,3%
3.1.11	Alcantarilla Celular Cuádruple de H°A° ml1,20x1,20 m	ml	55,12	11.344.875	625.329.510	1,2%
3.1.12	Alcantarilla Celular Cuádruple de H°A° ml1,2x1,2 m	ml	249,38	9.362.208	2.488.947.329	1,5%
3.1.13	Alcantarilla Celular Sextuple de H°A° ml1,2x1,2 m	ml	216,30	11.852.798	2.564.775.078	1,7%
6	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					
6.1	**ALAMBRADO**					
6.1.3	Remoción, traslado y reconstrucción de alambrados	ml	106.065,00	21.000	2.227.365.000	1,3%
	PASAFAUNAS					
6.10	Pasafaunas (Incluye Obras de Encauzamiento y Ejecución de Alcans	un	2,00	277.234.820	554.469.640	1,1%
				Total	**247.446.446.433**	**100,00%**

Item	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Ago-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Ago-23	Sep-23	Oct-23
1.0																																							
1.0.1	1,1%	1,1%	0,9%	1,1%	1,1%	0,7%	1,0%	2,1%	2,3%	1,9%	2,1%	1,1%	2,2%	2,9%	2,1%	3,0%	4,4%	4,0%	4,0%	4,0%	3,1%	3,4%	3,3%	3,0%	3,1%	1,9%	2,3%	2,4%	1,9%	3,2%	3,4%	4,9%	4,1%	3,4%	3,0%	2,1%	2,1%	2,1%	1,9%
2	1,1%	2,3%	3,0%	4,0%	5,0%	4,3%	8,0%	10,0%	14,1%	14,2%	21,8%	22,8%	31,1%	37,0%	39,1%	50,6%	54,5%	62,1%	67,2%	72,7%	75,8%	79,1%	82,4%	85,4%	88,5%	90,4%	92,7%	95,1%	97,0%	100,2%	103,6%	108,5%	112,6%	116,0%	119,0%	121,1%	123,2%	125,3%	127,2%
	0,704.365.362	2.675.118.392	2.195.046.508	3.096.822.308	3.812.439.381	2.622.930.871	5.505.409.038	6.166.116.605	14.668.016.663	13.816.924.262	16.367.942.625	3.571.701.638	7.149.867.868	7.938.126.712	7.724.645.628	7.384.520.860	1.602.751.871	15.546.176.522	19.532.348.279	18.362.364.708	17.166.979.423	15.396.424.050	17.979.613.234	18.371.247.573	16.220.641.665	20.148.914.248	21.766.116.165	22.230.155.307	20.179.469.420	11.436.176.775	9.866.746.367	11.374.522.978	8.018.916.732	20.110.076.623					
	0,704.365.362	3.379.483.754	10.671.530.262	14.588.267.878	18.400.707.259	21.023.638.130	27.567.055.168	33.733.171.773	48.401.188.436	62.218.112.698	78.585.055.323	82.156.756.961	89.306.624.829	97.244.751.541	105.969.397.169	113.353.918.029	114.956.670.900	130.502.847.422	150.035.195.701	168.397.560.409	185.564.539.832	200.961.963.882	218.941.577.116	237.312.824.689	253.533.466.354	273.681.380.602	295.447.496.767	317.677.652.074	337.857.121.494	349.293.298.269	359.160.044.636	370.534.567.614	378.553.484.346	398.663.560.969					

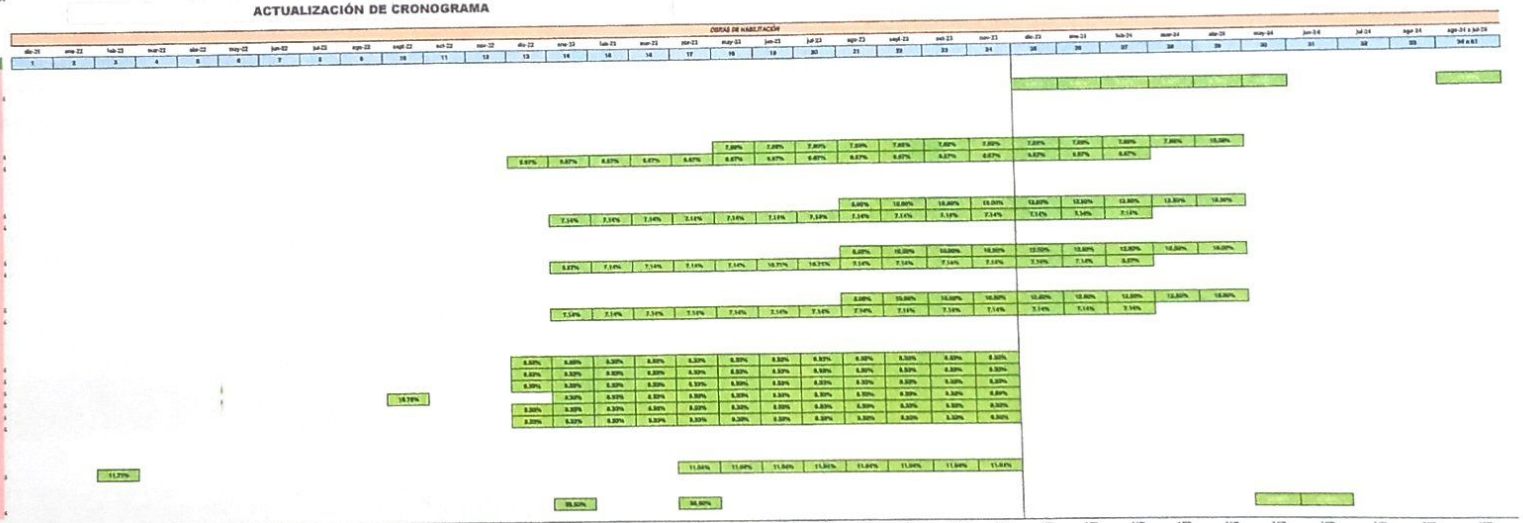

SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) A EMPRESAS CONSTRUCTORAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL - OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) - LOTE 1 – 64,76 km - Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400 incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita -

Curva Físico - Financiera - Actualizada

Obras de Habilitación

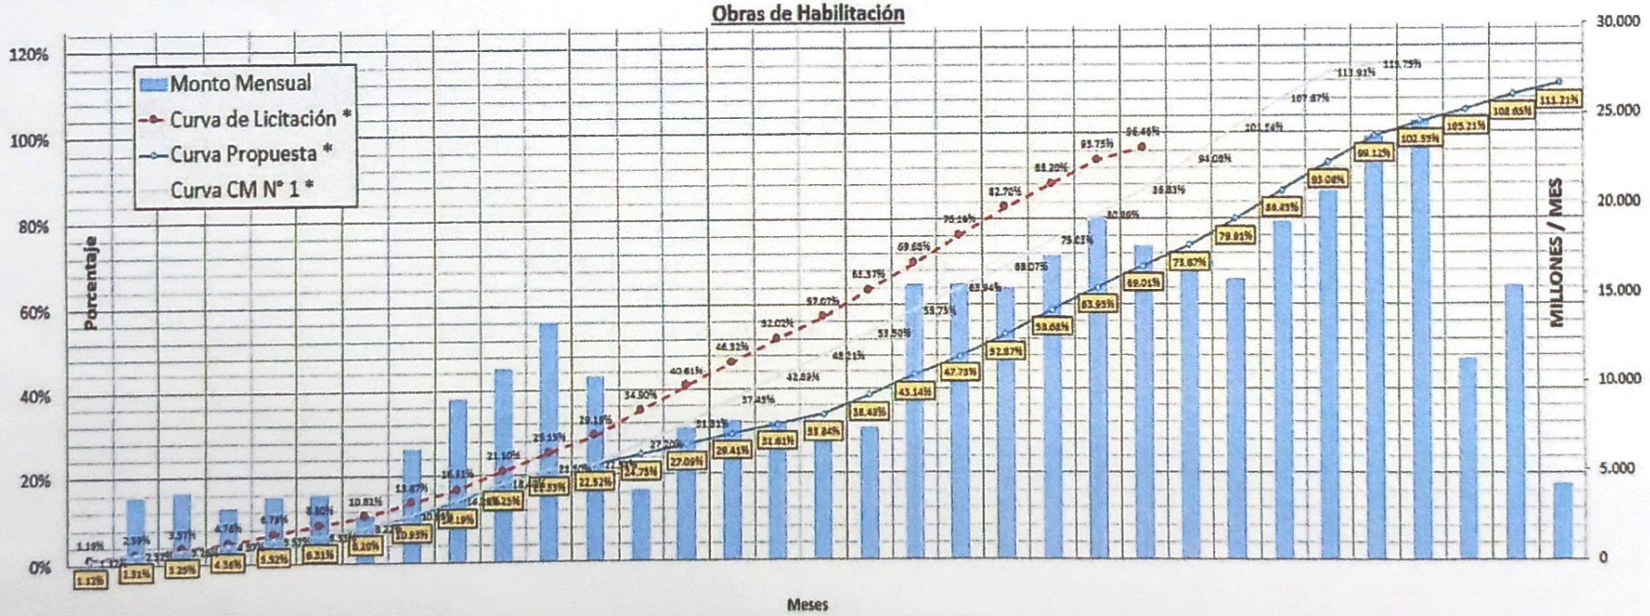

MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	32
Avance Licitatorio Acumulado *	1,18%	2,39%	3,57%	4,76%	6,78%	8,80%	10,82%	13,87%	16,81%	21,10%	25,15%	29,15%	34,50%	40,61%	46,32%	52,02%	57,07%	63,37%	69,68%	76,19%	82,70%	88,20%	93,75%	96,46%									
Avance CM N°1 Acumulado *	1,12%	2,32%	3,26%	4,37%	5,53%	6,33%	8,22%	10,95%	14,29%	18,40%	21,50%	22,54%	27,20%	31,81%	37,45%	42,89%	48,21%	53,50%	58,73%	63,94%	69,07%	75,03%	80,89%	86,83%	94,08%	101,34%	107,87%	113,91%	115,75%				
Avance Propuesto Acumulado *	1,12%	2,31%	3,25%	4,36%	5,52%	6,31%	8,20%	10,93%	14,19%	18,23%	21,33%	22,52%	24,75%	27,09%	29,41%	31,61%	33,84%	38,45%	43,14%	47,73%	52,87%	58,66%	63,95%	69,01%	73,87%	79,91%	86,43%	93,08%	99,12%	102,55%	105,21%	108,65%	111,21%

**Porcentajes respecto a trabajos correspondientes a Las Obras de Habilitación*
