Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI Nº 720 /2020

A: **Abog. Yenny Carolina Ovelar de Torres.** Coordinadora
Coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones.

DE: **Arq. Patricia Josefina estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

FECHA: 22/ Junio / 2020

ASUNTO: Solicitud de Prorrogas por Inclemencias **Climáticas– Contrato Nº 10/2019 - Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí.** CVE "Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas – Plurianual - ID N° 356.937.

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en consideración presenta la solicitud de **Prorrogas por Inclemencias Climáticas** correspondiente al **Contrato Nº 10/2019, del Periodo 5 - Mes de Mayo / 2020,** con los siguientes: **Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí,** según el Informe de la Fiscalizacion C.P.I UEPP/ en adjunto con los Deptos. y obras adjudicadas a la "Empresa **Constructora Sociedad Constructora Chaco S.A.";** en el marco de la **CVE 01/2019** de referencia: **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS"** - PLURIANUAL – **ID N° 356937.** Conforme al siguiente:

CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, en el plazo de ejecución de las obras correspondientes al Contrato Nº 10/2019, a cargo de la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.** Periodo N° 5 - MAYO

1 - CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÀTICAS				
Nº	**MES**	**CANT. DE LLUVIAS - DINAC**	**INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras**	**DÍAS ACUMULADOS**
5	MAYO /2020	10	10	10
			TOTAL	**10**

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
UEPP - MEC
Nº Exp. 3975
Recibido por: FERNANDO
Fecha: 22 07 2020 11:00

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea.Abril.21.5.20\Tarea.JUNIO.2020\EDI.Fiscal.Grupo-LLuvia-Febrero.2020\5 Mayo-EDI-MEMO.08-20.uoc.-luvia.02 .docx

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**

CGC 23.1 Prórroga de los Plazos

- Fuerza Mayor.

- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: según los Certificados de uso de Tiempo presentado por el fiscal en las Certificaciones de obra, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obra correspondiente y de sus incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe con imágenes del estado debido a las inclemencias climáticas.

Condiciones Generales del Contrato (CGC), apartado C. Plazos

25. Inclemencias climáticas

25.1 En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

25.2 Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

25.3 Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Corresponde remitir la contabilización de la suspensión por lluvias e incidencias del mes de Mayo de 2020, **APROBADA** por la **fiscalización** de la **CPI UEPP**, por Informe a la CPI/UEPP Nº /2020/ correspondiente a los Lotes, del Contrato N° 10/19. Atendiendo a lo solicitado y la documentación entregada, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, recomienda la **aprobación de la prórroga del plazo** de ejecución de obras por **10 (diez) días calendarios** por inclemencias climáticas del Contrato N° 10/2019 – correspondiente a los Lote Nº 2, N°4, N° 5, N° 6 según los Dptos. y dar continuidad a los trámites pertinentes.

Atentamente. **Arq. Patricia Josefina estela Sánchez Flores de Ávila.** Coord. UEPP MEC

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Ávila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2
www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI – FEDI - Nº 17 /2020

A: **Arq. Patricia Josefina estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora Coordinación de Proyectos de Infraestructura

DE: **Arq. Catherine Larrieur,** FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Arq. Guillermo Godoy, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Arq. Graciela Acosta, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Arq. Catalina Rojas Pukall, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Ing. Jorge Augusto Paganetti, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP

FECHA: 22 / Junio /2020

ASUNTO: . Solicitud de Prorrogas por Inclemencias **Climáticas – Contrato Nº 10/2019 – Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí** ,CVE "Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con técnicas Constructivas mixtas – Plurianual - ID N° 356. 937..

Los Fiscales asignados por la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en consideración presentan, la solicitud de Prorrogas por Inclemencias **Climáticas– Contrato Nº 10/2019 – Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí,** del **PERIODO N° 5 Mayo /20,** en el marco de la CVE N° 01/2019 de referencia: **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL – ID N° 356937,** adjudicada a la Empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**

Conforme al siguiente Cuadro de Resumen

UoBo

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea.Abril.21.Sáb\Tarea.Junio.2020\EDI.Fiscal.Grupo-LLuvia-14.Juli.20\5 Mayo EDI MEMO 08-20.uyo.lluvia02.docx

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, en el plazo de ejecución de las obras correspondientes al Contrato Nº 10/2019 - Lotes N° 2, N° 4 Nº 5, N° 6 , del **Periodo N° 5. Mayo**

1 - CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÀTICAS				
Nº	**MES**	**CANT. DE LLUVIAS - DINAC**	**INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras**	**DÍAS ACUMULADOS**
5	MAYO /2020	10	10	10
			TOTAL	**10**

Se informa que las Esc. Básica de los Dptos. de Guaira y Caazapá, a la fecha, no cuenta con la Orden de Inicio N° 2. (de las Obras, respecto a la contabilización de los días de lluvias acontecidas)

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**

CGC 23.1 Prórroga de los Plazos

- Fuerza Mayor.

- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: según los Certificados de uso de Tiempo presentado por el fiscal en las Certificaciones de obra, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obra correspondiente y de sus incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe con imágenes del estado debido a las inclemencias climáticas.

Condiciones Generales del Contrato (CGC), apartado C. Plazos

25. Inclemencias climáticas

25.1 En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

25.2 Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

25.3 Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar

Fiscal de Obras MEC
Rolando Pusineri
UEPEP

Guillermo Godoy
ARQUITECTO
Reg. 3.074

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

Catalina Delamieux
ARQUITECTA
Reg. 3.074

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea.Abril.21.5.20\Tarea.JUNIO.2020\EDI.Fiscal.Grupo-I-Lluvias\Jun.20\5 Mayo EDI.MEMO 08-20.uoc.lluvia.02 .docx

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Corresponde remitir la contabilización de la suspensión por lluvias e incidencias del mes de **Mayo de 2020**, habiendo verificado los documentos dan por **APROBADO** por la **Fiscalización** de la **CPI UEPP**, por Informe a la CPI/UEPP Nº /2020/ según los Lotes correspondientes al Contrato N° 10/19 , por un total de **10 (diez) días** calendarios.

Corresponde a los siguientes Lotes del Contrato N° 10/19:

a. Lotes: N° 2 – N° 4 –N° 5 – N° 6 por Departamentos
   a. L2 | GUAIRÁ – CAAZAPA
   b. L4 | CENTRAL
   c. L5 | ALTO PARANA
   d. L6 | PARAGUARI – ASUNCIÓN
b. Contratista SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A
c. Fiscalización: CPI - UEPP – MEC
d. **INSTITUCIONES EDUCATIVAS:**

	LOTE 2
1	Escuela Básica N° 60 "Fray Luis Bolaños"-Vizcaíno Kue Depto. Caazapá
2	Escuela Básica N° 52 "Félix Pérez Cardozo"- Depto. Guaira
	LOTE N° 4
3	C.R.E. Saturio Ríos San Lorenzo. San Antonio- Dpto. Central
4	Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro –Ñemby. Rincón.D.Central
5	Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada. Lambaré. Palomar. Depto. Central
	LOTE N° 5
6	Esc. Bas. N° 1295 Virgen Del Rosario. Hernandarias Área 6- Alto Paraná
7	Esc. Bas. N° 1770 Mcal. Francisco S. López. Santa Rita. Unión- Alto Paraná
	LOTE N° 6
8	Esc. Bas. N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive. Pai Gómez. Depto. Paraguarí
	LOTE N° 6

Rolino Rojas Pukoli
Jefe de Obras
UEPP - MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Ara. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Catherine Lerrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea.Abril.21.5.20\Tarea.JUNIO.2020\EDI.Fiscal.Grupo-Lluvia 14.Juli.20\5 Mayo EDI MEMO 08-20.uoc.lluvia.02 docx

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2
www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REFERENTE CVE N° 01/2019 **Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas - Plurianual -MEC**
ID **356937**
EMPRESA **Sociedad Constructora Chaco S.A.**
CONTRATO **10/2019**
MES/PERIODO **MAYO 2020**
PRÓRROGA OTORGADA **10 DÍAS**

CONTRATO 10/2019

CÁLCULO DE PRÓRROGA POR LLUVIAS E INCIDENCIAS

MES	LOTE N° 2 Dpto. Caazapá y Guairá				LOTE N° 4 Dpto. Central						LOTE N° 5 Dpto. Alto Paraná				LOTE N° 6 Dpto. Paraguarí - Asunción						TOTAL DE DÍAS OTORGADOS POR PERIODO
	Esc. Bás. N° 60 "Fray Luis Bolaños"-Dpto. Caazapá - Viskaino Kue		Esc. Bás. N° 52 "Félix Pérez Cardozo"-Dpto. Guairá - Centro		Centro Regional de Educación "Saturio Ríos"- San Lorenzo		Esc. Bás. N° 1463 "Divino Maestro"-Nemby		Esc. Bás. N° 751 "Juan Pedro Escalada"- Lambaré		Esc. Bás. N° 1295 "Virgen del Rosario"- Hernandarias		Esc. Bás. N° 1770 " Mcal. Francisco S. López-Santa Rita		Esc. Bás. N° 77 "Alúm de Vivé"- Paraguarí		Esc. Bás. N° 17 "Rca. del Perú"- Asunción		Esc. Bás. N° 142 "María Felicidad González"- Asunción		
	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	
MAYO	7	S/I	6	S/I	5	4	5	4	5	4	7	3	7	3	4	3	5	4	5	4	
Cantidad Total de días de prórroga	7		6		9		9		9		10		10		7		9		9		**10**

INFORME: En las:
Esc. Bás. N° 60 "Fray Luis Bolaños" Dpto. Caazapá - Viskaino Kue LOTE N° 2
Esc. Bás. N° 52 "Féliz Pérez Cardozo" Dpto. Guairá - Centro LOTE N° 2
Se encuentran en trámite de ejecución de la Orden de Servicio N° 2 y a la Fecha no se considera la contabilización de las prórrogas por lluvias

Arq. Catalina Rojas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Catherine Larrieu
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

9	Esc. Bas. N° 17 Republica del Perú. Asunción. Pte. Carlos Antonio López
10	Esc. Bas. N° 142 María Felicidad González. Asunción. Terminal

Se adjuntan copias de:

- Informe Fiscal Nº /20 CPI UEPP, y Documentos
- Registro de Precipitación Diaria – DINAC
- Cuadro de Incidencias relacionadas a las condiciones climáticas – Mayo /2020
- Libro de obras
- Registro fotográfico
-

Nos despedimos atentamente, no sin antes desearle una maravillosa jornada.

Arq. Catherine Larrieur,
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Arq. Catalina Rojas Pukall
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Arq. Guillermo Godoy
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Arq. Graciela Acosta
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Ing. Jorge Augusto Paganetti
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea.Abril.21.5.20\Tarea.JUNIO.2020\EDI.Fiscal.Grupo-LLuvia-14.Juli.20\5 Mayo EDI MEMO 08-20.uoc.lluvia.02 .docx

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Asunción, 3 de junio de 2020

Señora:
Arq. Patricia Josefina Sánchez de Ávila
Coordinadora
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: "Contratación Vía Excepción Nº 01/2019: Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas constructivas alternativas mixtas. Plurianual. ID Nº 356937. Contrato Nº 10/2019: Lote 2: Guairá, Caazapá. Lote Nº 4: Central. Lote Nº 5: Alto Paraná. Lote Nº 6: Capital, Paraguarí.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en relación a los cálculos de afectación por días de lluvia, del mes de **Mayo de 2020** de nuestro Lote. Conforme a las nuevas disposiciones, hemos realizado los ajustes y conteo de las incidencias climáticas, conforme al Libro de Obras e Informe de Registros de lluvia de la DINAC para el siguiente periodo.

LOTE 2: GUAIRA – CAAZAPA

Caazapá

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Mayo	**Certificado N°03**	**7 dias**	**S/I**	**7 días**

Guaira

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Mayo	**Certificado N°03**	**6 dias**	**S/I**	**6 días**

LOTE 4: CENTRAL

Central

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Mayo	**Certificado N°03**	**5 días**	**4 días**	**9 días**

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 1922
Recibido por: Victor

DIA	MES	AÑO	HORA
4	06	2020	1331

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

Dirección: Paraí Nro. 1013 casi Av. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550268 - Sitio web: www.scc.com.py



SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

LOTE 5: ALTO PARANA

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Mayo de 2020	Certificado Nº 3	**7 días**	**3 días**	**10 días**

LOTE 6: CAPITAL, PARAGUARI

CAPITAL

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Mayo de 2020	Certificado Nº 3	**5 días**	**4 días**	**9 días**

PARAGUARI

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Mayo de 2020	Certificado Nº 3	**4 días**	**3 días**	**7 días**

Sin nada más que agregar, me despido cordialmente.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

Dirección: Pariri Nro. 1013 casi Av. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550283 - **Sitio web:** www.scc.com.py



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					33,5							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					0,8							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					4,9							
12					2,5							
13					T							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					T							
21					34,2							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					76							
Máx. 24h					34,2							
Día Máx.					21							

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Luis M. Colmo C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
PARAGUARÍ	25° 37' 36,51"	57° 08' 44,99"	116 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					6,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					0,0							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					48,4							
12					6,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					39,0							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					99							
Máx. 24h					48,4							
Día Máx.					11							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CAAZAPÁ	26° 10' 31,70"	56° 21' 16,92"	142 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					6,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					6,8							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					27,6							
12					26,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					40,0							
22					3,6							
23					2,9							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					113							
Máx. 24h					40							
Día Máx.					21							

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Luis M. Bulno C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,5							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					34,0							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					6,5							
12					26,0							
13					1,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					20,4							
22					11,8							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					8,2							
Total					108							
Máx.24h					34							
Día Máx.					5							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					10,8							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					3,6							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					48,0							
12					14,6							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					153,1							
22					1,5							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					232							
Máx,24h					153,1							
Día Máx.					21							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro C.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Sulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

IMÁGENES - ESTADO DE LAS OBRAS DEBIDO A INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Resumen General de Instituciones - Depto. N° X - Alto Parana

Distrito de Santa Rita - Esc. Bás. N° 1770 Mcal Francisco Solano López

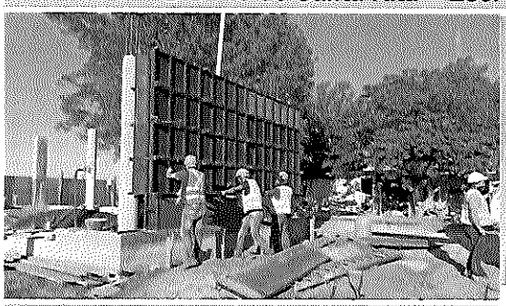
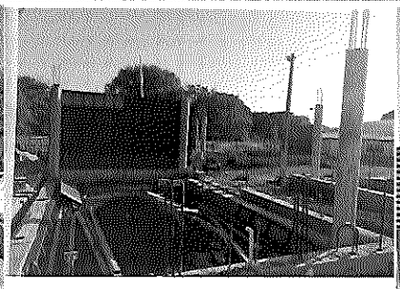
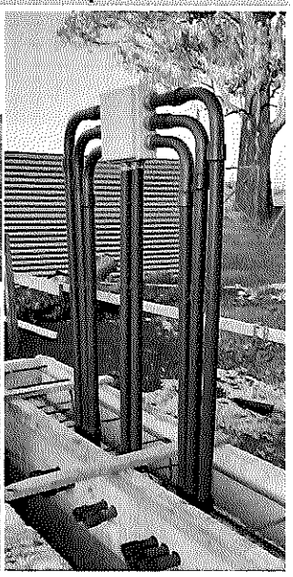
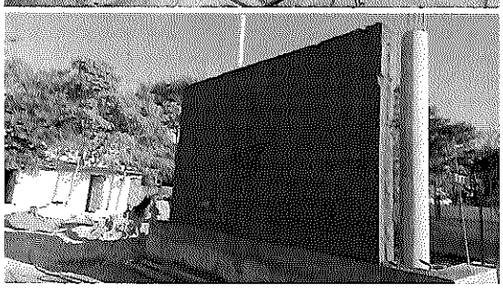

Distrito de Hernandarias - Escuela Básica N° 1295 "Virgen del Rosario"

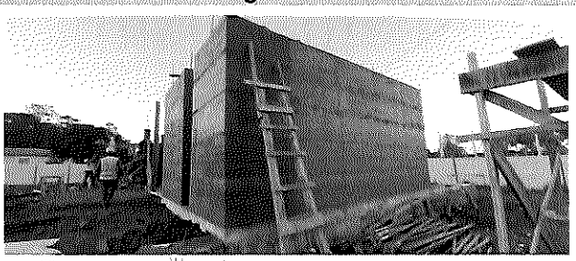
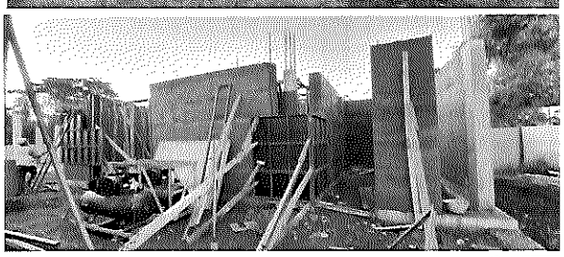
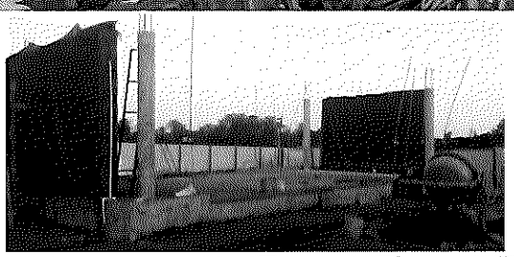
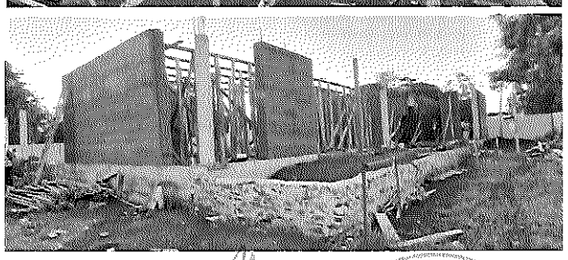

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000072

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 04-05-2020 - Lunes

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
* El 01-05 sin actividad por falta de movilidad general	Seguimiento general.
* El 02-05 sin actividad por lluvia	
* El 03-05 sin actividad por exceso de Humedad	
* Continuan los trabajos - Muro Tapial	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Sábado 02-05-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 07:00			
	FIN: 17:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Muros de Tapial				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: 01/05/2020 - Falta de Movilidad general por Cuarentena.
02/05/2020 Lluvia.
03/05/2020 exceso de Humedad, dificultad para trabajar.

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL C.I.U. 30.000 Ejemplares (Res. 415 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 671 530 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000080

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 12-05-2020 - Martes

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Martes 12-05-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 06:00			
	FIN: 17:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Muros de Tapial				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES: OBS: Lluvia

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Jorge A. Paganetti
Ingeniero Civil
Reg. Prof. 07-3170.115

Ing. Olga Camacho

IMPRENTA CONTINENTAL - Tel. N°: 1.0[illegible] - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-[illegible] - 021 3[illegible] - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000088

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 21-05-2020 - Jueves

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Jueves 21-05-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 06:00			
	FIN: 17:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Muros de Tapial Encofrado de losa			✓	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Jorge A. Paganetti
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 8.170.115

Ing. Olga Sandoval

IMPRENTA CONTINENTAL - C.I.U. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - TEL: 021 871 [illegible] - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000089

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 22-05-2020 - Viernes

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Viernes 22-05-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 00:00			
	FIN: 18:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Muros Tapial Encofrado de losa			✓	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Jorge A. Pelganetti
Ingeniero Civil
Tel. 3.170.115

Ing. Olga Panatria

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N° 1.039 - Sanjuan N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 0[illegible] 630 / 0[illegible] 965 920 102 Tel. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000090

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 93-05-9090 - Sábado

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por exceso de humedad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Muros Tapial Encofrado de losa			✓	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Arq. Olga Sanabria

IMPRENTA CONTINENTAL - C.U.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel. 021 371 [illegible] / 0981 [illegible] - 02 Tal. 60x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000090

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN:	CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR:	Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 01/05/2020 VIERNES

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad (lluvia)	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Arq. Olga Sanabria

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 377 [illegible] / 0981 [illegible]920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000091

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 02 / 05 / 2020 SÁBADO

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin Actividad	Sin actividad.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: lluvia.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES: Sin actividad por lluvias.

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Jorge A. Paganetti
Ingeniero Civil
Mat. Nº 170.115

Ang. Olga Sandoval

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.639 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 [illegible] 30 / 0981 665 930 / 00 Tel. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000092

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 04/05/2020 LUNES

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
-Continúan los trabajos: . Muros de tapial	* Seguimiento al cubre de muro de tapial.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.M.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS — N° 0000091

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 142 María Felicidad González
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 01-05-2020 - Lunes

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
*01-05 Sin actividad por falta de movilidad general *02-05 - Sin actividad por lluvia *03-05 sin actividad por exceso de humedad * Continuán los trabajos - Muros Taqiales - Encofrado y armadura de losa 9da Etapa - Canaleta de desagüe cloacal	Seguimiento.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Sábado 09-05-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 07:00			
	FIN: 12:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: ~~Muros~~ Muros Taqiral				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:
01/05/2020 Falta de Movilidad general por cuarentena
02/05/2020. Lluvia
03/05/2020 Exceso de Humedad. dificultad para trabajar.

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000105

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 142 María Felicidad González
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 21-05-2020 - Jueves

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Jueves 21-05-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 06:00			
	FIN: 17:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Contrapisos y pisos			✓	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

Jorge A. Paganetti
Ingeniero Civil
Reg. Prof. DU 3.170.115
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Mayo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000106

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 142 María Felicidad González
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 22-05-2020 - Viernes

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Viernes 22-05-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 06:00			
	FIN: 18:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Contrapisos y pisos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

Jorge A. Pagnanelli
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Mayo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000083

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 15/05/2020 VIERNES

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad (Feriado)	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000071

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 01/05/2020 VIERNES

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad (Lluvia)	Sin Actividad.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: Lluvia.

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR C.I. 3.170.115

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreno - Tel.: 021 371 630 / 0981 685 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000072

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 02/05/2020 SÁBADO

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Compactación mecánica.	
- Sin actividad (lluvia)	
	Sin actividad.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES: lluvia.

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

Jorge A. Paganetti
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000080

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 12/05/2020 MARTES

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 12/05/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 07:00 hs			
	FIN: 17:00 hs.			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

Jorge R. Paganetti
Jefe Dpto. Cal.
Dpto. Cal. 0170.113
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) C. Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000088

INSTITUCION EDUCATIVA:	Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN:	CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR:	Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 21/05/2020 Jueves

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Continuan el trabajo MUROS de Tapial	
- Sin actividad (Lluvia)	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 21/05/2020 - Jueves.		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 13:00hs			
	FIN: 17:00hs			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			✓	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (1S Proyectadas) - Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665.920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000089

INSTITUCION EDUCATIVA:	Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN:	CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR:	Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 22 | 05 | 2020 Viernes

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad (Lluvias)	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreno
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000090

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 23/05/2020 Sabado - 24/05/2020 Domingo

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad por exceso de humedad.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000051

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 01/05/2020 – 02/05/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
– Sin actividad	
por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: lluvia		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — Catherine Larrieur ARQUITECTA — FISCALIZADOR — Guillermo Godoy ARQUITECTO — SUPERVISIÓN

Arq. Olga Sanabria

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 611 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 000100100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000061

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 22 - MAYO - 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA DESDE NOCHE DE JUEVES	
21 MAYO Y TODO EL DÍA DEL	
VIERNES 22 MAYO.	
TRABAJOS SUSPENDIDOS POR LLUVIA	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: VIERNES 22 MAYO 2022		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: - CARGA TAPIAL: ESQUINA 3 BLOQUE 1 - NIVELACION RELLENO ENTRE VIGAS.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 074

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

Arq. Olga Sanabria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000062

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 23 - MAYO - 2020.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
trabajos suspendidos por lluvia.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Catherine Larrieux
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Arq. Olga Sanabria

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371/680 - 0981 665 620 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL - IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0106

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BÁSICA N°17 REPÚBLICA DEL PERÚ
EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI - UEPP - MEC

DIA: 22/05/2020 Viernes

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Dia de lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: - Encofrado y cargado viga de tapial				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

Jorge A. Paganetti
Ingeniero Civil
Reg. 8.170.715

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreños
RUC: 479062-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 03 Tal. 50x3 - 0001/00150 - Marzo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000102

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 15 | 05 | 2020 VIERNES

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad - Feriado	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.I.N. N° 1.03[illegible] (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel. [illegible] 1 639 / [illegible] 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Mayo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000099

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 12/05/2020 MARTES

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin Actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel: 021 371 [illegible] - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000107

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 21/05/2020 Jueves.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
-Sin actividad Muros de Tapial por maquinaria descompuesta siendo las 09:25hs.	
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 21/05/2020 Jueves		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 13:00 hs			
	FIN: 17:00 hs			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL C.H.I. N° [illegible] - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-[illegible] 50x3 - 0101/00200 - Mayo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000108

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 22 | 05 | 2020 VIERNES

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad (lluvia)	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 22 | 05 | 2020 viernes		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 07:00 hs			
	FIN: 17:00 hs.			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL C.H.I. N° 1039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 [illegible] 101/00200 - Mayo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000109

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 23/05/2020 Sabado - 24/05/2020 Domingo

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad por exceso de humedad.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Arq. Olga Zanabria

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N° 1.099 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) - Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: [illegible] - 0101/00200 - Mayo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000086

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Sabado 09 de Mayo de 2020

CONTRATISTA	**FISCAL:**
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
- Prosiguen trabajo de tapial	
- Prosiguen relleno y compactación	
- Prosiguen trabajo de encofrado	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Domingo 03		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
La empresa no trabaja los domingos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	**MATERIALES RECHAZADOS**
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. N° 10.395
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Catalina Rojas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP - MEC
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Gráfica Bien Hecho - Avda. Blás Garay Km. 6 B° San Isidro - Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000087

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Lunes 04 de Mayo de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Se Suspenden actividades por intensa lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	**MATERIALES RECHAZADOS**
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Catalina Rojas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

Juan C. Godoy Arnoi
Arquitecto
Pat. Prof. N° 10.395

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

Gráfica Bien Hecho - Avda. Blás Garay Km. 6 B° San Isidro - Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000090

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Jueves 7 de Mayo de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
- Iniciamos Carga de	
Los esquineros en Los	
Muros tapial	
- Siguen trabajo de	
relleno	
- Siguen trabajo de	
encofrado	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	**MATERIALES RECHAZADOS**
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. N° 10.395
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Catalina Rojas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP - MEC
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Gráfica Bien Hecho - Avda. Blás Garay Km. 6 B° San Isidro - Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este
