CTC | CONSORCIO
CONTRATISTA

CONSORCIO CTC

CONTRATO S.G. MINISTRO 19/2020; LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU-14,9KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA. ID 371819

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Motenondeha
Ministerio
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CURVA DE AVANCE DE OBRA

FECHA DE ORDEN DE INICIO = 22/04/2020

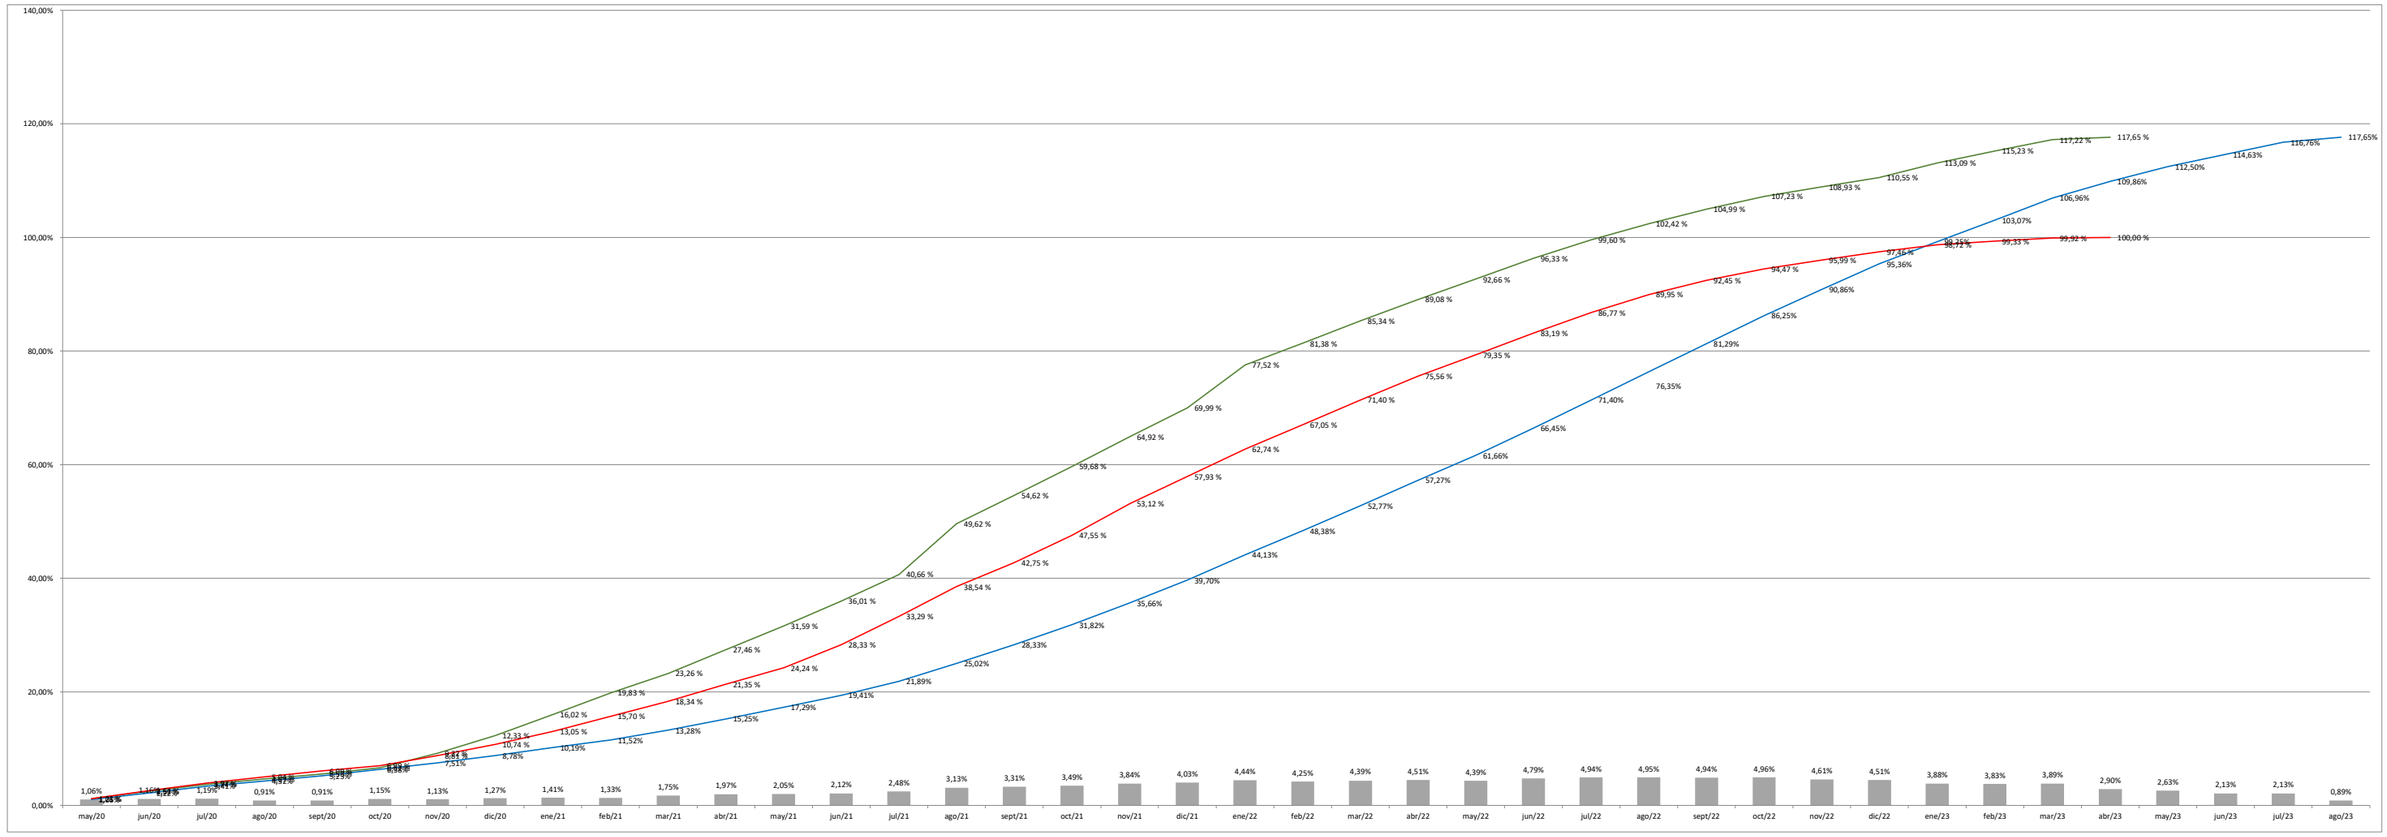

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	may/20	jun/20	jul/20	ago/20	sept/20	oct/20	nov/20	dic/20	ene/21	feb/21	mar/21	abr/21	may/21	jun/21	jul/21	ago/21	sept/21	oct/21	nov/21	dic/21	ene/22	feb/22	mar/22	abr/22	may/22	jun/22	jul/22	ago/22	sept/22	oct/22	nov/22	dic/22	ene/23	feb/23	mar/23	abr/23	may/23	jun/23	jul/23	ago/23
Acumulado C.M. Nro 2	1,06%	2,22%	3,41%	4,32%	5,23%	6,38%	7,51%	8,78%	10,19%	11,52%	13,28%	15,25%	17,29%	19,41%	21,89%	25,02%	28,33%	31,82%	35,66%	39,70%	44,13%	48,38%	52,77%	57,27%	61,66%	66,45%	71,40%	76,35%	81,29%	86,25%	90,86%	95,36%	99,25%	103,07%	106,96%	109,86%	112,50%	114,63%	116,76%	117,65%
Mensual CM Nro 2	1,06%	1,16%	1,19%	0,91%	0,91%	1,15%	1,13%	1,27%	1,41%	1,33%	1,75%	1,97%	2,05%	2,12%	2,48%	3,13%	3,31%	3,49%	3,84%	4,03%	4,44%	4,25%	4,39%	4,51%	4,39%	4,79%	4,94%	4,95%	4,94%	4,96%	4,61%	4,51%	3,88%	3,83%	3,89%	2,90%	2,63%	2,13%	2,13%	0,89%
Acumulado C.M. Nro 1	1,21 %	2,52 %	3,74 %	4,67 %	5,58 %	6,62 %	9,22 %	12,33 %	16,02 %	19,83 %	23,26 %	27,46 %	31,59 %	36,01 %	40,66 %	49,62 %	54,62 %	59,68 %	64,92 %	69,99 %	77,52 %	81,38 %	85,34 %	89,08 %	92,66 %	96,33 %	99,60 %	102,42 %	104,99 %	107,23 %	108,93 %	110,55 %	113,09 %	115,23 %	117,22 %	117,65 %				
Contractual	1,23 %	2,64 %	3,97 %	5,04 %	6,09 %	6,99 %	8,81 %	10,74 %	13,05 %	15,70 %	18,34 %	21,35 %	24,24 %	28,33 %	33,29 %	38,54 %	42,75 %	47,55 %	53,12 %	57,93 %	62,74 %	67,05 %	71,40 %	75,56 %	79,35 %	83,19 %	86,77 %	89,95 %	92,45 %	94,47 %	95,99 %	97,46 %	98,72 %	99,33 %	99,92 %	100,00 %				

CONSORCIO CTC
ING. René GÓMEZ
Superintendente
