UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

NOTA UNCA / MEC Nº 128 /2021 / LOTE 11

Coronel Oviedo, 11 de junio de 2021

C.P. Dalila Zarza
Coordinadora General de la UEPP
Presente:

Ref: **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - ID Nº 360.254"

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **Consorcio Constructor Norteño**, del cual fueron aprobadas **9 DÍAS DE PRÓRROGA,** correspondiente al **Lote 11** presentada en fecha **04 de junio de 2021**, debido a lluvias y sus consecuencias del mes de mayo del corriente.

El pedido fue verificado por la fiscalización, teniendo en cuenta los registros de precipitación diaria del mes de abril emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Se consideraron los días de lluvia a partir del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021.

Se adjuntan a la nota;

- Nota de pedido por parte de la contratista.
- Informe de Fiscalización N° 2- PRO-004
- Registro de lluvias de la DINAC
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de abril 2021 (01/05/2021 al 31/05/2021)
- Informe Técnico N° 02/2021
- Libros de Obras.
- Registro fotográfico de las afectaciones.

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

3385
Recibido
11 06 21 15:30

MES DE MAYO				
LIBRO DE OBRA y PLANILLA DINAC				
DIA	LLUVIAS EN LIBRO	REGISTRO DINAC	TOTAL	APROBADA
1		0		
2	Lluvia	0,7	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
3		0		
4		0		
5		0		
6	Lluvia	1,8	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11	Lluvia	0,6	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
12	Lluvia	0,6	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
13		0		
14	Lluvia	1	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21	Lluvia	1,8	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
22	Lluvia	0,1	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
23		0		
24				
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29	Lluvia	9,6	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
30	Lluvia	1,1	Lluvia Reg. Dinac	APROBADA
31		0		
				9

Días de lluvia según registro de DINAC: 9 días
Días de lluvia según libro de obra: 9 días

Días de Afectación según libro de obra: 0 días
Días en Total Aprobados: **9 días**

Prórrogas de Lluvia		
		Fecha de fin de plazo corrida (solicitada)
Plazo OS2	150 dias	
Fecha de Inicio de Obras - Orden de Serivicio 2	09/04/2021	5/9/2021
Prorroga por lluvia de Abril (solicitada)	8 días	13/09/2021
Prorroga por lluvia de Mayo (solicitada)	9 días	22/09/2021

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Teniendo en cuenta:

- **8 días** de prórroga aprobadas de las 9 solicitadas según **nota MEC N° 015-2021 presentada en fecha 06/05/2021** correspondiente al mes de abril.
- **9 días** de prórroga solicitados según **nota MEC N° 017-2021 presentada en fecha 04/06/2021** correspondiente al mes de mayo.

La fecha de fin de plazos se correría **17 días en total**, siendo la misma el **22 de septiembre de 2021.**

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De Informe
Amambay	XIII	LOTE 11 – Amambay	Del 01-mayo-21 a 31-mayo-21	Nº 02 (Mayo-2021)

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 02

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	Amambay	
Contratista:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO	
Contrato Nº.	36/2020	
Objeto del Contrato:	LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"	
Fiscalizadores:	**UNCA (Convenio Específico c/Univers. Nac. Caaguazú)**	
Fecha de suscripción del Contrato:	11-Diciembre -2020	
Monto Total del Contrato en Gs.:	4.043.367.228 Gs.	**Plazo Contrato(Días):** 150 DIAS
Fecha de Entrega del anticipo:	28- Diciembre -2020	**Monto del anticipo (20%):** Proyecto N° 272: **Gs. 808.673.446**
Fecha de inicio efectivo de las obras:	09-abril -2021 - Orden Servicio 2	**Fecha de vencimiento del plazo según Cronograma Fisco Financiero:** 05/09/2021

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario (01-mayo -2021 al 31-mayo-2021)	**31**
b.	Cantidad de días de lluvias registradas (desde el 01-05-2021 al 31-05-2021), Regist. DINAC y Libros de Obra	**9**
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	**0**
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	*
e.	Días de Ejecución Efectiva al mes del Certificado 2 (cuyo periodo tiene en total: 31 días)	**22**
f.	Condiciones de accesibilidad:	
g.	Otras Observaciones:	

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 8 instituciones del Lote N° 11 - Amambay.

3. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): **150** días
b. Plazo de Ejecución efectiva (días): **36 días (2° Fiscalización)**
   i. Certificado 1: **14 días.**
   ii. Certificado 2: **22 días.**
c. Plazo Restante (días): **-114 días (respecto al plazo de ejecución original)**

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

4. **AVANCE FISICO DE OBRAS: 28.25 %**

   Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 28.25 % = Gs. 495.634.157

Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

5. **MULTAS APLICADAS**
   a. Monto del mes: 0

   b. Multa Acumulada (%): 0 %

6. **VIGENCIA DE GARANTIAS**
   a. Garantía de cobertura de anticipo: VIGENTE.
      i. Cubre hasta 31/Diciembre/2021
      ii. Empresa de Seguros: ***ROYAL SEGUROS S.A.***
   b. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE.
      i. Cubre hasta 31/Diciembre/2021.
      ii. Empresa de Seguros: ***ROYAL SEGUROS S.A.***
   c. Seguro contra accidentes de trabajo: VIGENTE
      i. Cubre hasta 30/Enero/2022.
      ii. Empresa de Seguros: ***ROYAL SEGUROS S.A.***
   d. Seguro contra los riesgos en zona de obras: VIGENTE
      i. Cubre hasta 30/Enero/2022.
      ii. Empresa de Seguros: ***ROYAL SEGUROS S.A.***

Ing. Fredy Gabriel Ramirez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ
Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Informe Técnico N°02/2021

Arq. Verenisse Solaeche – Fiscal de Obras del Lote 11 – Amambay

Fecha: 11 de junio de 2021.

UNCA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: MAYO 2021**
LPN/SBE N° 02/2020 - "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI " ID N° 360.254 – Plurianual.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO.
ID N°	360.254
CONTRATO N°	36/2020
MONTO CONTRATO GS:	Mínimo: Gs. 2.021.683.614 Máximo: Gs. 4.043.367.228
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	11 de diciembre de 2020
LOTE N°	11
PLAZO	Trabajos preliminares y proyecto Ejecutivo: 30 días Plazo de Ejecución de las Obras: 150 días
PROYECTO:	"Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país"
FISCALIZACIÓN	UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú
TOTAL INSTITUCIONES:	8
DEPARTAMENTO:	Amambay
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	La póliza de ejecución del Contrato se encuentra vigente hasta el 31/12/2021.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Verenisse Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

ANTECEDENTES DOCUMENTALES			
ITEM	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**DESCRIPCIÓN**
1	04/06/2021	Nota CONSORCIO CONSTRUCTROR NORTEÑO	Solicitar prórroga de plazo para la ejecución de obras por lluvias, ocurridas en el Periodo N°2 mes de Mayo.
2	-	Informe de Fiscalización N° 2- PRO-004	Certificado de Contabilización y Registro de Plazos correspondiente al mes de MAYO
3	-	Registro de precipitación diaria (mm) 2021	Mes de MAYO – DINAC – Aeródromo de Pedro Juan Caballero.
4	02/05/2021 06/05/2021 11/05/2021 12/05/2021 14/05/2021 21/05/2021 22/05/2021 29/05/2021 30/05/2021	Libro de Obras de las Instituciones: Escuela Básica N° 154 Gral. Eugenio A. Garay. Escuela Básica N° 368 Cnel. José María Argaña. Escuela Básica N° 1302 Braulio Mendoza Areco. Escuela Básica N° 384 Cap. Pedro Juan Caballero. Escuela Básica N° 1960 Juana Maria de Lara Escuela Básica N° 188 Bella Vista Escuela Básica N°106 Mcal. Lopez Escuela Básica N° 1783 Gral. Jose E. Diaz	En los Libros de Obras, de fecha 02, 06, 11, 12, 14, 21, 22, 29 y 30 de mayo de 2021, se visualiza lo siguiente: **"Sin actividad en obra por lluvia".**

ANÁLISIS

La empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO, presentó en tiempo y forma la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas, según se establece en los AGCO, punto **2. Prórroga de los Plazos de Ejecución.** *Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas.*

Sigue mencionando en el punto **11. Inclemencias Climáticas.** *En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.*

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Antes de los quince (15) días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la contratante antes de los quince (15) días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obra

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Verenice Toledo Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

MES DE MAYO 2021										
DIAS	Registro Dinac	1 Escuela Básica N° 154 Gral. Eugenio A. Garay	2 Escuela Básica N° 368 Cnel. José María Argaña	3 Escuela Básica N° 1302 Braulio Mendoza Areco	4 Escuela Básica N° 384 Cap. Pedro Juan Caballero.	5 Escuela Básica N° 1960 Juana María de Lara	6 Escuela Básica N° 188 Bella Vista	7 Escuela Básica N°106 Mcal. Lopez	8 Escuela Básica N° 1783 Gral. Jose E. Diaz	TOTAL DE DÍAS APROBADOS
1										
2	0,7	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
3										
4										
5										
6	1,8	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
7										
8										
9										
10										
11	0,6	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
12	0,6	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
13										
14	1,0	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21	1,8	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
22	0,1	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29	9,6	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
30	1,1	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	1
31										
Total día	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Verónica Tolueche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

En este sentido, se procede a verificar lo solicitado por la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO

Es importante considerar, que esta fiscalización tiene en cuenta el registro de precipitación diaria de la DINAC (AMAMBAY), teniendo en cuenta el radio de influencia de las mismas y considerando que las instituciones se encuentran en los distritos y localidades correspondientes.

Se adjunta las siguientes imágenes:

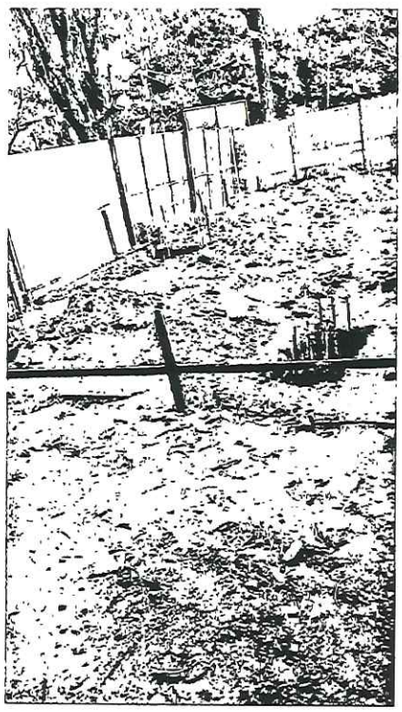

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Verenice Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3.446

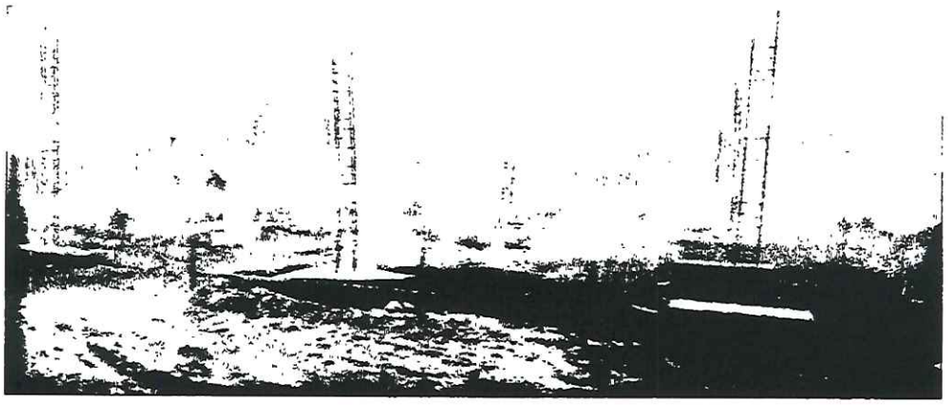

De acuerdo a los puntos expuesto y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, a la luz de lo establecido en el PBC y los AGCO, esta fiscalización considera pertinente la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución por 9 (nueve) días por inclemencias climáticas y sus consecuencias correspondientes al mes de mayo, según el Registro de precipitación diaria emitida por la DINAC y lo señalado en los Libros de Obra.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Verenice Tolueche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Por lo expuesto, se concluye que, en este caso, se aplica a todas las Instituciones Educativas, la prórroga por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de mayo, teniendo en cuenta que las mismas forman parte del Lote N°11 – Amambay, del Contrato N°36/2020, y según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórrogas aprobados por la fiscalización:

PERIODO	REGISTRO DINAC	AFECTACIONES	CANTIDAD DE PRORROGA APROBADAS
MAYO/21	9	0	9
Total de días por inclemencia climática y afectaciones			**09 (nueve) días**

Es mi informe.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Verónica Sotuyo Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

CORRIMIENTO DE PLAZO - EMPRESA: CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO - LICITACIÓN ID: 360.254 - LOTE N° 11 - LPN/SBE N° 02/2020

Lotes de obras adjudicadas	Empresa adjudicada	Orden de Inicio	Adenda N° 01	Adenda N° 02
Lote 11 (Amambay)	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO	9/4/2021	Inclemencias Climáticas / Abril 2021	Inclemencias Climáticas / Mayo 2021
Corrimiento de plazo de ejecución de la obra.		150 Días	8 Días	9 Días
		5/9/2021	13/9/2021	22/9/2021

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Verenice Toledo Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

11/06/2021 14:54

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 3385 **Año:** 2021

Fecha 11/06/2021 **Fecha Ingreso:** 11/06/2021

Fecha Límite: 11/06/2021

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FONACIDE>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >Bienes & Servicios >

Referencia: NOTA N° 0128, UNCA

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Remitir corrección solicitada, Prórroga de Plazos - Constructor Norteño - Anexo una carpeta - UNCA

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Luis Romero	Luis Romero	11/06/2021	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Luis Romero	INFRA.	11/06/2021	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

395
Alfred
14 6 21 9:00

Arqs.

Catherine

Rubén

Ing. Zoilo Benítez Benítez
COORDINADOR INT.
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Recibido 4453
DIA 12 MES 07 AÑO 21 HORA 10:27

MEMO N° 633/2021

A: **Abog. Sixto Milciades Rivas.** *Coordinador.*
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones.

De: **Ing. Zolio Benítez** Coordinador
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP - MEC

Asunto: **Informe técnico - Lluvias MAYO 2021**
Remisión de APROBACIÓN de Solicitud de Prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas. Empresa: Consorcio Constructor Norteño. – Lote N° 11 – Proyecto 272

Fecha: 05 de julio de 2021.

Por la presente, en referencia a la **Contratación N° 36/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación" - ID N° 360.254,** esta Supervisión, ratifica la **"Aprobación de Fiscalización a cargo de UNCA"**, la Prorroga de Plazo por Inclemencias Climáticas correspondientes al mes de mayo de 2021 del **LOTE N° 11 – AMABAY (272),** a cargo de la Empresa **Consorcio Constructor Norteño**. Se detalla a continuación: **CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA y CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS EN BASE A LO APROBADO POR LA FISCALIZACIÓN A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ (UNCA),** cuyo fiscalizador remite aprobada.

1- CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS.

EMPRESA ADJUDICADA Consorcio Constructor Norteño	LOTE 11 – AMAMBAY (272)			CORRIMIENTO DE PLAZO DE EJECICIÓN DE LA OBRA
	Plazo	Orden de servicio	Inicio plazo de ejecución.	
PLAZO A PARTIR DE LA ORDEN DE SERVICIO 2	150 días	08/04/2021	09/04/2021	05 DE SETIEMBRE DEL 2021
Adenda 1 lluvia abril 2021	8 días	08/04/2021	09/04/2021	13 DE SETIEMBRE DEL 2021
Adenda 2 lluvia mayo 2021	9 días	08/04/2021	09/04/2021	22 DE SETIEMBRE DEL 2021

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Se adjuntan copias de:

a- Notas de la Empresa
b- REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) MAYO 2021, de la **Dirección de Meteorología e Hidrología** (Aeródromo de Pedro Juan Caballero) del mes de MAYO.
c- Registros de lluvias en los Libros de Obras del mes de MAYO.

2

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS • Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos • Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Ing. Julio Benítez
Coordinador
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py
