37 (treinta y siete)

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 10 de julio de 2023

INFORME TÉCNICO

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 11/2020. PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTNIEMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE 1: Ruta Nacional N° 10 Las Residentas, Tramos: Rotonda Calle 6000 Yasy Kañy (55 km); Yasy kañy Curuguaty (22km) y Acceso a Curuguaty (2 km). ID 366300.

Contratista: Consorcio Río Ypane

Objeto: Solicitud de Prórroga de plazo.

En los documentos que constituyen el Contrato:

23. Prórroga de los plazos de ejecución.
23.1 Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas.
23.2 De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas".
24.1 Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.
25.4 Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el Contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

Teniendo en cuenta los términos del contrato mencionados precedentemente, se detallan a continuación los eventos ocurridos:

A) CASOS DE FUERZA MAYOR. Cláusula 23.1, 24.1 CGC

A.1) Cierre de Ruta: Dificultan el normal desarrollo de los trabajos por cierre de ruta de los pobladores, que escapan de la posibilidad y control y/o solución de la Contratista. Se adjuntan libros de obra N° 70,71, 72 y extractos periodísticos de la fecha.

Ing. Sergio A. Ovledo
Fiscal de Obras
D.V. - M.O.P.C.

36 (treinta y seis)

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Motooodcha

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

Rio Ypane. Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Teléfono: (021) 202 001 – 492 913 Email: ccc@ccesa.com.py	CONTRATANTE Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 00018 (diez y ocho)	FISCALIZACIÓN Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE N° 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: C000070

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Cierre de Ruta (10) Tramo del Contrato

ANEXOS:

Por la presente comunicamos a la Fiscalización el Cierre de la Ruta N° 10, Tramo del Contrato en la Prog. 47+000 ocacionados por Pobladores Nativos, durante los días Lunes 23/05, Martes 24/05 y Miércoles 25/05, ocacionando dificultad en el desarrollo de las actividades. Muy atentamente.

Dejamos constancias de los hechos, para los efectos que hubiere lugar en derecho.

Firma de la Fiscalización
Fecha: 30/05/22
Aclaración de firma:

Firma del Contratista
Fecha: 26/05/22
Aclaración de firma: Ing. Alfredo Benítez

ORIGINAL / OCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

Ing. Sergio A. Ov
Fiscal de Obra
D.V. - M.O.P.C

35 (treinta y cinco)

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Río Ypané
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE Nº 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: 0000071

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Cierre de Ruta nº10, Tramo del Contrato

ANEXOS:

Por la presente comunicamos a la Fiscalización el cierre de la Ruta nº10, Tramo del Contrato, Rotonda Yasy Cañy, ocacionados por pobladores nativos, durante los días lunes 06/06, martes 07/06 y miércoles 08/06 ocacionando dificultad en el desarrollos de las actividades.

Dejamos constancias de los hechos, para los efectos que hubiere lugar en derecho.

Muy Atte.

Firma de la Fiscalización
Fecha: 30/05/22
Aclaración de firma:

Firma del Contratista
Fecha: 09/06/22
Aclaración de firma: Ing. Alfredo Benitez.

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

Ing. Sergio A. Oviedo
Fiscal de Obras
D.V. - M.O.P.C.

34 (treinta y cuatro)

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Moroaoukha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Kio Ipane Manuel Domínguez Nº 1057 entre LLUU y Brasil Teléfono: (021) 202 001 - 202 913 Email: [illegible]	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 00016 (diez y seis)	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE Nº 1 - TRAMO: "ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)"

LIBRO DE OBRA

Nº: 0000072

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO: Cierre de Ruta Nº 10 - Tramo del Contrato

ANEXOS:

Por la presente comunicamos a la Fiscalización el Cierre de Ruta Nº 10, en el tramo del Contrato, Rotonda Yasy Cañy, ocasionados por pobladores nativos y campesinos, durante los días lunes 04/07, martes 05/07 y miércoles 06/07, ocasionando dificultad en el desarrollo normal de las actividades.

Dejamos constancias de los hechos, para los efectos que hubiere lugar en derecho.

Muy atte.

Firma de la Fiscalización
Fecha: 30/05/22
Aclaración de firma:

Firma del Contratista
Fecha: 07/07/22
Aclaración de firma: Ing. Alfredo Benítez

ORIGINAL FISCALIZACIÓN
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

Ing. Sergio A. Oviedo
Fiscal de Obras
D.V. - M.O.P.C.

33 (treinta y tres)

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

aNEWS

PAX AMAMBAY FUNERARIA

Cierres de ruta en Yasy Cañy por parte de Comunidad Indígena

Distintos cierres de ruta están siendo realizados por la comunidad indígena Tuna Poty en la localidad de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú, asegurado que existe un incumplimiento por parte del INDI de compromisos que este habría asumido con ellos. También reclaman víveres, chapas y colchones al Ministerio de Urbanismo, Hábitat y Vivienda.

Esto último lo reclaman con respecto al mejoramiento de los servicios para la mencionada comunidad y según declaraciones a Última Hora del líder de esta, Arnaldo Vera, en la zona de los cortes de ruta no existen conflictos de tierras, con sus compañeros contando además con títulos de propiedad, aunque señaló que no se ha avanzado en nada en cuanto al proyecto de producción de alimentos y mecanización que se tenía con ellos.

Es en este sentido que el cacique critica al titular del INDI, asegurando que desde marzo ya no están recibiendo asistencia. Agregó que su comunidad es conformada por 50 familias y 150 personas que no contarían con agua potable.

UH50

Comunidad indígena cierra ruta en Yasy Cañy por abandono del Indi

La comunidad indígena Tuna Poty se encuentra realizando cierres de ruta desde hace varios días en la zona de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú, por un incumplimiento por parte del Indi de los compromisos que habían asumido.

Julio 06, 2022 01:44 p. m.

La comunidad se encuentra cerrando la ruta por incumplimientos del Indi. *Foto: Gentileza*

La comunidad indígena Tuna Poty se encuentra realizando cierres de ruta

Ing. Sergio A. Oviedo
Fiscal de Obras
D.V. - M.O.P.C.

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Info Capiibary San Pedro
21 jun 2022 ·

Nativos cierran ruta y no permiten paso ni a enfermos

YASY KAÑY. En contacto con la pagina Info Capiibary San Pedro, conductores de vehículos se quejaron por el cierre de ruta que realizan nativos. Los denunciantes piden a las autoridades urgente intervención.
"Acá en zona de ka'a'y de Yasy Cañy, Canindeyu, están cerrando la ruta los indígenas estan cerrando y no permiten paso.
Yo estoy enfermo y necesito llegar al médico pero con ellos no se puede negociar. Pido a la policía que vengan ver esto ", expresó muy molesto José García.
Además dijó que se necesita la intervención policial. " Icacho la situación acá hasta criaturas salen en la calle con palo en la mano y se ponen agresivos con la gente", sentenció.

Info Capiibary San Pedro
16 ago 2022 ·

Reportan cierre de ruta por los nativos en la zona Ka'a'y de Yasy Cañy, Canindeyu.

Me gusta Comentar Compartir

Ing. Sergio A. Oviedo
Fiscal de Obras
D.V. - M.O.P.C.

37 (treinta y uno)

B) INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS. Cláusula 23.2 de las CGC

Al respecto del pedido de prórroga solicitada, se presenta el Registro de Lluvias del SICOE y de la DINAC, ocurridos en el periodo comprendido entre los meses de diciembre/22 hasta abril/23 y en base a esto se solicita una prórroga de 63 (sesenta y tres) días a partir del último plazo aprobado, considerando que la obra ya se encuentra en proceso de terminación.

Se detallan a continuación las planillas de respaldo, referidas a las inclemencias climáticas y sus consecuencias.

Mes/Año	Días de lluvias y sus consecuencias	Inclemencias previsto en el contrato (*)	Días de prórroga	Observaciones
Dic-22	10	0	10	Según Anexo, cuadro de lluvia y/o humedad excesiva (SICOE)
Ene-23	12	0	12	
Feb-23	12	0	12	
Mar-23	14	0	14	
Abr-23	15	0	15	
Total, días de prórroga por inclemencias climáticas			63	

Obsev.: (*) Condiciones Especiales del Contrato CGC 23.1

I. Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras durante el periodo contractual original: es de ocho (8) días por mes.

II. Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras fuera del periodo contractual original: cero (0) días por mes.

30 (treinta)

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Motenondeha

Ministerio
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

00015 (quince)

00044 (cuarenta y cuatro)

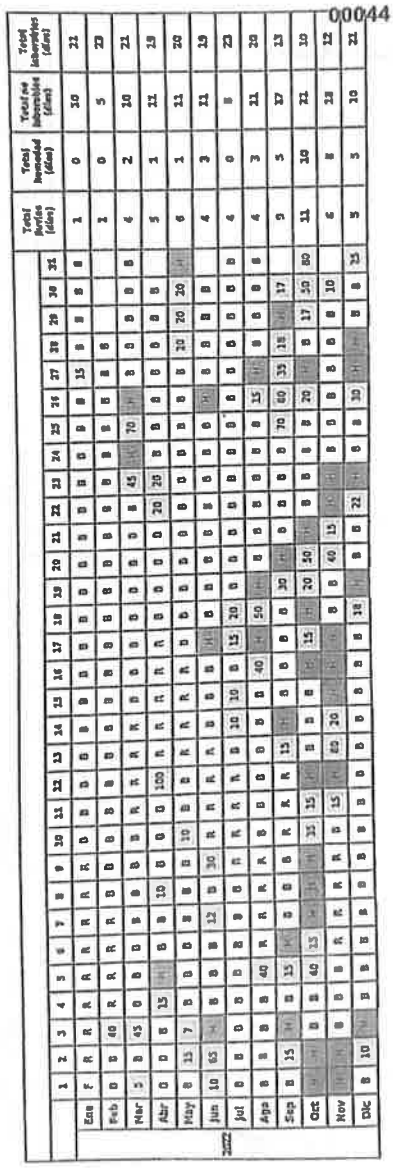

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Bovinos (días)	Total Humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	F	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	1	0	10	21
	Feb	D	D	40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	1	0	5	23
	Mar	S	D	45	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	4	2	10	21
	Abr	D	D	D	15	H	D	D	D	10	D	D	D	100	R	R	R	R	R	D	D	D	D	20	D	D	D	D	D	D	D	D	D	5	1	11	19
	May	B	15	7	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	R	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	6	1	11	20
	Jun	10	65	H	B	B	B	B	12	B	30	R	R	R	R	R	R	R	R	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	3	11	19
	Jul	B	B	D	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	4	0	8	23
	Ago	B	B	B	B	40	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	4	3	11	20
	Sep	B	15	H	B	15	H	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	5	5	17	13
	Oct	H	H	B	B	40	15	H	15	H	35	15	H	H	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	11	10	21	10
	Nov	H	H	B	B	B	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	20	20	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	6	8	18	12
	Dic	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	20	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5	5	10	21

ING. SERGIO AMADO OVIEDO VALIENTE
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

ING. ALFREDO BENÍTEZ ESTIGARRIBIA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO ITO YPANÉ

Fuente: SICOE

29 (veinti nueve)

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Mitsubishi
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

00014 (catorce)

00043 (cuarenta y tres)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	17	[illegible]	R	R	B	B	B	B	B	B	B	20	[illegible]	B	B	B	B	12	[illegible]	B	B	75	[illegible]	B	B	B	B	B	B	95	15	6	4	12	19
	Feb																																0	0	0	0

ING. SERGIO AMADO OVIEDO VALIENTE
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

ING. ALFREDO [illegible]
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO RIO TYANE

Fuente: SICOE

28 (veinti ocho)

TETÁ REMBIAPO HA MARANDU
Motenondeha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DINAC

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN ESTANISLAO	24° 40' 01,00"	56° 26' 53,29"	161 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	7,4	0,0	80,3	-								
2	5,0	41,4	20,0	0,0								
3	49,0	5,3	0,0	0,0								
4	0,0	0,0	0,0	20,0								
5	0,0	0,0	0,0	-								
6	0,0	0,0	0,0	5,1								
7	0,0	0,0	12,0	-								
8	0,0	0,0	103,7	0,0								
9	0,0	0,0	0,0	0,0								
10	0,0	3,4	0,0	0,0								
11	0,0	0,0	0,0	0,0								
12	0,0	0,0	-	0,0								
13	0,0	9,3	13,4	41,6								
14	0,0	111,2	0,0	0,0								
15	0,0	0,0	14,2	0,0								
16	0,0	2,3	0,0	0,0								
17	0,0	0,0	-	1,0								
18	0,0	0,0	0,0	0,0								
19	0,0	0,0	0,0	-								
20	0,0	0,0	0,0	0,0								
21	0,0	0,0	0,0	0,0								
22	54,6	0,0	0,0	0,0								
23	0,0	26,4	0,0	0,0								
24	0,0	0,0	0,0	25,2								
25	0,0	33,0	0,0	64,5								
26	0,0	3,7	0,0	0,0								
27	0,0	0,0	0,0	0,0								
28	-	39,4	0,0	0,0								
29	-		0,0	0,0								
30	5,4		0,0	0,0								
31	3,9		0,0									
Total	125	275	244	157								
Máx. 24h	54,6	111,2	103,7	64,5								
Día Máx.	22	14	8	25								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Fuente: DINAC

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Mitarekha
Ministerio
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DINAC
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN ESTANISLAO	24° 40' 01,00"	56° 26' 53,29"	161 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												T
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												4,1
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,0
20												0,0
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												1,0
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												
Total												5
Máx. 24h												4,1
Día Máx.												12

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Fuente: DINAC

26 (veinti seis)

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Mitsubishi
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Curuguaty, Villa Curuguaty, Dpto. de Canindeyu (Automatica DMH)			

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												50,0
2												0,1
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												0,8
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,1
19												0,0
20												0,0
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,1
25												0,0
26												0,0
27												0,3
28												0,0
29												0,0
30												0,0
31												0,0
Total												51
Máx. 24h												50
Día Máx.												1

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Fuente: DINAC

25 (veinti cinco)

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

C) ATRASOS EN LOS PAGOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA. Cláusula 25.4 de las CGC.

Según Cláusula:

25.4 Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el Contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la Contratante antes de los quince días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras.

La Contratista no presentó ningún respaldo en el cuál compruebe que efectivamente suspendió los trabajos en el sitio de obras por el incumplimiento de las obligaciones de la contratante. Por tanto, esta fiscaíización no reconoce los días de prórrogas solicitadas por lo mencionado anteriormente.

Asimismo, Esta fiscalización luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que establece la Cláusula 23 Prórrogas de los plazos de Ejecución de las CGC, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 77 (setenta y siete) días como se indica en la siguiente tabla.

Descripción	Días de Prórrogas	Observaciones
Casos de Fuerza Mayor	14	Según Anexos
Inclemencias Climáticas	63	
Total, de días de Prórrogas	77	

En atención a lo señalado más arriba, esta fiscalización sugiere otorgar prórroga por 77 (setenta y siete) días a partir del 18/05/2023, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es el 03/08/2023.

Atentamente.

ING. SERGIO OVIEDO, Fiscal de Obra
Unidad Ejecutora GMANS
