169(ciento sesenta y nue

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

COPIA

Asunción, 1 de agosto de 2022

D.C.V. Nº 2413/2022

Señores:

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO

Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 188/2019. "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU".

Contrato SG Ministro Nº 114/2020 – Lote 2.

Asunto: Aprobación Prórroga por lluvia y sus consecuencias

Me dirijo a ustedes, en respuesta a su nota de MEU EXPEDIENTE N° 33186/2022, a través de la cual solicitaron prórroga de la fecha de terminación de las obras por días de lluvias y sus consecuencias, en el periodo comprendido entre los meses de mayo a junio del 2022.

Considerando las verificaciones realizadas por el fiscal de Obras, en Memorándum de fecha 29 de julio de 2022, y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC Clausula Nº 22.1 (Inclemencias Climáticas) Sección I – Datos de la Licitación, corresponde una prórroga de 32 (treinta y dos) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo mencionado.

En atención a dichos informes, esta dirección aprueba la prórroga solicitada, y otorga 32 (treinta y dos) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo comprendido entre los meses de mayo a junio del 2022, a contar a partir de la última fecha de finalización de plazo de ejecución aprobado mediante Nota DCV N°1803/2022, por lo tanto la nueva fecha de terminación queda establecida para **el 19 de setiembre de 2022**.

Se adjunta el cronograma y curva de avance aprobados.

Atentamente.

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

MOP y C
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Rubén Andino
Director
Dirección de Caminos Vecinales

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 1/08/2022 Hora: 11:02
Firma:

168 Ciento sesenta y ocho

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 23118/2022

TITULAR:
CONSORCIO VIAL SAN PEDRO

NOMBRE Y APELLIDO:
EDGAR AHRENS

TELEFONO:
021 331 383

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ. ID N° 373.116. REF: SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 19/05/2022 15:53:19

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 7451
Fecha 20 MAY 2022 Hora 10:00
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 20 MAY 2022
☐ VMAF ☐ OV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha: 23 MAY 2022 11:30
Firma

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.05.19 16:09:59 -04'00'

MOPC
DCV Fecha: 23 MAY 2022
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DB/S ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID
A los sus. Viviana Boez

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO
18 de julio 2350 c/ La Esperanza
Tel/fax: +595 21 331-383
e-mail: licitaciones@icsa.com.py

167 (ciento sesenta y siete)

Asunción, 16 de Mayo de 2.022.-

Señor

ING RUBEN ANDINO
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: *LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – LOTE 2. ID: 373.116"*

Asunto: Consideración de eventos compensables.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar la prórroga de 0,60 meses de plazo del contrato, en virtud de las cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato, por motivos de inclemencias climáticas:

Esta solicitud es en consideración de los días afectados por inclemencias climáticas, según se detalla en los documentos respaldatorios presentados.

Mes	Dias de lluvia y sus consecuencias	Dias Adoptados
ene-22	12	4
feb-22	9	1
mar-22	19	11
abr-22	10	2
TOTAL	50	18

Según CGC 22.1:

El director de obra evaluará los días de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecución, y costo físico financiero, y si corresponde, lo ajustará utilizando la siguiente fórmula: El director de obra evaluará los días de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecución, y costo físico financiero, y si corresponde, lo ajustará utilizando la siguiente fórmula: ATAm = [APm / 22] Dh + Aem + ATAa; siendo *Dh: Días de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 días*

Dias No compensables	32
Dias Compensables	18

Total de dia Compensables:

Por Lluvia y sus consecuencias:	18
Total de dias compensables:	18

0,60 Meses

Sin otro particular me despido atte.

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO
RUC: 80011215-0
Ing. Edgar Ahrens
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBIDO
Fecha 16 MAY 2022 15:00
Firma

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO
18 de julio 2350 c/ La Esperanza
Tel/fax: +595 21 331-383
e-mail: licitaciones@icsa.com.py

166 (ciento sesenta y seis)
06 (2022)

Asunción, 16 de Mayo de 2.022.-

Señor

ING RUBEN ANDINO
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: *LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – LOTE 2. ID: 373.116"*

Asunto: Consideración de eventos compensables.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar la prórroga de 0,60 meses de plazo del contrato, en virtud de las cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato, por motivos de inclemencias climáticas:

Esta solicitud es en consideración de los días afectados por inclemencias climáticas, según se detalla en los documentos respaldatorios presentados.

Mes	Dias de lluvia y sus consecuencias	Dias Adoptados
ene-22	12	4
feb-22	9	1
mar-22	19	11
abr-22	10	2
TOTAL	50	18

Según CGC 22.1:

El director de obra evaluará los días de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecución, y costo físico financiero, y si corresponde, lo ajustará utilizando la siguiente fórmula: El director de obra evaluará los días de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecución, y costo físico financiero, y si corresponde, lo ajustará utilizando la siguiente fórmula: ATAm = [APm / 22] Dh + Aem + ATAa; siendo *Dh: Días de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 días*

Dias No compensables	32
Dias Compensables	18

Total de dia Compensables:

Por Lluvia y sus consecuencias:	18
Total de dias compensables:	**18**

0,60 Meses

Sin otro particular me despido atte.

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO
RUC: 80111215-0

Ing. Edgar Ahrens
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha: Asuncion, 24 de Febrero del 2022

Llamado MOPC N° 188/2019

Items del llamado LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM AL PGN 2020 con ID: 373116 - LOTE 2

Cronograma Fisico - Financiero

Inicio de periodo:	18/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022
Fin de periodo:	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	07/06/2022
cripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	Mes 25	Mes 26
mpieza		30%	40%	30%																						
				23%	23%	23%	23%						8%													
				2%	2%	2%	2%						31%	31%	31%											
				13%	13%	13%	13%						17%	17%	17%											
				4%	4%	4%	4%						14%	14%	14%	14%	14%	14%								
				4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	11%							
(1)													13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	7%						
ura existente													33%	33%	33%											
C>2,5 Mpa																		10%	10%	15%	15%	15%	15%	10%	5%	5%
>100%																		10%	10%	15%	15%	15%	15%	10%	5%	5%
																						10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%
banquina																						10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%
																						10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%
A* D= 0,60 m															20%	20%	20%	20%	20%							
A* D= 1,00 m														100%												
A* D= 1,20 m															100%											
* D= 1,20 m											100%															
sen												25%	25%	25%	25%											
nilas tubulares									7%	7%	7%	7%	24%	24%	24%											
										19%	19%		21%	21%	21%											
* de 2,00 x 2,00 m.									17%	17%	17%	17%	17%	17%												
* de 1,00 x 1,00 m.													25%	25%	25%	25%										
* de 1,50 x 1,50 m.												25%	25%	25%	25%											
* de 2,00 x 2,00 m.									10%	10%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%									
las celulares									10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	15%										
nilas celulares																		15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
																		15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
														30%	30%	30%	10%									
														15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%						
							17%	17%	17%	17%	17%	17%														
																							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
o Flex Beam)																									50%	50%
																									50%	50%
																									50%	50%
																									50%	50%
																									50%	50%
les																									50%	50%
io público (electricidad y							32%	32%						12%	12%	12%										
ias de agua				20%	20%	20%	20%	20%																		
eneamiento/cloacal								100%												50%	50%					
ados	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%					
	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%					
	30%	40%	30%																							
A* de 1,00 x 1,00 m.											50%	50%														
A* de 1,50 x 1,50 m.											23%	26%	26%	26%												
* de 1,50 x 1,50 m															50%	50%										
* de 3,00 x 3,00 m.															50%	50%										
(CBR>40%																10%	25%	25%	25%	15%						
																								10,00%	50%	40%
																								10,00%	50%	40%
																								10,00%	50%	40%
	0,97%	1,32%	1,05%	1,77%	1,71%	1,71%	2,07%	1,66%	1,16%	1,30%	1,59%	1,56%	3,73%	4,50%	5,67%	5,71%	6,14%	9,05%	9,03%	6,86%	4,78%	7,09%	12,36%	10,93%	9,38%	6,78%
os	0,97%	2,29%	3,34%	5,11%	6,81%	8,52%	10,58%	12,24%	13,41%	14,71%	16,29%	17,85%	21,58%	26,09%	31,75%	37,46%	43,60%	52,65%	61,74%	68,60%	73,4%	80,5%	92,9%	103,83%	113%	120%

165 (ciento sesenta y cinco)

NSORCIO
SAN PEDRO

Ing. Aníbal Andino Lezcano

LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA CON ID: 351956. LOTE Nº2

Curva de Avance

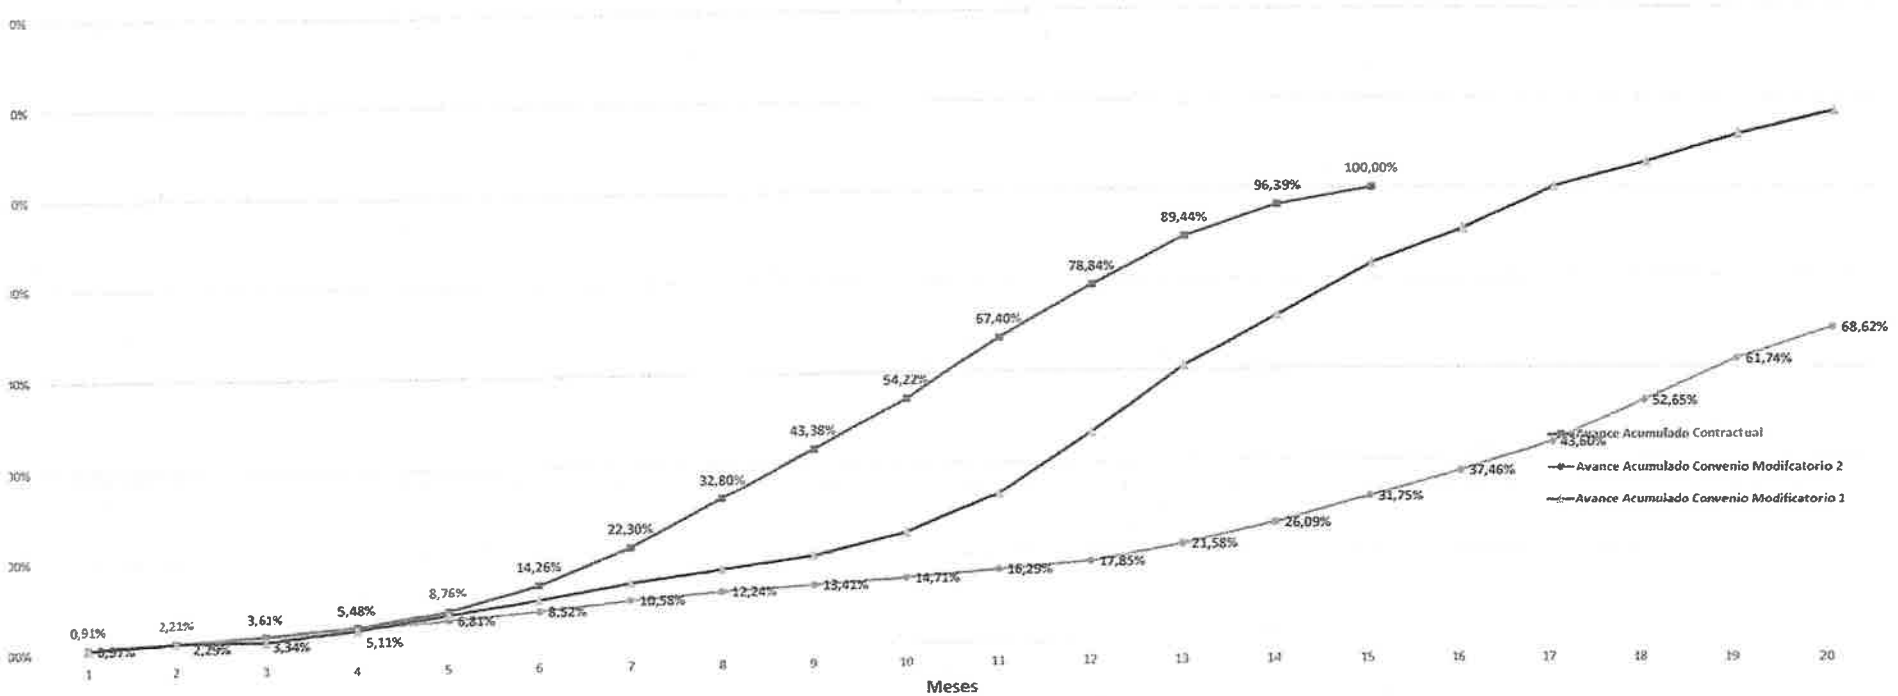

Nº Certificado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fecha de Cierre	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021
ance Mensual Contractual	0,91%	1,31%	1,40%	1,87%	3,27%	5,50%	8,04%	10,49%	10,59%	10,83%	13,18%	11,44%	10,60%	6,95%	3,61%					
nce Acumulado Contractual	0,91%	2,21%	3,61%	5,48%	8,76%	14,26%	22,30%	32,80%	43,38%	54,22%	67,40%	78,84%	89,44%	96,39%	100,00%					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Mensual Convenio Modificatorio 2	0,97%	1,32%	1,05%	1,77%	1,71%	1,71%	2,07%	1,56%	1,16%	1,30%	1,59%	1,56%	3,73%	4,50%	5,67%	5,71%	6,14%	9,05%	9,09%	6,88%
Acumulado Convenio Modificatorio 2	0,97%	2,29%	3,34%	5,11%	6,81%	8,52%	10,58%	12,24%	13,41%	14,71%	16,29%	17,85%	21,58%	26,09%	31,75%	37,46%	43,60%	52,65%	61,74%	68,62%

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO
RUC: 80111215-0

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

164 (ciento sesenta y cuatro)
04 (cuatro)

163 (ciento sesenta y tres)

03 (TRES)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	0,0										
2	9,1	0,0										
3	12,4	27,2										
4	0,0	141,9										
5	4,1	9,2										
6	0,0	0,0										
7	0,0	0,0										
8	0,0	0,0										
9	0,0	0,0										
10	0,0	0,0										
11	0,0	0,0										
12	0,0	0,0										
13	0,0	0,0										
14	T	0,0										
15	0,0	0,0										
16	0,0	0,0										
17	0,0	0,0										
18	0,0	0,0										
19	0,0	0,0										
20	0,0	3,0										
21	0,0	0,0										
22	0,0	0,0										
23	0,0	0,0										
24	0,0	0,0										
25	0,0	0,0										
26	42,0	0,0										
27	0,0	0,0										
28	0,0	0,0										
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	67,6	181,3										
Máx.24h	42	141,9										
Día Máx.	26	4										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Mar[illegible] Lezcano Aveiro C.
Jefe Dpto. Ser. Meteorológicos para el Público
DGM - DINAC

CONSORCIO
VIAL SAN PEDRO
RUC: 80111215-0

162 (ciento sesenta y dos)
01 (UNO)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				T								
5				0,0								
6				0,0								
7				34,2								
8				7,9								
9				0,0								
10				0,0								
11				20,8								
12				0,3								
13				T								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				10,6								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				74								
Máx.24h				34,4								
Día Máx.				7								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aceito G.
Jefa Dpto. Servicios Meteorológicos para el Público
DMH - DINAC

CONSORCIO
VIAL SAN PEDRO
RUC: 80111215-0

161(ciento sesenta y uno)
02(203)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			1,7									
3			0,0									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			0,0									
8			44,7									
9			T									
10			84,6									
11			8,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			0,0									
17			0,0									
18			4,4									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			5,0									
23			0,0									
24			35,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30			0,4									
31			0,0									
Total			184									
Máx.24h			84,6									
Día Máx.			10									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe del Dpto. Servicios Meteorológicos al Público
DMH - DINAC

CONSORCIO
VIAL SAN PEDRO
RUC: 80111215-0

160 (ciento sesenta)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C.	Consorcio Vial San Pedro	Nº 000032

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE N°2

LIBRO DE OBRA

PARA :

DE : FECHA:

ASUNTO : REGISTRO DE PRECIPITACIONES ENERO 2022

FECHA: 02/01/2022, SE REGISTRA 10 MM DE PRECIPITACIONES

FECHA: 03/01/2022, SE REGISTRA 12,4 MM DE (HUMEDAD) PRECIPITACIONES

FECHA: 04/01/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA

FECHA: 05/01/2022, SE REGISTRA 5,2 MM DE PRECIPITACIONES

FECHA: 06/01/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA

FECHA: 07/01/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA

FECHA: 14/01/2022, SE REGISTRA 11,8 MM DE PRECIPITACIONES

FECHA: 15/01/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA

FECHA: 20/01/2022, SE REGISTRA 30 MM DE PRECIPITACIONES

FECHA: 21/01/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA

FECHA: 25/01/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA

FECHA: 29/01/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA

ANEXO

Firma de la Fiscalizacion

Firma de la Contratista

159 (ciento cincuenta y nueve)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C.	Consorcio Vial San Pedro	Nº 000034

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE N°2

LIBRO DE OBRA

PARA :

DE : FECHA: 28/02/2022

ASUNTO : REGISTRO DE PRECIPITACIONES MES DE FEBRERO

FECHA: 03/02/2022, SE REGISTRO 23 MM DE PRECIPITACION

FECHA 04/02/2022, SE REGISTRO 142 MM DE PRECIPITACION

FECHA 05/02/2022, SE REGISTRO 11,1 MM DE PRECIPITACION

FECHA 06/02/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA

FECHA 07/02/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA

FECHA 08/02/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA

FECHA 09/02/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA

FECHA 20/02/2022 SE REGISTRA 8 MM DE PRECIPITACIÓN

FECHA 21/02/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA

ANEXO

Firma de la Fiscalizacion

Firma de la Contratista

IMPRENTA AGUARAY - SANTA ROSA DEL AGUARAY- (0971) 403 776 - 1 Tal 50'3 del 01 al 50

158 (ciento cincuenta y ocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C.	Consorcio Vial San Pedro	Nº 000037

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE N°2

LIBRO DE OBRA

PARA :

DE :

FECHA:

ASUNTO : REGISTRO DE PRECIPITACIONES DEL MES DE MARZO

FECHA 02/03/2022 SE REGISTRA 30 MM DE PRECIPITACIÓN
FECHA 03/03/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA
FECHA 04/03/2022 SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD EN PISTA
FECHA 06/03/2022 SE REGISTRA 20 MM DE PRECIPITACIÓN
FECHA 07/03/2022, ✓ ✓ 30 MM ✓ ✓
FECHA 10/03/2022, ✓ ✓ 10 MM ✓ ✓
FECHA 11/03/2022, ✓ ✓ 10 MM ✓ ✓
FECHA 12/03/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD
FECHA 13 - 14/03/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD
FECHA 15/03/2022, SE REGISTRA 15 MM DE PRECIPITACIÓN
FECHA 19/03/2022, SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD
FECHA 20/03/2022 SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD
FECHA 22/03/2022, SE REGISTRA 20 MM DE PRECIPITACIÓN
FECHA 23/03/2022, SIN ACTIVIDAD POR HUMEDAD
FECHA 24/03/2022 SE REGISTRA 30 MM DE PRECIPITACIÓN
FECHA: 25/03/2022, ✓ ✓ 60 MM ✓ ✓
FECHA 26 - 27/03/2022, SIN ACTIVIDAD POR HUMEDAD

ANEXO

Firma de la Fiscalizacion

Firma de la Contratista

IMPRENTA AGUARAY - SANTA ROSA DEL AGUARAY - (0971) 403 776 - 1 Tal 50'S del 01 al 50

157 (ciento cincuenta y siete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C.	Consorcio Vial San Pedro	Nº 000041

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE N°2

LIBRO DE OBRA

PARA :

DE :

FECHA:

ASUNTO : Registro de Precipitaciones, mes de Abril.

Fecha: 07/04/2022: Se registra 30mm. de Precipitaciones
Fecha: 08/04/2022 " " 70 " " "
Fecha: 09 - 10/04/2022: Sin Actividad por exeso de Humedad.
Fecha: 11/04/2022: Se registra 40mm de Precipitaciones.
Fecha: 12 - 13/04/2022: Sin Actividad por exeso de Humedad.
Fecha: 15/04/2022: Se registra 25mm. de Precipitaciones.
Fecha: 16 - 17/04/2022: Sin Actividad por exeso de Humedad.
Fecha: 22/04/2022: Se registra 60mm de precipitaciones.
Fecha: 23 - 24/04/2022 Sin Actividad por exeso de Humedad.

ANEXO

Firma de la Fiscalizacion	Firma de la Contratista

IMPRENTA AGUARAY - SANTA ROSA DEL AGUARAY- (0771) 492 776 - I Tal. 50 3 del 01 al 50

156 (ciento cincuenta y seis

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

A: **ING. OSVALDO LÓPEZ, jefe**
Departamento de Ejecución

DE: **ING. PAOLA CANIZA, Supervisor de Obra.**

REF.: **Prórroga del Plazo de Ejecución de Obras**
Llamado MOPC Nº 188/2019. "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ". ID: 373.116. Contrato SG Ministro Nº 114/2020

Empresa Contratista: Consorcio Vial San Pedro

Asunto: Informe sobre prórroga del plazo de ejecución

FECHA: 01 de marzo de 2022

Elevo a consideración de esta jefatura la propuesta de la **Ampliación del plazo de ejecución de obra** de la referencia, con sus correspondientes cronogramas, elaborados para el efecto, en forma conjunta con la Empresa Contratista.

En la solicitud de prórroga en el plazo de ejecución de la obra, del Consorcio Vial San Pedro, el mismo aduce que el pedido de prórroga se realiza debido a la demora de aprobación del Convenio Modificatorio N°2 presentado en fecha 16/09/2021 con MEU EXPEDIENTE 38065/2021 que a la fecha se encuentra aún en proceso de aprobación.

Constatada la necesidad de incorporar un nuevo plazo de terminación de obra, teniendo en cuenta que los trabajos correspondientes a los ítems nuevos del Convenio Modificatorio N° 2 no pueden ser certificados, la Fiscalización, de manera conjunta con los técnicos de la empresa Contratista, determinaron que el nuevo plazo modificado para la terminación de la obra es **20/05/2022.**

Fecha de Orden de Inicio	18/05/2020
Plazo Contractual Original	15 meses
Fecha de Finalización Original	18/08/2021
Fecha modificada por casos de fuerza mayor	29/09/2021
Fecha de Finalización de la obra fijado por el Convenio Modificatorio N°01	15/12/2021
Plazo modificado por lluvias y sus consecuencias	31/12/2021
Fecha de Finalización de la obra fijado por el Convenio Modificatorio N°02	14/01/2022
Fecha modificada por casos de fuerza mayor (Paro de transportistas)	06/02/2022
Fecha de finalización por prórroga del plazo de ejecución	20/05/2022

Luego de analizada la solicitud de la Contratista con los argumentos esgrimidos, ésta Fiscalización los encuentra razonable, por lo que recomienda, salvo omejor parecer, aprobar el pedido de la contratista, fijando como fecha de finalización de la obra el 20 de marzo del 2022.

Atentamente.

ING. PAOLA CANIZA
