735 (setecientos treinta y cinco)

Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

COPIA

Asunción, 09 de mayo de 2021.

DCV N° 1317/2021

Señores:

CONSORCIO RIO TEMBEY

Avda. Defensores del Chaco N° 524 casi Arturo Alsina, Asunción

Ref.: LLAMADO MOPC N.° 188/2019. Obras de Pavimentación tipo Asfáltico de tramos de Caminos Vecinales en los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguarí y Ñeembucú. – Ad Referéndum al PGN 2020. ID 373116

Contrato SG Ministro N.° 112/2020

Asunto: Aprobación de Prórroga de plazo por lluvia y sus consecuencias.

Me dirijo a ustedes, en respuesta a la nota con MEU EXPEDIENTE N° 19299/2021 de fecha 6 de mayo de 2021, presentada por el Consorcio Rio Tembey, a través de la cual solicitaron prórroga de la fecha de terminación de las obras por días de lluvias y sus consecuencias, en el periodo comprendido a partir de la fecha 18/05/2020 al 28/02/2021.

Considerando las verificaciones realizadas por el Supervisor, en Memorándum de fecha 07 de mayo de 2021, y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC Clausula N° 22.1 (Inclemencias Climáticas) Sección I – Datos de la Licitación, corresponde una prórroga de 30 (treinta) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo mencionado.

En atención a dichos informes, esta dirección aprueba la prórroga solicitada, y otorga 30 (treinta) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo del 18/05/2020 al 28/02/2021, a contar a partir de la fecha de finalización de plazo de ejecución aprobado (18/01/2022), siendo la nueva fecha de terminación de obras **el 17 de febrero de 2022**.

Se adjunta el cronograma y curva de avance aprobados.

Atentamente.

MOPC

MOPYC DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director
Dirección de Caminos Vecinales

RECIBIDO
Fecha 21/05/2021 Hora 11:30
Firma

ML

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU.

CUADRO DE DIAS DE LLUVIA

		DÍAS																															PRECIPITACIONES		
	MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	REGISTRO MENSUAL (mm)	DÍAS	DIAS MENOS 8
1	mayo-2020																						90	10	H	H							100	4	0
2	junio-2020				25	55	H	H			15	H		10													12	H	H				117	10	2
3	julio-2020						10	10	25	H	H																						45	5	0
4	agosto-2020																20	25	H	H													45	4	0
5	septiembre-2020																	14	H									15					29	3	0
6	octubre-2020													70	2	26	H	H	H								74	H	H	12	H		184	11	3
7	noviembre-2020									20	35	H	H			45	5	H	47	H	H							5					157	11	3
8	diciembre-2020			8	25	23	H	H							40	H	35	10	20	H	H	25	H							75	H	H	261	17	9
9	enero-2021				20	25	H	10	H	H	10	H		8	H					5	30	H	34	5	40	5	H	45	H			80	317	21	13
10	febrero-2021	H	10																														10	2	0
																																	TOTAL DIAS PRORROGABLES		30

Dias de lluvia
H= EXCESO DE HUMEDAD

Ing. Jorge Regueiro
Representante Legal
CONSORCIO RIO TEMBEY

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obra
D.C.V.- M.O.P.C.

734 (setecientos treinta y cuatro)

LLAMADO MOPC N° 01/2019. OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS

LOTE N° 3: San Vicente -

CURVA DE AVAN

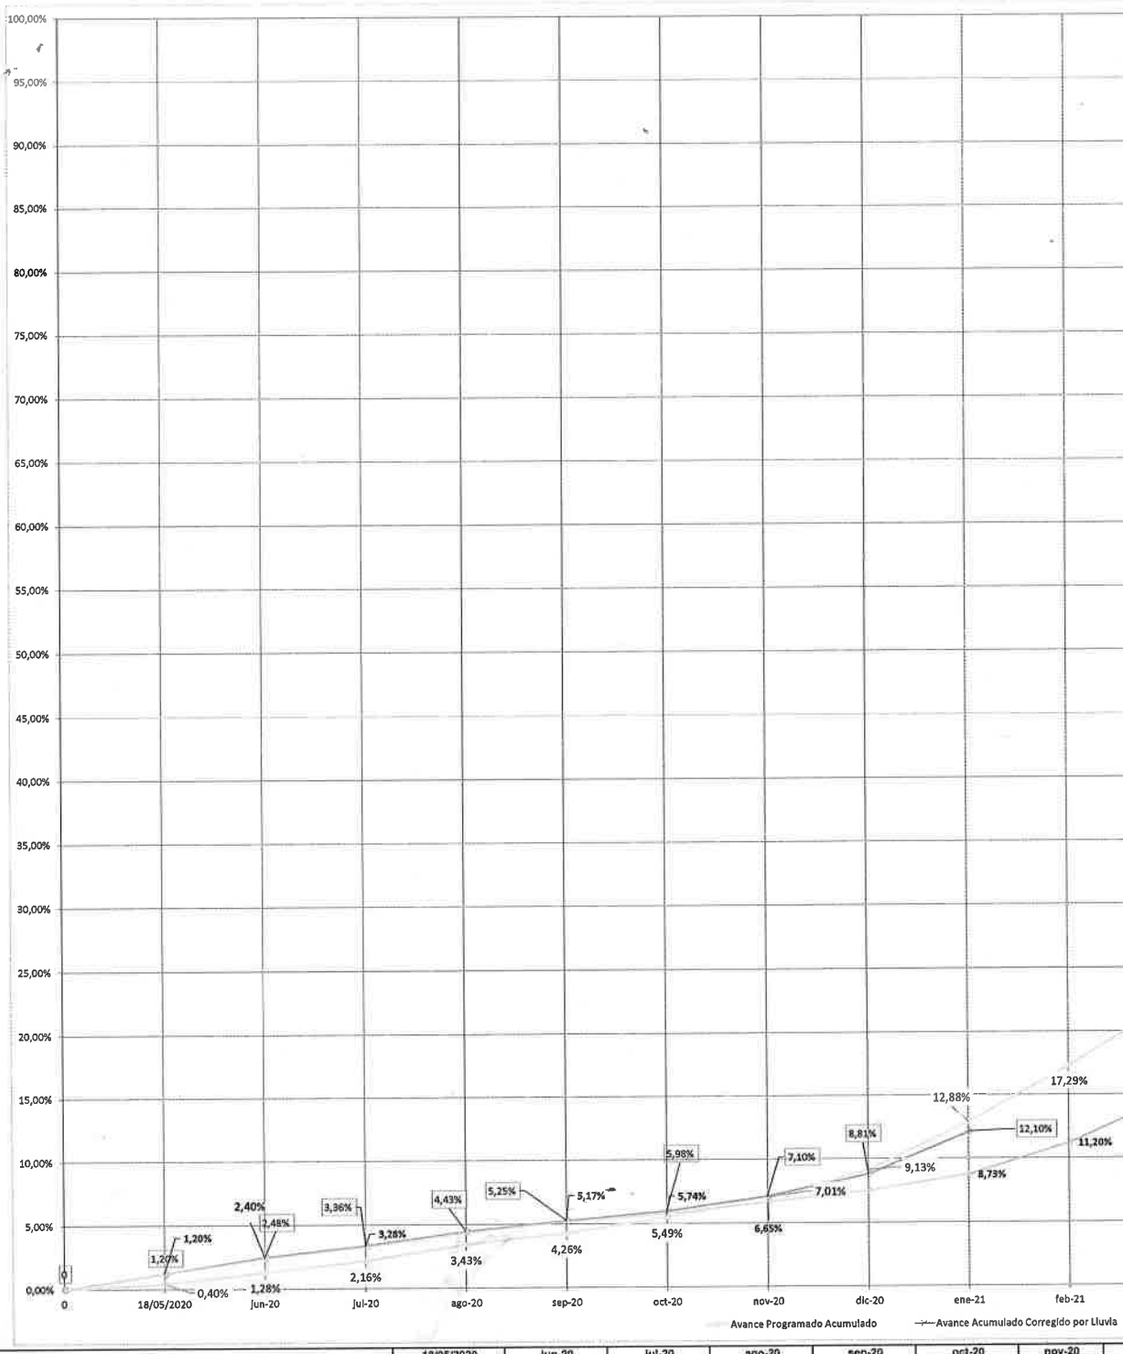

	18/05/2020	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20
Avance Programado Contractual (Apm)	0,40%	0,88%	0,89%	1,27%	0,83%	1,23%	1,52%
Avance Programado Acumulado	0,40%	1,28%	2,16%	3,43%	4,26%	5,49%	7,01%
Avance Teorico Mensual	1,20%	1,28%	0,88%	1,07%	0,82%	0,73%	1,12%
Avance Teorico Acumulado	1,20%	2,48%	3,36%	4,43%	5,25%	5,98%	7,10%
Avance Ejecutado del mes por el contratista (Aemes)	1,20%	1,20%	0,88%	1,07%	0,82%	0,57%	0,91%
Avance Ejecutado Acumulado por el contratista (AEacum)	1,20%	2,40%	3,28%	4,35%	5,17%	5,74%	6,65%
Avance Mensual Corregido por Lluvia	1,20%	1,20%	0,88%	1,07%	0,82%	0,57%	0,91%
Avance Acumulado Corregido por Lluvia	1,20%	2,40%	3,28%	4,35%	5,17%	5,74%	6,65%

Ing. Jorge Regueiro
Representante Legal
CONSORCIO RIO TEMBEY

733 (setecientos treinta y tres)

ECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU

racaná. Longitud: 23,948 km.

FISICO - FINANCIERO

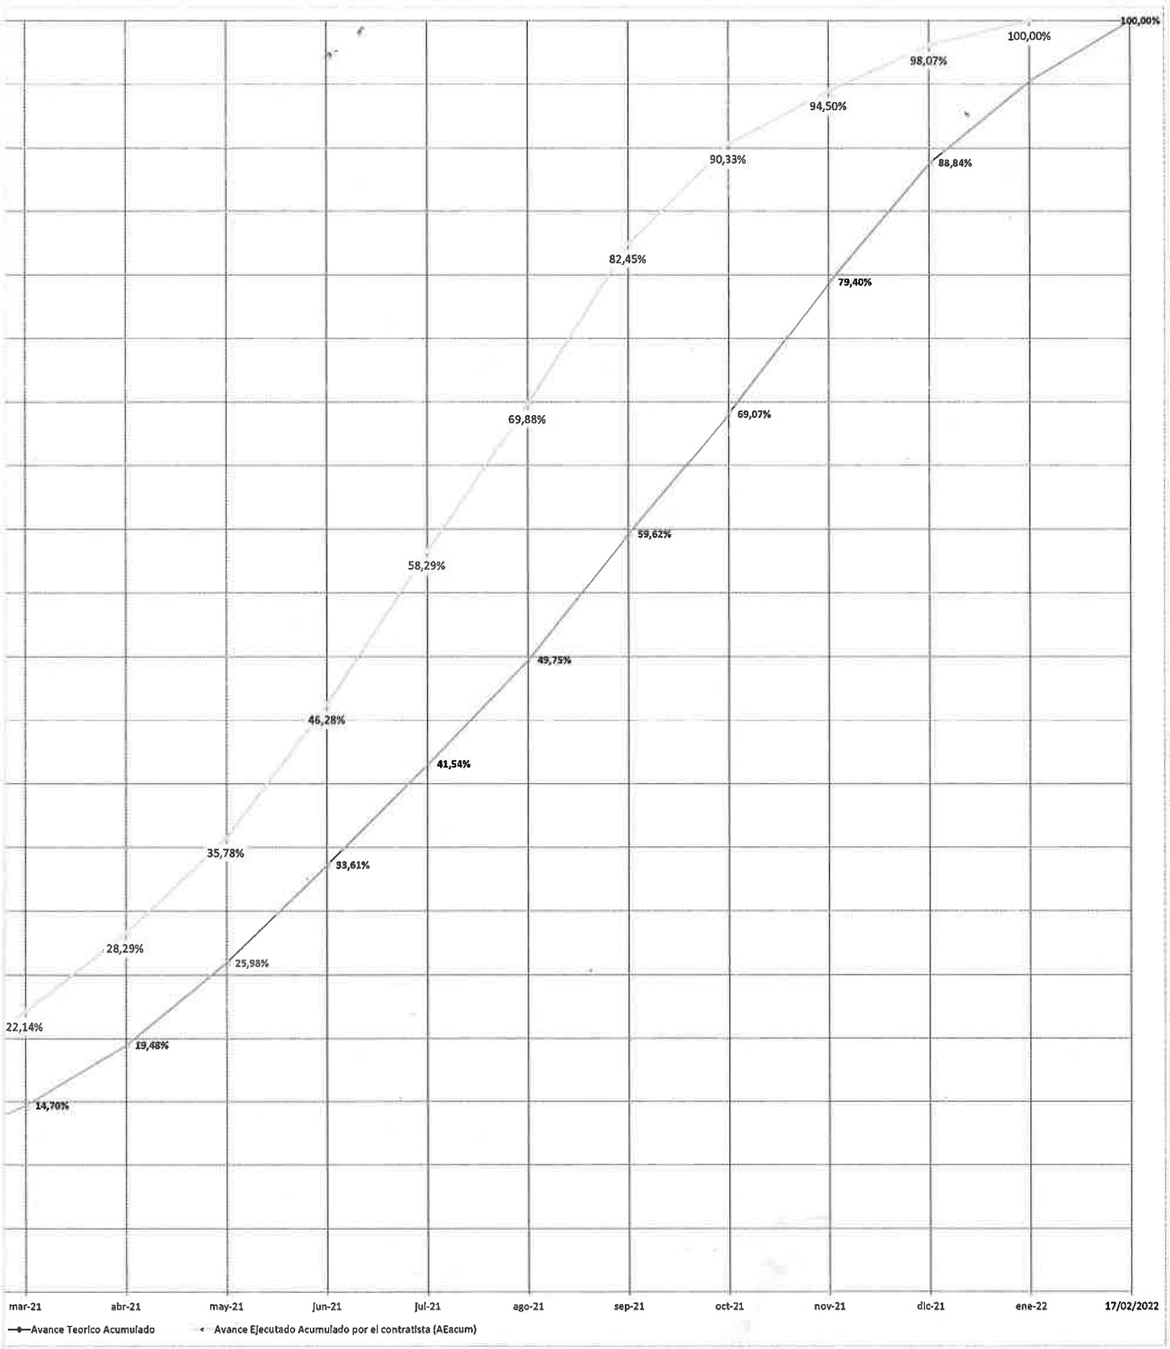

c-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	17/02/2022
12%	3,75%	4,41%	4,85%	6,15%	7,49%	10,49%	12,01%	11,59%	12,57%	7,88%	4,17%	3,57%	1,93%	
13%	12,88%	17,29%	22,14%	28,29%	35,78%	46,28%	58,29%	69,88%	82,45%	90,33%	94,50%	98,07%	100,00%	
71%	3,29%													
81%	12,10%													
84%	1,24%													
49%	8,73%													
84%	**1,24%**	**2,47%**	**3,50%**	**4,78%**	**6,50%**	**7,63%**	**7,93%**	**8,21%**	**9,87%**	**9,45%**	**10,33%**	**9,44%**	**6,44%**	**4,72%**
49%	**8,73%**	**11,20%**	**14,70%**	**19,48%**	**25,98%**	**33,61%**	**41,54%**	**49,75%**	**59,62%**	**69,07%**	**79,40%**	**88,84%**	**95,28%**	**100,00%**

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obra
D.C.V.- M.O.P.C.
