ANEXO 4 - CURVA FISICO FINANCIERA

CÉSAR A. BOLLA A.
Supervisor - DCV

48 (cuarenta y ocho)

. FISICO - FINANCIERO CM N° 2
RAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

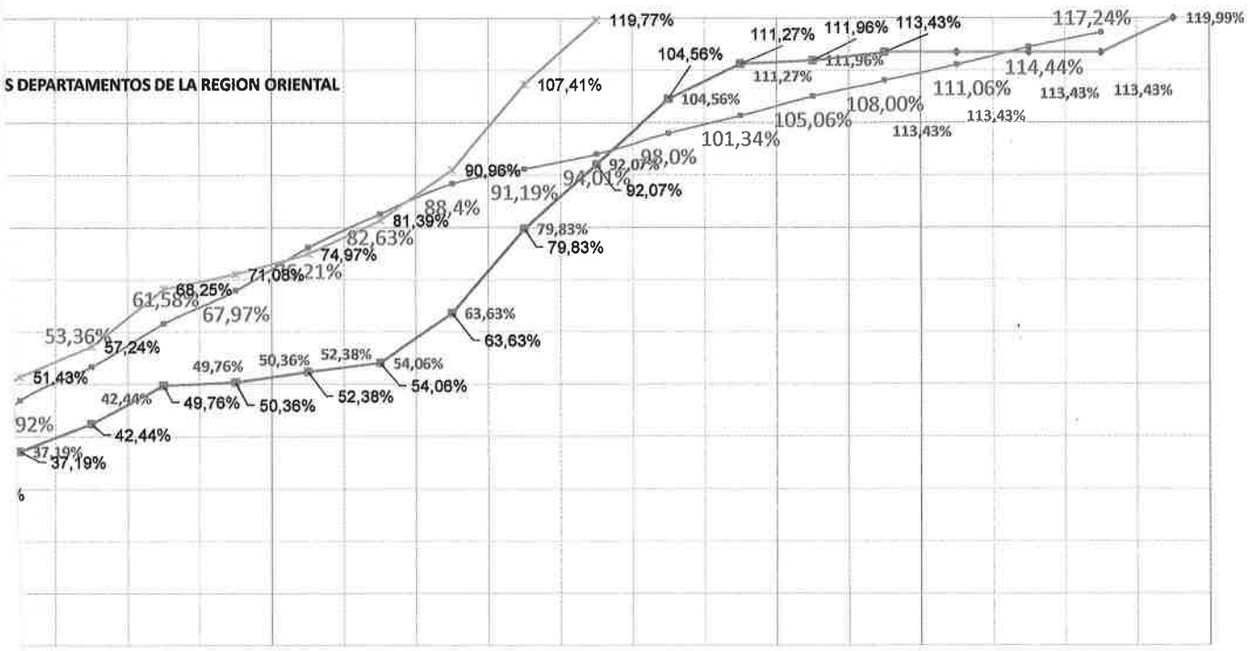

E FISICO FINANCIERO

oct.-18	nov.-18	dic.-18	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20
16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
8,56%	8,36%	12,44%	6,43%	8,22%	6,39%	8,24%	6,41%	5,7%	2,83%	2,83%	4,0%	3,37%	3,72%	2,9%	3,06%	3,38%	2,80%	
26,11%	34,48%	46,92%	53,36%	61,58%	67,97%	76,21%	82,63%	88,4%	91,19%	94,01%	98,0%	101,34%	105,06%	108,00%	111,06%	114,44%	117,24%	
8,66%	7,54%	4,93%	5,25%	7,32%	0,60%	2,02%	1,68%	9,57%	16,20%	12,24%	12,49%	6,71%	0,69%	1,47%				
24,72%	32,26%	37,19%	42,44%	49,76%	50,36%	52,38%	54,06%	63,63%	79,83%	92,07%	104,56%	111,27%	111,96%	113,43%				
8,66%	7,54%	4,93%	5,25%	7,32%	0,60%	2,02%	1,68%	9,57%	16,20%	12,24%	12,49%	6,71%	0,69%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	6,56%
24,72%	32,26%	37,19%	42,44%	49,76%	50,36%	52,38%	54,06%	63,63%	79,83%	92,07%	104,56%	111,27%	111,96%	113,43%	113,43%	113,43%	113,43%	119,99%
31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31			
23	13	13	10	17	16	13	25	4	10	9	4	12	4	0				
23	22	23	23	20	23	22	23	22	23	23	22	23	22	23				
15	5	5	2	9	8	5	17	0	2	1	0	4	0	0				
5,59%	1,90%	2,71%	0,56%	3,70%	2,22%	1,87%	4,74%	0,00%	0,25%	0,12%	0,00%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%			
34,35%	43,79%	51,43%	57,24%	68,25%	71,08%	74,97%	81,39%	90,96%	107,41%	119,77%	132,26%	139,56%	140,25%	141,72%	141,72%			

la Contratista 0150-170731-031
el Proyecto a realizar. Ver nota de la Contratista 0150-171227-054
de obras. Ver nota de la Contratista 0150-181022-094

N
rate
ENTE

SUPERVISOR
Sr. Cesar Bolla
MOPC

49 (cuarenta y nue

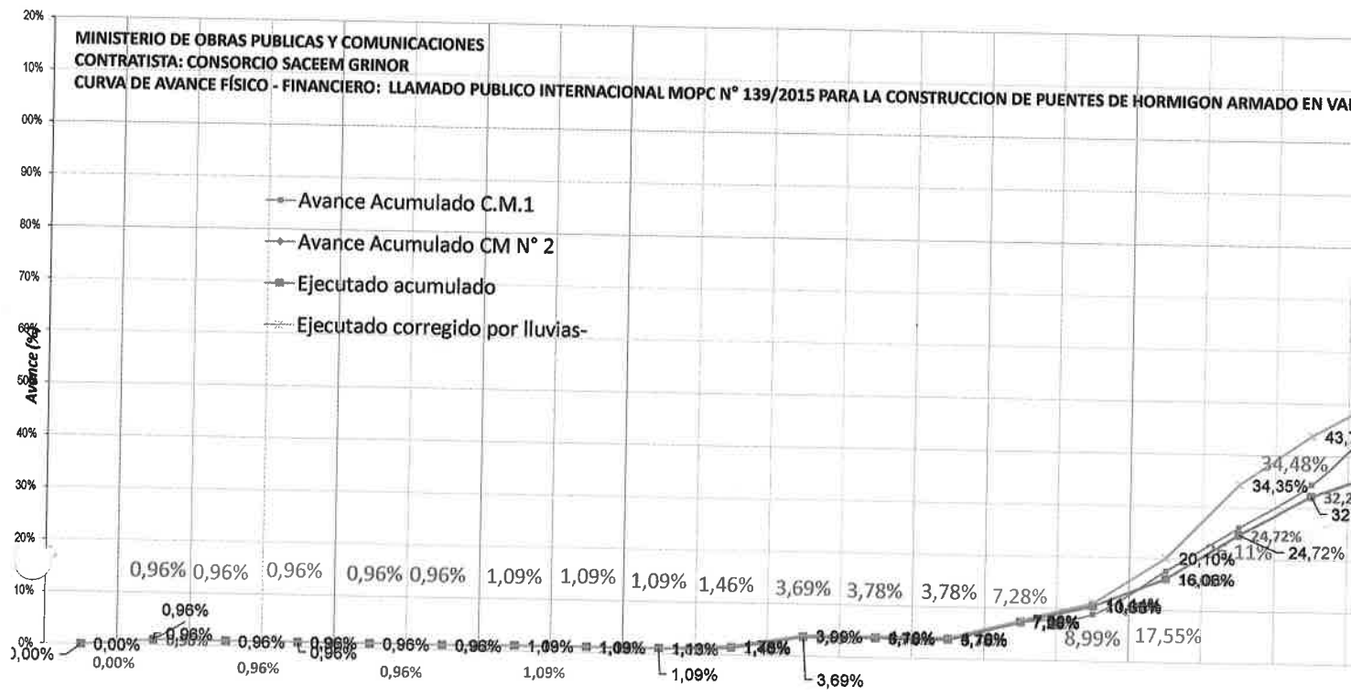

CURVA DE AVA

Mes	jul.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Avance Mensual C.M.1		0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,37%	2,22%	0,09%	0,00%	3,50%	1,72%	8,5
Avance Acumulado C.M.N°1	0,00%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	1,09%	1,09%	1,09%	1,46%	3,69%	3,78%	3,78%	7,28%	8,99%	17,5
Avance Ejecutado. Mensual		0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,37%	2,23%	0,09%	0,00%	3,50%	3,32%	5,4
Avance Ejecutado Acumulado	0,00%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	1,09%	1,09%	1,09%	1,46%	3,69%	3,78%	3,78%	7,28%	10,60%	16,0
AvanceCM 2. Mensual		0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,37%	2,23%	0,09%	0,00%	3,50%	3,32%	5,4
Avance Acumulado CM N° 2	0,00%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	1,09%	1,09%	1,09%	1,46%	3,69%	3,78%	3,78%	7,28%	10,60%	16,0
Días del mes		31	31	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	
Días de lluvias y sus consecuencias		3	14	5	22	16	15	23	12	24	3	13	14	7	11	
Días de trabajo		23	23	22	23	22	23	23	20	23	22	23	22	23	23	
Días Prorrogables por Lluvia		0	6	0	14	8	7	15	4	16	0	5	6	0	3	
...ce Teórico Por lluvia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,22%	3,5
Avance Teórico Acumulado corregido por lluvia	0,00%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	1,13%	1,13%	1,13%	1,76%	3,99%	4,10%	4,10%	7,60%	11,14%	20,1

Observaciones:

En el periodo comprendido entre el 31/07/17 y el 13/11/17 la obra estuvo detenida por falta de expropiación de los predios afectados por la Obra. Ver nota
En el periodo comprendido entre el 27/12/17 y el 14/02/2018 no se registran avances como consecuencia de la falta de una Orden de Ejecución que determ
En el periodo comprendido entre el 19/10/18 y el 19/11/2018 se produjo una creciente extraordinaria del Río Acaray imposibilitando realizar trabajos en la

CONTRATISTA
Ing. Adrian Sclavi Cordini
Representante Legal

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

FISCALIZA
Ing. Marian
INGENIERO R
