ANEXO II

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

LOS TRIGALES S.A.

CRONOGRAMA DE OBRA BARRAS DE GANT REPROGRAMADA AL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 1RA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
ID 363540 - Lote 1 – Pavimentación Asfáltica del tramo Pirayu – Paraguarí (Long. 17,45 km)

ITEM	DESCRIPCION	ORIGINAL	CM Nº 1	%INCID	MESES											
					MES - 1	MES - 2	MES - 3	MES - 4	MES - 5	MES - 6	MES - 7	MES - 8	MES - 9	MES - 10	MES - 11	MES - 12
1	Bacheo de Empedrado Existente	372.775.977	2.660.698.547	2,19%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	78,75%	80,00%	90,00%	90,00%			
2	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	47.213.220	47.213.220	0,28%		10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	30,00%	10,00%					
3	Regularización de Subrasante en Banquina	290.348.000	290.348.000	1,71%		10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	30,00%	10,00%					
4	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	1.486.303.360	1.486.303.360	8,75%			10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%				
5	Riego de Imprimación	404.400.360	404.400.360	2,38%			10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%				
6	Riego de Liga	660.083.680	793.243.616	3,89%				10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,17%	
7	Regularización con CºAº	2.176.571.670	2.578.864.470	12,81%				10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	33,48%		
8	Carpeta de CºAº	8.890.793.199	10.234.066.959	52,34%					5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,11%	
9	Pórticos de Señalización	110.426.846	110.426.846	0,65%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
10	Señalización Horizontal	588.920.238	588.920.238	3,47%										33,33%	33,33%	33,33%
11	Tachas Reflectivas	147.494.380	147.494.380	0,87%											50,00%	50,00%
12	Tachones Reflectivos	28.114.393	28.114.393	0,17%											50,00%	50,00%
13	Señalización Vertical	114.557.909	114.557.909	0,67%											50,00%	50,00%
14	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	33.243.720	33.243.720	0,20%									33,33%	33,33%	33,33%	
15	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	48.872.350	-	0,29%												
16	Alcantarilla Tubular Simple Ø 0,80 m	87.205.450	-	0,51%												
17	Cunetas Revestidas de Hormigón	174.027.641	-	1,02%												
18	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	6.803.200	6.803.200	0,04%								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
19	Revestimiento Vegetal con Tepes	39.735.800	-	0,23%												
20	Dársenas de pesaje	238.059.131	-	1,40%												
21	Instalaciones y Servicios Especializados	544.901.508	363.267.672	3,21%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,36%				
22	Movilización	494.722.258	494.722.258	2,91%	100,00%											
PORCENTAJES MENSUALES DE AVANCE					4,82%	2,11%	3,22%	4,99%	8,36%	12,36%	17,58%	18,36%	16,03%	16,94%	13,21%	2,02%
PORCENTAJES MENSUALES DE AVANCE ACUMULADOS					4,82%	6,93%	10,15%	15,14%	23,50%	35,86%	53,44%	71,80%	87,83%	104,77%	117,98%	120,00%

Ing. Nery Gómez
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LOS TRIGALES S.A.

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

LOS TRIGALES S.A.

OBRA: **LLAMADO MOPC Nº 24/2019**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 1RA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - ID 363540

Lote 1 – Pavimentación Asfáltica del tramo Pirayu – Paraguarí (Long. 17,45 km)

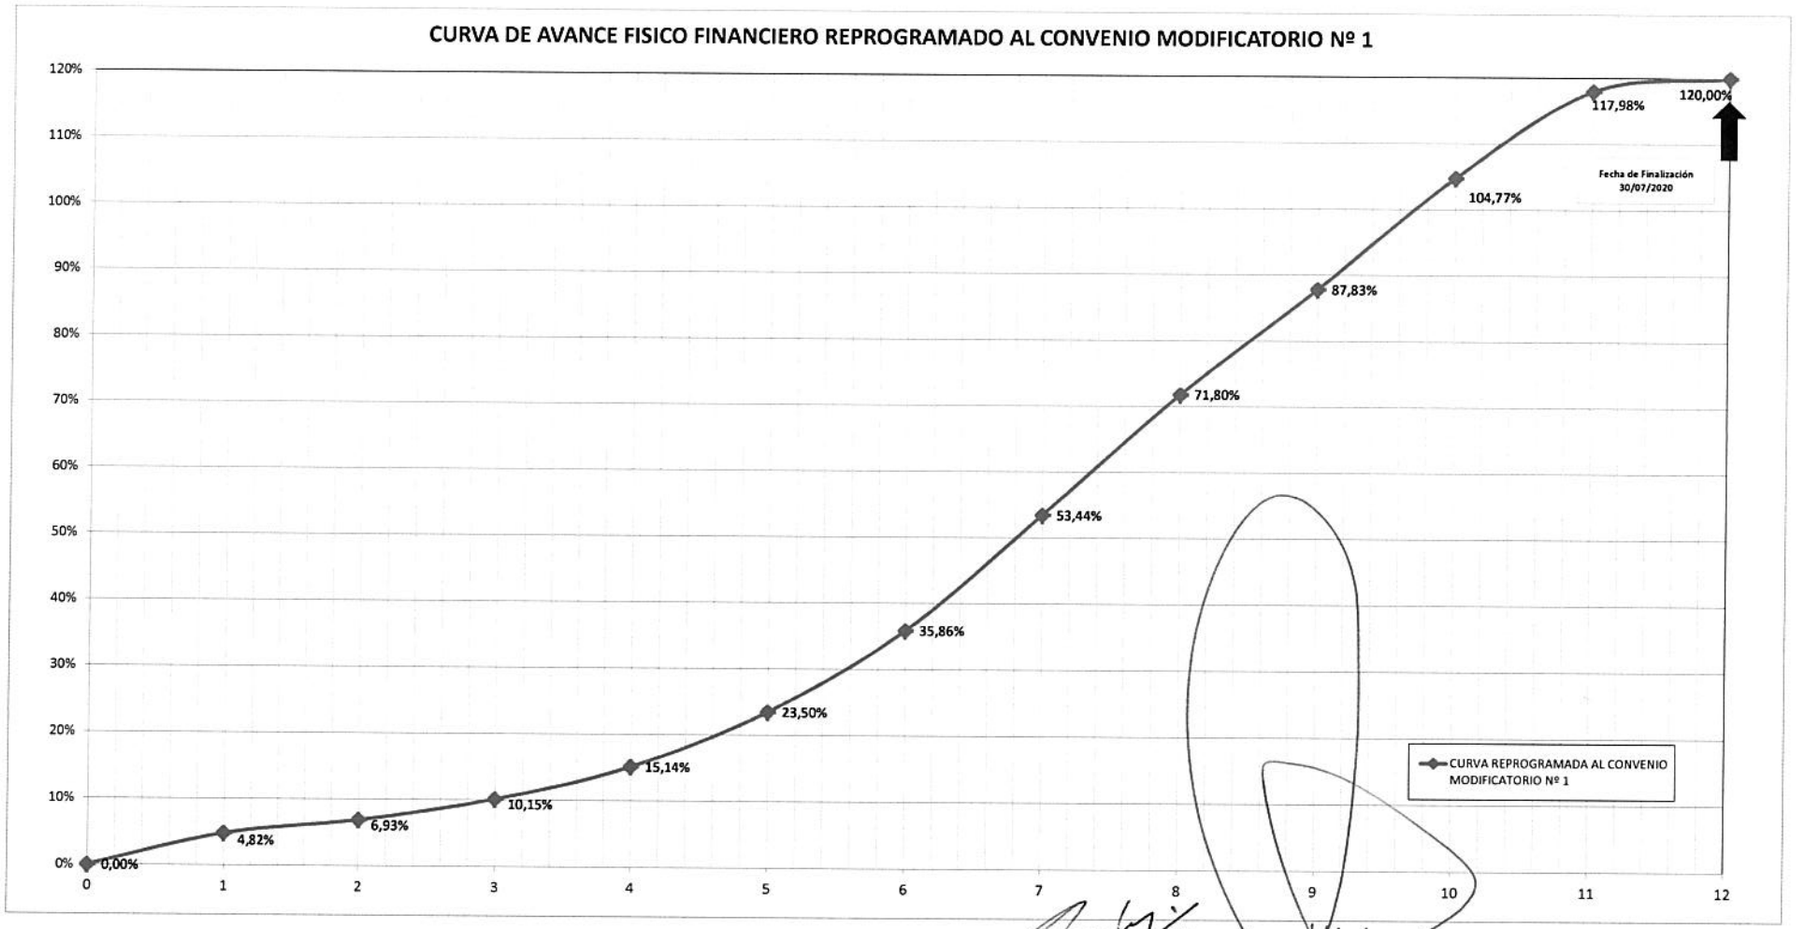

Ing. Nery Gómez
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

OMAR E. BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LOS TRIGALES S.A.

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
