121

ANEXO 6

NUEVA CURVA DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Ing. Aurelio Gauto
Fiscal de Obra
D.O.P - M.O.P.C.

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

Sara Blanco
Representante Legal

CONSORCIO

AGB CONSTRUCTORA TOCSA

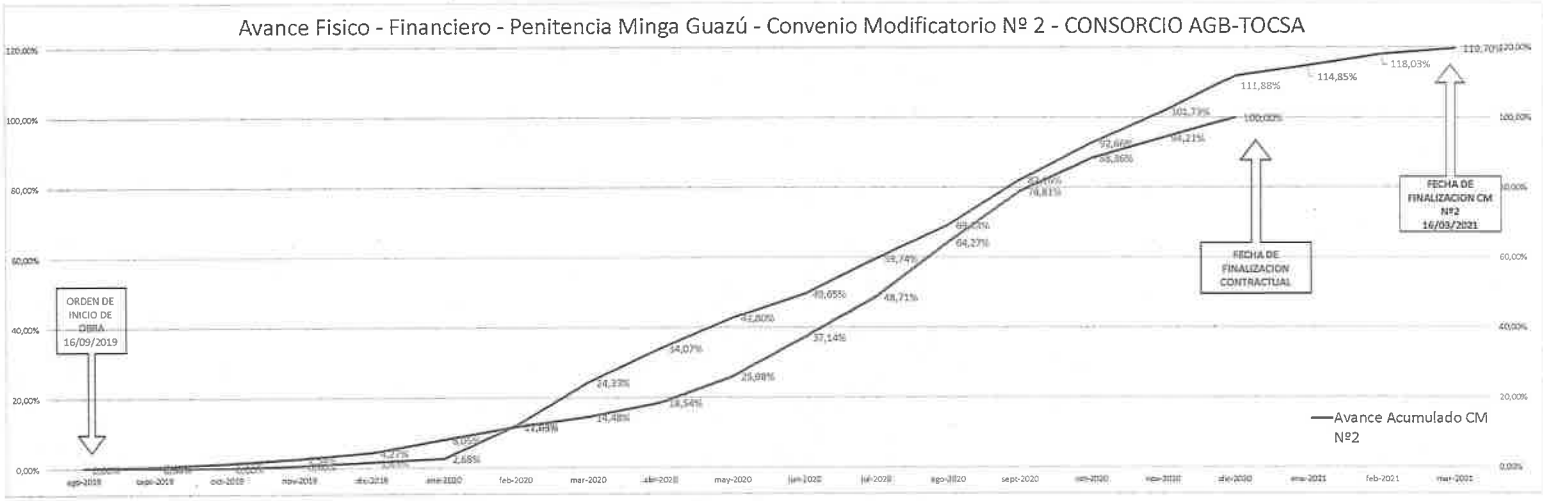

	Fecha	ago-2019	sept-2019	oct-2019	nov-2019	dic-2019	ene-2020	feb-2020	mar-2020	abr-2020	may-2020	jun-2020	jul-2020	ago-2020	sept-2020	oct-2020	nov-2020	dic-2020	ene-2021	feb-2021	mar-2021
CRONOGRAMA CONTRACTUAL	Avance Mensual	0,00%	0,41%	0,82%	1,31%	1,73%	3,78%	3,58%	2,85%	4,06%	7,44%	11,16%	11,57%	15,56%	14,54%	9,55%	5,85%	5,79%			
	Avance Acumulado Contractual	0,00%	0,41%	1,23%	2,54%	4,27%	8,05%	11,63%	14,48%	18,54%	25,98%	37,14%	48,71%	64,27%	78,81%	88,36%	94,21%	100,00%			
CRONOGRAMA CONVENIO MODIFICATORIO Nº2	Avance Mensual	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	1,03%	1,05%	9,36%	12,29%	9,74%	8,73%	6,85%	10,09%	9,49%	12,94%	10,50%	9,07%	10,14%	2,98%	3,17%	1,67%
	Avance Acumulado CM Nº2	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	1,63%	2,68%	12,04%	24,33%	34,07%	42,80%	49,65%	59,74%	69,23%	82,16%	92,66%	101,73%	111,88%	114,85%	118,03%	119,70%

Ing. Aurelio Gauto
Fiscal de Obra
D.O.P - M.O.P.C.

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

Sara Blanco
Representante Legal

(ochenta y seis) 86

180
