LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA L/ ... S DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LAS DEPARTAMENTOS ...

GRUPO 3

IDE Nº: 390.706

LOTE 3

TRAMO: ABAI - GENERAL MORINIGO

DEPARTAMENTO CAAZAPÁ

LOTE 3 (0+000 - 14+910) L= 14,92 km

CRONOGRAMA REPROGRAMADO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Fecha Rev. 2/02/24

	Días de lluvias más días de humedales	20	21	18	16	13	15	17	23	16	4	11	11	20	14	18	15	9	11	14	19	21						
	(Días de lluvias más días de humedales) - 8	12	13	9	11	5	7	9	15	2	-4	3	3	12	6	10	3	1	3	14	19	21						
ITEM	DESCRIPCIÓN	may-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Movilización y Desmovilización	60,00%																							39,980		100,00%
2	Construcción y Mantenimiento de camino y obra de arte auxiliar			4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%								100,00%
3	Mantenimiento del Tránsito temporal y Seguridad Vial			4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%								100,00%
4	Cartel de Obra	65,00%	35,00%																								100,00%
5	Desbosque, Desarraigo y Despeje	8,00%	8,00%	16,73%	16,00%	16,00%	15,00%	15,00%	13,00%	3,00%																	100,00%
6	Excavación no Clasificada				10,00%	13,00%	13,00%	21,00%	9,00%	12,00%	12,00%																100,00%
7	Excavación de Bolsones							14,77%	2,00%	12,73%	20,00%	20,00%															100,00%
8	Excavación de Zanjas de Drenaje							14,77%	7,00%	12,73%	20,00%	20,00%															100,00%
9	Terraplenes (incluye relleno de sub rasante CBR ≥ 10%)					7,73%	8,13%	8,13%	8,94%	8,94%	8,94%	7,73%	7,73%	4,04%	4,04%	4,04%	7,73%	21,02%									100,00%
10	Remoción de Obras de Arte					38,84%	34,00%	27,27%																			100,00%
11	Remoción de Cabecera de ACH"A" 3-2,00 x 2,00							36,00%	40,91%																		100,00%
12	Traslado de Alambrados					4,00%	7,00%	4,00%	2,00%	10,10%	12,12%	5,00%	5,00%	8,00%	13,13%	13,13%											100,00%
13	Traslado de Cables/redes Eléctricas					22,73%	22,73%	13,73%	31,82%																		100,00%
14	Traslado de cañerías de agua				16,00%	36,00%	36,00%																				100,00%
15	Sub Base Macadam Hidráulico (CBR ≥ 80%)								3,14%	3,00%	11,00%	6,44%	8,00%	4,00%	7,27%	3,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	7,23%	3,00%	3,00%				100,00%
16	Base Granular Estabilizada 90/10 (CBR ≥ 100%)												10,00%	3,00%	5,00%	6,00%	10,00%	11,00%	11,00%	10,00%	11,00%	4,00%	3,00%				100,00%
17	Imprimación Asfáltica												13,00%	3,00%	3,00%	4,00%	13,00%	11,00%	11,00%	10,00%	11,37%	4,00%	3,00%	21,63%	22,00%		100,00%
18	Riego de Liga															9,00%	14,00%	13,00%	14,10%	11,77%	6,00%	14,23%	12,23%				100,00%
19	Tratamiento Superficial Simple en Banquina																	11,00%	12,27%	10,40%	7,10%	9,00%	10,00%	20,20%			100,00%
20	Carpeta de Concreto Asfáltico												11,10%	10,27%													100,00%
21	Relleno Granular					12,84%	11,34%	6,45%	8,30%	10,10%	10,87%	14,20%	14,20%														100,00%
22	ATH"A" ND 1,00 m					12,84%	11,84%	6,45%	8,30%	10,10%	10,87%	14,20%	14,20%														100,00%
23	ATH"A" ND 1,00 m								11,91%	18,48%	18,84%																100,00%
24	ATH"A" ND 1,20 m									18,48%	10,00%	1,68%															100,00%
25	ATH"A" ND 1,20 m								10,91%	20,00%	20,34%	18,75%															100,00%
26	ACH"A" 1 1,00 x 1,00									12,77%	18,88%	17,00%	21,88%	8,36%													100,00%
27	ACH"A" 2 1,50 x 1,50								10,87%	11,00%	18,33%	14,73%															100,00%
28	ACH"A" 1 2,00 x 2,00									10,04%	17,17%	17,93%	10,88%	12,73%													100,00%
29	ACH"A" 3 3,00x3,00														4,00%	8,00%	10,00%	11,00%	11,00%	13,37%	7,00%	3,23%	23,39%				100,00%
30	Cuneta revestida de Concreto																	12,00%	11,00%	13,00%	8,37%	3,00%	33,00%				100,00%
31	Disipadores de Energía													42,00%	34,00%												100,00%
32	Prolongación de ACH"A"2 2,00 x 2,00														72,73%	27,27%											100,00%
33	Construcción de Cabecera de ACH"A"3 2,00 x 2,00																						33,00%	33,00%			100,00%
34	Señalización Vertical																				38,00%	18,00%	18,00%				100,00%
35	Pórticos de Señalización																				17,00%	7,00%	25,00%	25,00%	26,00%		100,00%
36	Señalización Horizontal																				23,13%	16,30%	23,23%	13,33%			100,00%
37	Barandas Metálicas de Contención																							50,00%	50,00%		100,00%
38	Tachas Reflectivas																							50,00%	50,00%		100,00%
39	Tachas Reflectivas																				35,00%	15,00%	50,00%				100,00%
40	Postes de Kilometraje															1,00%	14,34%	16,91%	14,34%	20,12%	6,11%	16,67%					100,00%
41	Protección Vegetal de Taludes																	17,22%	15,56%	7,11%							100,00%
42	Protección de Áreas de Préstamos																		21,00%	15,00%	8,11%	7,00%	24,39%	14,00%			100,00%
43	Casas de Resguardo Peatonal																		22,00%	17,00%	13,00%	19,00%	28,00%				100,00%
44	Iluminación Intersección Prog. 14+920																										100,00%
45	Instalaciones y servicios especializados	40,00%	5,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,27%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%								100,00%
46	Reflección de las oficinas administrativas de la sección en San Juan Nepomuceno y de la base en Boquerón (DISTRITO Nº 6 CAAZAPÁ)							11,82%	4,00%	19,10%	20,00%	17,27%	17,27%	9,00%													100,00%
47	Implementación del PGA-DIA	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%							100,00%
	% Mes. (Reprogramado 3 por inclemencias)	2,51%	0,10%	0,21%	0,27%	1,12%	1,03%	1,51%	1,63%	4,62%	9,11%	3,91%	5,64%	3,30%	4,33%	3,02%	5,44%	12,02%	11,08%	7,10%	4,02%	3,12%	8,91%	5,78%	0,85%		
	% Acum. (Reprogramado 3 por inclemencias)	2,51%	2,64%	2,87%	3,14%	4,27%	5,30%	6,81%	8,44%	14,06%	23,19%	27,10%	32,74%	36,04%	40,37%	43,39%	48,83%	60,85%	71,93%	79,03%	83,05%	86,17%	95,08%	100,86%	101,71%		

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa

Ing. Antonio N. Pangrazio
Representante Legal

Ing. ... Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Miguel Angel Rivelli
Jefe DPTO. CAPACITACIÓN
DCV - MOPC

JS (Quince)

LLAMADO MOPC N° 44/2021

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA

GRUPO 3

IDE N°: 398.706

TRAMO: ABAI - GENERAL MORINIGO

DEPARTAMENTO CAAZAPA

LOTE 3 (0+000 - 14+919) L= 14,92 km

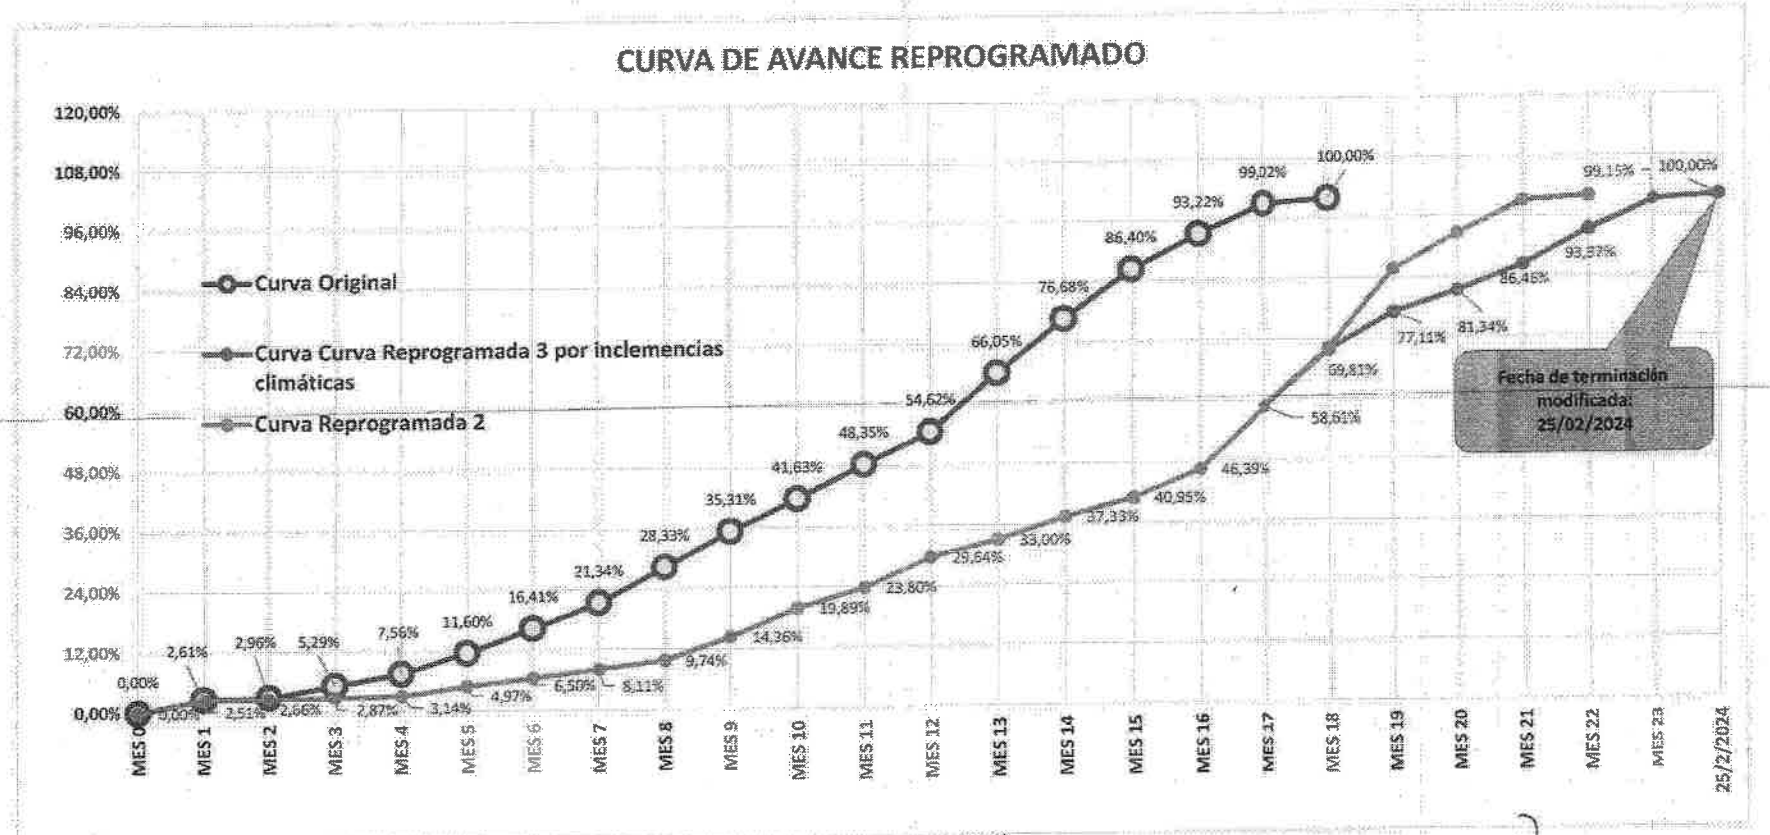

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa

Ing. Antonio N. Fernández
Representante Legal

Miguel Angel Rivelli
Director de Contraparte
DCV - MOPC

Ing. Enrique L. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DEV - MOPC

14 (catorce)
