Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI Nº 461/2020

A: **Abog. Yenny Carolina Ovelar de Torres.** Coordinadora
Coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones.

DE: **Arq. Patricia Josefina estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

FECHA: 30 / abril /2020

ASUNTO: Solicitud de Prorrogas por Inclemencias **Climáticas– Contrato N° 10/2019 - Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí.** CVE "Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas – - Plurianual - ID N° 356.937

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en consideración presenta la solicitud de **Prorrogas por Inclemencias Climáticas** correspondiente al **Contrato Nº 10/2019, del Periodo 3 - Mes de Marzo/ 2020,** con los siguientes: **Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí,** según el Informe de la Fiscalizacion C.P.I UEPP/ en adjunto con los Deptos. y obras adjudicadas la "Empresa **Constructora Sociedad Constructora Chaco S.A.";** en el marco de la **CVE 01/2019** de referencia: **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS"** - Plurianual – **ID N° 356937.** Conforme al siguiente:

CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, en el plazo de ejecución de las obras correspondientes al Contrato Nº 10/2019, a cargo de la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.** Periodo N° 3 - MARZO

1 - CUADRO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÀTICAS				
Nº	**MES**	**CANT. DE LLUVIAS - DINAC**	**INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras**	**DÍAS ACUMULADOS**
3	MARZO /2020	6	6	6
			TOTAL	**6**

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio MEC)
Tel: (595.21)452380/2

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Entregado por: MEC
Recibido por: Jose
DIA 19 | MES 05 | AÑO 2020 | HORA 11:00

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**

CGC 23.1 Prórroga de los Plazos

- Fuerza Mayor.

- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: según los Certificados de uso de Tiempo presentado por el fiscal en las Certificaciones de obra, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obra correspondiente y de sus incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe con imágenes del estado debido a las inclemencias climáticas.

Condiciones Generales del Contrato (CGC), apartado C. Plazos

25. Inclemencias climáticas

25.1 En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

25.2 Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

25.3 Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Corresponde remitir la contabilización de la suspensión por lluvias e incidencias del mes de Marzo de 2020, **APROBADA** por la **fiscalización** de la **CPI UEPP**, por Informe a la CPI/UEPP Nº /2020/ correspondiente a los LOTES, del Contrato N° 10/19.

Atendiendo a lo solicitado y la documentación entregada, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, recomienda la **aprobación de la prórroga del plazo** de ejecución de obras por **6 (seis) días calendarios** por inclemencias climáticas del Contrato N° 10/2019 – correspondiente a los Lote Nº 2, N°4, N° 5, N° 6 según los Dptos. y dar continuidad a los trámites pertinentes.

Atentamente. **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** Coord. UEPP MEC

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Ávila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea Pend. 2020\JUNIO.2020\EDI.Fiscal.Grupo-LLuvia-14.Juli.20\3 Marzo EDI MEMO 06-20.uc.docx

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI – FEDI - Nº 009 /2020

A: **Arq. Patricia Josefina estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

DE: **Arq. Catherine Larrieur,** FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Arq. Guillermo Godoy, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Arq. Graćiela Acosta, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Arq. Catalina Rojas Pukall, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Ing. Jorge Augusto Paganetti, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP

FECHA: 30/ abril /2020

ASUNTO: . Solicitud de Prorrogas por Inclemencias **Climáticas – Contrato Nº 10/2019 – Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí** ,CVE "Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con técnicas Constructivas mixtas – Plurianual - ID N° 356. 937..

Los Fiscales asignados por la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en consideración presentan, la solicitud de Prorrogas por Inclemencias **Climáticas– Contrato Nº 10/2019 – Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí,** del **PERIODO N° 3 MARZO /20,** en el marco de la CVE N° 01/2019 de referencia: **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL – ID N° 356937,** adjudicada a la Empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**
Conforme al siguiente Cuadro de Resumen

V° B°

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea.Abril.21.5.20\Tarea.JUNIO.2020\EDI.Fiscal.Grupo-LLuvia-14.Juli.20\3 Marzo EDI MEMO 06-20.uoc

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, en el plazo de ejecución de las obras correspondientes al Contrato Nº 10/2019 - Lotes N° 2, N° 4 Nº 5, N° 6 , del **Periodo N° 3. MARZO**

1 - CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÀTICAS				
Nº	**MES**	**CANT. DE LLUVIAS - DINAC**	**INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras**	**DÍAS ACUMULADOS**
3	MARZO /2020	6	6	6
			TOTAL	**6**

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**

CGC 23.1 Prórroga de los Plazos

- Fuerza Mayor.

- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: según los Certificados de uso de Tiempo presentado por el fiscal en las Certificaciones de obra, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obra correspondiente y de sus incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe con imágenes del estado debido a las inclemencias climáticas.

Condiciones Generales del Contrato (CGC), apartado C. Plazos

25. Inclemencias climáticas

25.1 En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

25.2 Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

25.3 Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Ing. Catalina Rojos Pukan
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Catherine Larrieu
ARQUITECTA
Reg. 3.074

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea.Abril.21.5.20\Tarea.JUNIO.2020\EDI.Fiscal.Grupo-LLuvia-14.Juli.20\3 Marzo EDI MEMO 06-20.uoc.lluvia.02.docx

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Corresponde remitir la contabilización de la suspensión por lluvias e incidencias del mes de **Marzo de 2020**, habiendo verificado los documentos dan por **APROBADO** por la **Fiscalización** de la **CPI UEPP**, por Informe a la CPI/UEPP N° /2020/ según los Lotes correspondientes al Contrato N° 10/19 , por un total de **6 (seis) días** calendarios.

Corresponde a los siguientes Lotes del Contrato N° 10/19:

a. Lotes: N° 2 – N° 4 –N° 5 – N° 6 por Departamentos
   a. L2 | GUAIRÁ – CAAZAPA
   b. L4 | CENTRAL
   c. L5 | ALTO PARANA
   d. L6 | PARAGUARI – ASUNCIÓN
b. Cantidad de establecimientos.: 10
c. Contratista SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A
d. Fiscalización: CPI - UEPP – MEC
e. **INSTITUCIONES EDUCATIVAS:**

	LOTE 2
1	Escuela Básica N° 60 "Fray Luis Bolaños"-Vizcaíno Kue Depto. Caazapá
2	Escuela Básica N° 52 "Félix Pérez Cardozo"- Depto. Guaira
	LOTE N° 4
3	C.R.E. Saturio Ríos San Lorenzo. San Antonio- Dpto. Central
4	Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro –Ñemby. Rincón.D.Central
5	Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada. Lambaré. Palomar. Depto. Central
	LOTE N° 5
6	Esc. Bas. N° 1295 Virgen Del Rosario. Hernandarias Área 6- Alto Paraná
7	Esc. Bas. N° 1770 Mcal. Francisco S. López. Santa Rita. Unión- Alto Paraná
	LOTE N° 6
8	Esc. Bas. N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive. Pai Gómez. Depto. Paraguarí
	LOTE N° 6
9	Esc. Bas. N° 17 Republica del Perú. Asunción. Pte. Carlos Antonio López
10	Esc. Bas. N° 142 María Felicidad González. Asunción. Terminal

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Catherine Larrieux
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Fiscal de Obras
UEPP MEC

C:\Users\OBRAMIO\Desktop\Tarea.April.21.5.20\Tarea.JUNIO.2020\EDI.Fiscal.Grupo-LLuvia-14.Jul2020 Marzo EDI MEMO 06-20.uoc.lluvia.02.docx

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REFERENTE CVE N° 01/2019 — **Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas - Plurianual -MEC**
ID — **356937**
EMPRESA — **Sociedad Constructora Chaco S.A.**
CONTRATO — **10/2019**
MES/PERIODO — **MARZO 2020**
PRÓRROGA OTORGADA — **6 DÍAS**

CONTRATO 10/2019

CÁLCULO DE PRÓRROGA POR LLUVIAS E INCIDENCIAS

MES	LOTE N° 2 Dpto. Caazapá y Guairá				LOTE N° 4 Dpto. Central						LOTE N° 5 Dpto. Alto Paraná				LOTE N° 6 Dpto. Paraguarí - Asunción						TOTAL DE DÍAS OTORGADOS POR PERIODO
	Esc. Bás. N° 60 "Fray Luis Bolaños"-Dpto. Caazapá - Viskaino Kue		Esc. Bás. N° 52 "Félix Pérez Cardozo"-Dpto. Guairá - Centro		Centro Regional de Educación "Saturio Ríos"-San Lorenzo		Esc. Bás. N° 1463 "Divino Maestro"-Ñemby		Esc. Bás. N° 751 "Juan Pedro Escalada"-Lambaré		Esc. Bás. N° 1295 "Virgen del Rosario"-Hernandarias		Esc. Bás. N° 1770 "Mcal. Francisco S. López-Santa Rita		Esc. Bás. N° 77 "Alúm de Vivé"-Paraguarí		Esc. Bás. N° 17 "Rca. del Perú"-Asunción		Esc. Bás. N° 142 "María Felicidad González"-Asunción		
	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	
MARZO	5	3	3	2	4	2	4	2	4	2	3	3	3	3	4	2	4	2	4	2	**6**
Cantidad Total de días de prórroga	8		5		6		6		6		6		6		6		6		6		

Periodo **N° 3 MARZO** : en la contabilizacion del Plazos se consideran 6 Dias, observando el periodo por Fuerza Mayor (Pandemia COVID-19) y los días solicitados por prórrogas de lluvias e incidencias resultante de los siguientes dias hasta el 31 de Marzo /20.

INFORME: En las:
Esc. Bás. N° 60 "Fray Luis Bolaños" Dpto. Caazapá - Viskaino Kue — LOTE N° 2
Esc. Bás. N° 52 "Féliz Pérez Cardozo" Dpto. Guairá - Centro — LOTE N° 2
Se encuentran en trámite de ejecución de la Orden de Servicio N° 2 y a la Fecha no se considera la contabilización de las prórrogas por lluvias

Arq. Catalina Rojas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Guillermo Larrieu
ARQUITECTO
Reg. 3.074

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Se adjuntan copias de:

- Informe Fiscal Nº /20 CPI UEPP, y Documentos
- Registro de Precipitación Diaria – DINAC
- Cuadro de Incidencias relacionadas a las condiciones climáticas – Marzo/2020
- Libro de obras
- Registro fotográfico
-

Nos despedimos atentamente, no sin antes desearle una maravillosa jornada.

Arq. Catherine Larrieur,
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Arq. Catalina Rojas Pukall
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Arq. Guillermo Godoy
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Arq. Graciela Acosta
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Ing. Jorge Augusto Paganetti
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 9194
Recibido por: [illegible]
DIA | MES | AÑO | HORA
02 | 04 | 2020 | 13:00

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Asunción, 22 de marzo de 2020

Señora:
Arq. Patricia Josefina Sánchez de Avila
Coordinadora
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: "Contratación Vía Excepción Nº 01/2019: Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas constructivas alternativas mixtas. Plurianual. ID Nº 356937. Contrato Nº 10/2019: Lote 2: Guairá, Caazapá. Lote Nº 4: Central. Lote Nº 5: Alto Paraná. Lote Nº 6: Capital, Paraguarí.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en relación a los cálculos de afectación por días de lluvia, del mes de marzo de 2020 de nuestros Lotes de referencia. Conforme a las disposiciones, hemos realizado los ajustes y conteo de las incidencias climáticas, conforme al Libro de Obras e Informe de Registros de lluvia de la DINAC para el siguiente periodo.

LOCALIDADES - INSTITUCION	PERIODO DE CERTIFICADO	REGISTRO DINAC	AFECTACION EN OBRA POR EXCESO DE HUMEDAD	CANTIDAD DE DIA DE PRORROGA
CAAZAPÁ-Esc. Básica Nº 60 Comercio Fray luis de Bolaños-**CAAZAPA**,VISCAINO KUE	mar-20	5	3	7 Días
GUAIRÁ- Esc. Básica Nº 52 Félix Pérez Cardozo- **FELIX PEREZ CARDOZO**, CENTRO	mar-20	3	2	5 Días
CENTRAL- C.R.E. Saturio Ríos-**SAN LORENZO**, SAN ANTONIO	mar-20	4	2	6 Días
CENTRAL- Esc. Básica Nº 1463 Divino Maestro-**ÑEMBY**, RINCÓN	mar-20	4	2	6 Días
CENTRAL-Esc. Básica Nº 751 Juan Pedro Escalada-**LAMBARÉ**, PALOMAR	mar-20	4	2	6 Días
ALTO PARANÁ- Esc. Básica Nº 1295 Virgen del Rosario-**HERNANDARIAS**, ÁREA 6	mar-20	4	3	7 Días
ALTO PARANÁ- Esc. Básica Nº 1770 Mcal. Francisco Solano López-**SANTA RITA**, UNION	mar-20	4	3	7 Días
PARAGUARI- Esc. Básica Nº 77 Prof. Encarnación Alum de Vive-**PARAGUARI**, PA I GOMEZ	mar-20	4	2	6 Días
ASUNCIÓN-Esc. Básica Nº 17 **Republica del Peru**-ASUNCIÓN, PRESIDENTE CARLOS A. LOPEZ	mar-20	4	2	6 Días
ASUNCIÓN- Esc. Básica Nº 142 Ma. Felicidad González-ASUNCIÓN, **TERMINAL**	mar-20	4	2	6 Días

OBS: Se entrega a la fecha atendiendo a la dificultad de que la DINAC permaneció cerrado hasta el 19 de abril por la pandemia del COVID -19.

Sin nada más que agregar, me despido cordialmente.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Dirección: Pariri Nº 1013 casi Av. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550 283 • Sitio web: www.scc.com.py

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			0,0									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			0,0									
17			0,0									
18			14,3									
19			4,9									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,3									
28			15,8									
29			0,0									
30			0,0									
31			0,0									
Total			35									
Máx. 24h			15,8									
Día Máx.			28									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			0,0									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			0,0									
17			8,2									
18			14,7									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			2,2									
29			0,0									
30			0,0									
31			0,0									
Total			25									
Máx,24h			14,7									
Día Máx.			18									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CAAZAPÁ	26° 10' 31,70"	56° 21' 16,92"	142 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			0,0									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			0,0									
17			2,5									
18			24,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			3,6									
28			4,0									
29			0,0									
30			5,6									
31			0,0									
Total			40									
Máx. 24h			24									
Día Máx.			18									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Lic. María Lourdes Aveiro C.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			0,0									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			1,2									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			0,0									
17			0,0									
18			40,4									
19			4,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			19,4									
29			0,0									
30			0,0									
31			0,0									
Total			65									
Máx.24h			40,4									
Día Máx.			18									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
PARAGUARÍ	25° 37' 36,51"	57° 08' 44,99"	116 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			0,0									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			0,0									
17			0,0									
18			23,0									
19			23,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			5,0									
29			-									
30			0,0									
31			0,0									
Total			51									
Máx. 24h			23									
Día Máx.			18									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

IMÁGENES - ESTADO DE LAS OBRAS DEBIDO A INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Resumen General de Instituciones - Depto. N° X - Alto Parana

Distrito de Santa Rita - Esc. Bás. N° 1770 Mcal Francisco Solano López



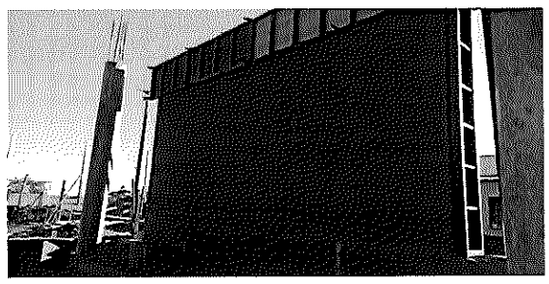

Distrito de Hernandarias - Escuela Básica N° 1295 "Virgen del Rosario"

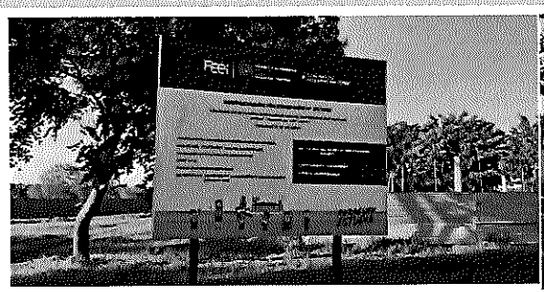

CONCLUSIÓN:

Por la situación geográfica de la ubicación de estas obras se registra un alto grado de humedad en el ambiente por las continuas lluvias, característica de la zona de la Cuenca del Río Paraná, de la Franja Atlántica.

En el Libro de Obras se observan registros de los días de lluvias, lo que ocasiona exceso de humedad en los materiales utilizados y a utilizarse durante la ejecución de las obras.

Considerando lo expuesto se concluye, según las circunstancias alegadas, que estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

La Fiscalización de Obras ha reportado que la cantidad de lluvias que se registraron y su intensidad, así como la cantidad de agua caída, han imposibilitado materialmente la ejecución de las obras, no solo los días de lluvias, sino los días posteriores en que se tuvo que aguardar que se escurrieran las lluvias.

El sitio considerado en donde se realizan las obras, en zonas del Alto Paraná, las lluvias alteran el estado normal del suelo de obra y de los materiales a ser utilizados. Durante la ejecución de las obras, en las condiciones señaladas, se preservan la seguridad y la calidad de las obras contratadas.

Por superposición en los días de suspensión de Actividades por motivos de la Pandemia - COVID-19. No se consideran los días que corresponden al periodo desde el 21 de Marzo hasta el 12 de Abril del 2020.

Es mi informe.

Arq. Catalina Rojas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000039

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACION: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC

DÍA: Sabado 07 marzo

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Avance por lluvias	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. Nº 10.395

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Catalina Rojas Pukoll
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Gráfica Bien Hecho - Avda. Blás Garay Km. 6 B° San Isidro - Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este
5 Tal. 50x3 Enum. 01 al 250 - 01/2020

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - IDN 356.937

N° 0000039

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Basica Nº 1770 Jiral Francisco Solano Lopez
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACION:	CPI UEPP MEC
SUPERVISOR:	JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC
DÍA: 07 de mayo de 2020	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Juan A. Roa Delgado
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Fabio Rojas Pukall
Jefe de Obras
UEPP - MEC
AL FISCALIZADOR

SUPERVISION

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000040

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACION: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC

DÍA: Lunes 9 de Marzo

CONTRATISTA	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Se culminan los cargas de pilares, cuanon las cagas de registro in Hormigon. Prosigue el compactado interno	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS: Se registran intensas lluvias a las 12:40 Horas en el Sitio de Obras.

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Juan E. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. Nº 10.395
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Rolas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP - MEC
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Gráfica Bien Hecho - Avda. Blás Garay Km. 6 Bª San Isidro - Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este
5 Tal. 50x3 Enum. 01 al 250 - 01/2020

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000041

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACION: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC

DÍA: Día martes 10 de marzo del 2020

CONTRATISTA Jesus	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Suspendido por lluvias en zona de Obras	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Juan Pablo Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. Nº 10.395

EMPRESA CONTRATISTA

Fiscal de Obras
CPI UEPP - MEC

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Gráfica Bien Hecho - Avda. Blás Garay Km. 6 B° San Isidro - Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este
5 Tal. 50x3 Enum. 01 al 250 - 01/2020

LICITACION VIA EXCEPCION N° 01/2019 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - IDN 356.937

N° 0000043

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Basica N° 1410 - Nicol Francisco Solano Lopez
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACION:	CPI UEPP MEC
SUPERVISOR:	JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC
DÍA: 18 de marzo de 2020	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Juan A. Roa Delgado
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Rojas Pukell
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

FISCALIZADOR

SUPERVISION

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - IDN 356.937

N° 0000049

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Basica Nº 1770 Jucal Francisco Solano López
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACION:	CPI UEPP MEC
SUPERVISOR:	JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC
DÍA: 19 de Mayo de 2020	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Se termina el cimiento PBC del bloque niños 0-1 año.-	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:	19 de mayo	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:	Desde 13 hs		
	FIN:	Hasta 17 hs.-		
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Se trabajo por la tarde mínima producción por llunes				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Hubo lluvia pero igual se trabajo.

Juan A. Roa Delgado
Arquitecto

Rolando Rojas Pukall
Fiscalizador de Obras
UEPP MEC

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISION

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000048

INSITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 20 de marzo 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Inicio periodo de cuarentena obligatoria por Decreto del Poder del Estado. La empresa acata la misma por seguridad de sus obreros, se orienta al escaso personal.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS: Se registran intensas lluvias caídas en la zona de Obras

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. Nº 10.395

EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Rolando Rukoll
Jefe de Obras
UEPP MEC

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Gráfica Bien Hecho - Avda. Blás Garay Km. 6 B° San Isidro - Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este
5 Tal. 50x3 Enum. 01 al 250 - 01/2020

...VIA EXCEPCION N° 01/2019 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - IDN 356.937

N° 0000051

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	Ex Escuela Nº 1470 "Neal Francisco Zotano Lopez"
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACION:	CPI UEPP MEC
SUPERVISOR:	JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC
DÍA: 31 de marzo de 2020	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Del 21 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2020 sin actividad por el decreto del gobierno Nacional. (Covid-19). - escaso personal en Obra.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS	Se registran intensas lluvias acontecidas en sitio de Obras.			

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Juan A. Roa Delgado
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Rojas Pukall
Jefe de Obras
FISCALIZADOR
UEPP MEC

SUPERVISION

"PROYECTO CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - IDN 356.937

N° 0000056

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Básica Nº 1470 - Fiscal Francisco Solano López
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACION:	CPI UEPP MEC
SUPERVISOR:	JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC
DÍA: 27 de mayo de 2020	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por emergencia sanitaria según Resoluciones del Gobierno Nacional	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS	Se registran intensas lluvias plantearadas en la zona de Obras			

INCIDENCIAS

DÍA: TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Juan A. Roa Delgado
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Diana Rojas Pukall
Fiscal de Obras
CPI - MEC

FISCALIZADOR

SUPERVISION

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000057

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACION: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC

DÍA: 28/03/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Garantizar a, escazos personal en sitio de Obras, se orienta sobre la protección, y seguridad acorde a las medidas Sanitarias.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS: Se suspenden las actividades por las intensas lluvias caidas en el sitio de Obras..

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. N° 10.395

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

Gráfica Bien Hecho - Avda. Blás Garay Km. 6 B° San Isidro – Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este
5 Tal. 50x3 Enum. 01 al 250 - 01/2020

LICITACION N° 01/2019 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - IDN 356.937

N° 0000057

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	Cre. Boxen N° 1770 Nicol + comunidad Loreto Cápe
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACION:	CPI UEPP MEC
SUPERVISOR:	JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC
DÍA: 28 de marzo de 2020	

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS:

Sin actividad por emergencia sanitaria. Cierre fronteras, toque de queda y escaso personal en sitio de Obra

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS		Se registran intensas lluvias acontecidas en el sitio de Obras		

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Juan A. Roa Delgado
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Rojas Pukall
Jefe de Obras
UEPP MEC

FISCALIZADOR

SUPERVISION

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000035

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 03/03/2020 - Martes

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
(1) Cimiento de piedra bruta	Seguimiento general.
(2) Encofrado de vigas de fundación	
(3) Armaduras de vigas de fundación	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H. 0021-1939 (Sede 494 (Ex Proyectadas) c/ Moreno)
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 630-000 / 665 920 - 02 Tal: 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000036

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DÍA: 04/03/2020 - Miercoles

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
(1) Encofrado de vigas de fundación	* Seguimiento y verificación de armaduras.
(2) Armaduras de vigas de fundación	
(3) Cargamento de vigas de fundación bloque comedor y administración. Con H 250	
(4) Se hicieron prueba de asentamiento y se extrajeron probetas	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Sin lluvias				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL C.H. Mariscal Estigarribia Casi Ruta Nº 5 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000047

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: ~~18/03/2020 Martes~~ 18/03/2020 Miercoles.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
-Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Lluvioso 14,3 mm		√ REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreno
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000048

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: ~~19/03/2020 Miércoles~~ 19/03/2020 Jueves

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Desencofrado de viga.	
- Suspención de actividad inicio de lloviznas.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: lluvia 4,9 mm		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA BHENECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tel. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000066

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 142 María Felicidad González
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 18-03-2020 - Miercoles

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
1) Encofrado de muros de Tapial	Actividad Suspendida.
Se suspende toda actividad por Lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 18-03-2020 - Miercoles		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 09:00			
	FIN: 14:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) - Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000067

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 142 María Felicidad González
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 19-03-2020 – Jueves

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por Lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 19-03-2020 – Jueves		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 08:00			
	FIN: 17:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Mayobs.
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000045

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: (2) 18 - 19 - 20 MARZO - 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR	
lluvias y sus afectaciones	
- MIERCOLES 18 lluvia	
- JUEVES 19 lluvia	
- Viernes 20 afectación	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3074

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL C.H. (Con Sistema de Numeración Proyectada) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Teléfono: 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000051

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 21-03-2020 - Sábado

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Del 21-03 al 31-03-2020	
sin Actividad en Obra por	
resolución del gobierno nacional	
(Covid-19)	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - Cel. 0981/ 036 - Sede N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 571 630 / 0961 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDNº 356.937

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000048

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 18/03/2020 - Miercoles

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
(1) Cimiento de piedra bruta	Lluvia.
(2) Armadura de pilares	
(3) Encofrado y cargamento de pilares	
Se suspende actividad por lluvia.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Miercoles 18-03-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 9:30			
	FIN: 13:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 Cel. 0971 671 030 / 0961 665 920 - 02 Tel. 503 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL - IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0019

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BÁSICA N°17 REPÚBLICA DEL PERÚ
EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI - UEPP - MEC

DIA: 23/03/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Cuarentena por pandemia Covid-19				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: CUARENTENA POR PANDEMIA COVID-19

SANDRA ELENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 530 / 0981 665 920 - 03 Tal. 50x3 - 0001/00150 - Marzo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL - IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0020

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BÁSICA N°17 REPÚBLICA DEL PERÚ
EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI - UEPP - MEC

DIA: 24/03/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: PANDEMIA COVID-19
Cuarentena

SANDRA LEENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 03 Tal. 50x3 - 0001/00150 - Marzo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL - IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0021

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BÁSICA N°17 REPÚBLICA DEL PERÚ
EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI - UEPP - MEC

DIA: 25/03/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES: CUARENTENA POR PANDEMIA COVID - 19

SANDRA ELENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479982-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 03 Tal. 50x3 - 0001/00150 - Marzo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL - IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0022

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BÁSICA N°17 REPÚBLICA DEL PERÚ
EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI - UEPP - MEC

DIA: 26/03/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: CUARENTENA POR PANDEMIA COVID-19

SANDRA ELENA RHEINECK
Arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL - IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0023

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BÁSICA N°17 REPÚBLICA DEL PERÚ
EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI - UEPP - MEC

DIA: 27 / 03 / 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: CUARENTENA POR PANDEMIA COVID -19

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA	FISCALIZADOR	SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 885 920 - 03 Tal. 50x3 - 0001/00150 - Marzo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL - IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0016

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BÁSICA N°17 REPÚBLICA DEL PERÚ
EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI - UEPP - MEC

DIA: 18/03/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 18/03/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: -Armado de viga - Excavaciones Tarea de fuster				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
ARQUITECTA

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 565 920 - 03 Tal. 50x3 - 0001/00150 - Marzo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000068

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 21/03/2020 SABADO

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
-Del 21-03 al 30-03-2020 sin actividad en el sitio de obra por resolución del gobierno nacional (covid-19)	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Olga Sanabria

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N° 21.059 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 865 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000069

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 31 de marzo 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad sigue el decreto (covid 19)	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Ing. Rosa Zanabria

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL / C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Motores
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000065

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 18/03/2020 MIÉRCOLES

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad por lluvia.	OBS: S/A.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: MIÉRCOLES 18/03/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 08:00			
	FIN: 17:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:		✓		

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.I. 1.000.000 (15 Proyectadas) c/ Moreles
RUC: 479062-0 - Tel.(021) 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000066

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 18/03/2020 JUEVES.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad por lluvia.	OBS: S/A.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: JUEVES 18/03/2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 08:00			
	FIN: 17:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:		✓		

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N° 1739 - Sta. Rosa (Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: (021) 514 000 / 0981 [illegible] 520 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO
