Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI Nº 383 /2020

A: **Abog. Yenny Carolina Ovelar de Torres.** Coordinadora
Coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones.

DE: **Arq. Patricia Josefina estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

FECHA: 31 / marzo /2020

ASUNTO: Solicitud de Prorrogas por Inclemencias **Climáticas– Contrato N° 10/2019 - Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí.** CVE "Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas – Plurianual - ID N° 356.937

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en consideración presenta la solicitud de **Prorrogas por Inclemencias Climáticas** correspondiente al **Contrato N° 10/2019, del Periodo 2 - Mes de Febrero/ 2020,** con los siguientes: **Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí,** según el Informe de la Fiscalizacion C.P.I UEPP/ en adjunto según los Deptos., y obras adjudicada a la "Empresa **Constructora Sociedad Constructora Chaco S.A.";** en el marco de la **CVE 01/2019** de referencia: **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS"** - PLURIANUAL – **ID N° 356937.** Conforme al siguiente:

CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, en el plazo de ejecución de las obras correspondientes al Contrato Nº 10/2019, a cargo de la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.** Periodo N° 2- FEBRERO

1 - CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÀTICAS				
Nº	**MES**	**CANT. DE LLUVIAS - DINAC**	**INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras**	**DÍAS ACUMULADOS**
2	FEBRERO /2020	11	11	11
			TOTAL	**11**

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea.Abril.21.5.20\Tarea.JUNIO.2020\EDI.Fiscal.Grupo-LLuvia-14.Juli.20\2 Febrero EDI MEMO 05-20.uoc.lluvia.02 -.docx

Coordinación General de Programas y Proyectos - MEC
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Nº Exp. 293
Entregado por:
Recibido por: FERNANDO

DIA	MES	AÑO	HORA
19	05	2020	11:00

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**

CGC 23.1 Prórroga de los Plazos

- Fuerza Mayor.

- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: según los Certificados de uso de Tiempo presentado por el fiscal en las Certificaciones de obra, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obra correspondiente y de sus incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe con imágenes del estado debido a las inclemencias climáticas.

Condiciones Generales del Contrato (CGC), apartado C. Plazos

25. Inclemencias climáticas

25.1 En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

25.2 Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

25.3 Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Corresponde remitir la contabilización de la suspensión por lluvias e incidencias del mes de Febrero de 2020, **APROBADA** por la **fiscalización** de la **CPI UEPP**, por Informe a la CPI/UEPP Nº /2020/ correspondiente a los LOTES, del Contrato N° 10/19.

Atendiendo a lo solicitado y la documentación entregada, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, recomienda la **aprobación de la prórroga del plazo** de ejecución de obras por **11 (once) días calendarios** por inclemencias climáticas del Contrato N° 10/2019 – correspondiente a los Lote Nº 2, N°4, N° 5, N° 6 según los Dptos. y dar continuidad a los trámites pertinentes.

Atentamente. **Arq. Patricia Josefina estela Sánchez Flores de Ávila.** Coord. UEPP MEC

Arq. Patricia J. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e intercultu[illegible] el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI – FEDI - Nº 007 /2020

A: **Arq. Patricia Josefina estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora Coordinación de Proyectos de Infraestructura

DE: **Arq. Catherine Larrieur,** FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Arq. Guillermo Godoy, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Arq. Graciela Acosta, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Arq. Catalina Rojas Pukall, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Ing. Jorge Augusto Paganetti, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP

FECHA: 31 / marzo /2020

ASUNTO: . Solicitud de Prorrogas por Inclemencias **Climáticas – Contrato Nº 10/2019 – Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí** ,CVE "Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con técnicas Constructivas mixtas – Plurianual - ID N° 356. 937.

Los Fiscales asignados por la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en consideración presentan, la solicitud de Prorrogas por Inclemencias **Climáticas– Contrato Nº 10/2019 – Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí,** del **PERIODO N° 2 FEBRERO /20,** en el marco de la CVE N° 01/2019 de referencia: **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL – ID N° 356937,** adjudicada a la Empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**

Conforme al siguiente Cuadro de Resumen

Vº Bº

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Ávila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e integralidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, en el plazo de ejecución de las obras correspondientes al Contrato Nº 10/2019 - Lotes N° 2, N° 4 Nº 5, N° 6 , del **Periodo N° 2 FEBRERO**

1 - CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÀTICAS				
Nº	**MES**	**CANT. DE LLUVIAS - DINAC**	**INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras**	**DÍAS ACUMULADOS**
2	FEBRERO /2020	11	11	11
			TOTAL	**11**

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**

CGC 23.1 Prórroga de los Plazos

- Fuerza Mayor.

- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: según los Certificados de uso de Tiempo presentado por el fiscal en las Certificaciones de obra, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obra correspondiente y de sus incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe con imágenes del estado debido a las inclemencias climáticas.

Condiciones Generales del Contrato (CGC), apartado C. Plazos

25. Inclemenciás climáticas

25.1 En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

25.2 Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

25.3 Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Graciela Rojas Duarte
Fiscal de Obras
UEP - MEC

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Rosana de Larrieu
ARQUITECTA
Reg. 3.074

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea.Abril.21.5.20\Tarea.JUNIO.2020\EDI.Fiscal.Grupo-Lluvia-14.Juli.20\2 Febrero EDI MEMO 05-20.doc.lluvia.02 -.docx

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Corresponde remitir la contabilización de la suspensión por lluvias e incidencias del mes de **Febrero de 2020**, habiendo verificado los documentos dan por **APROBADO** por la **Fiscalización** de la **CPI UEPP**, por Informe a la CPI/UEPP N° /2020/ según los Lotes correspondientes al Contrato N° 10/19 , por un total de **11 (once) días** calendarios.

Corresponde a los siguientes Lotes del Contrato N° 10/19:

a. Lotes: N° 2 – N° 4 –N° 5 – N° 6 por Departamentos
   a. L2 | GUAIRÁ – CAAZAPA
   b. L4 | CENTRAL
   c. L5 | ALTO PARANÁ
   d. L6 | PARAGUARI – ASUNCIÓN
b. Cantidad de establecimientos.: 10
c. Contratista SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A
d. Fiscalización: CPI - UEPP – MEC
e. **INSTITUCIONES EDUCATIVAS:**

	LOTE 2
1	Escuela Básica N° 60 "Fray Luis Bolaños"-Vizcaíno Kue Depto. Caazapá
2	Escuela Básica N° 52 "Félix Pérez Cardozo"- Depto. Guaira
	LOTE N° 4
3	C.R.E. Saturio Ríos San Lorenzo. San Antonio- Dpto. Central
4	Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro –Ñemby. Rincón.D.Central
5	Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada. Lambaré. Palomar. Depto. Central
	LOTE N° 5
6	Esc. Bas. N° 1295 Virgen Del Rosario. Hernandarias Área 6- Alto Paraná
7	Esc. Bas. N° 1770 Mcal. Francisco S. López. Santa Rita. Unión- Alto Paraná
	LOTE N° 6
8	Esc. Bas. N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive. Pai Gómez. Deptó. Paraguarí
	LOTE N° 6
9	Esc. Bas. N° 17 Republica del Perú. Asunción. Pte. Carlos Antonio López
10	Esc. Bas. N° 142 María Felicidad González. Asunción. Terminal

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Guillermo Godoy
Jefe de Obras
MEC

Catherine Larrieu
ARQUITECTA
Reg. 3.074

C:\Users\USUARIO\Desktop\Área Abril.21.5.22\Tareas\JUEGO 2020\EDI.Fiscal.Grupo-ALTO 14.Jul.20 Febrero EDI MEMO 05-20.doc.lluvia.02 -.docx

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REFERENTE CVE Nº 01/2019 — **Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas - Plurianual -MEC**
ID — **356937**
EMPRESA — **Sociedad Constructora Chaco S.A.**
CONTRATO — **10/2019**
MES/PERIODO — **FEBRERO 2020**
PRÓRROGA OTORGADA — **11 DÍAS**

CONTRATO 10/2019

CÁLCULO DE PRÓRROGA POR LLUVIAS E INCIDENCIAS

MES	LOTE Nº 2 Dpto. Caazapá y Guairá				LOTE Nº 4 Dpto. Central						LOTE Nº 5 Dpto. Alto Paraná				LOTE Nº 6 Dpto. Paraguarí - Asunción						TOTAL DE DÍAS OTORGADOS POR PERIODO
	Esc. Bás. Nº 60 "Fray Luis Bolaños"-Dpto. Caazapá - Viskaino Kue		Esc. Bás. Nº 52 "Félix Pérez Cardozo"-Dpto. Guairá - Centro		Centro Regional de Educación "Saturio Ríos"-San Lorenzo		Esc. Bás. Nº 1463 "Divino Maestro"-Ñemby		Esc. Bás. Nº 751 "Juan Pedro Escalada"-Lambaré		Esc. Bás. Nº 1295 "Virgen del Rosario"-Hernandarias		Esc. Bás. Nº 1770 " Mcal. Francisco S. López-Santa Rita		Esc. Bás. Nº 77 "Alúm de Vivé"-Paraguarí		Esc. Bás. Nº 17 "Rca. del Perú"-Asunción		Esc. Bás. Nº 142 "María Felicidad González"-Asunción		
	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	
FEBRERO	6	5	4	4	7	3	7	3	7	3	7	4	7	4	1	2	7	3	7	3	**11**
Cantidad Total de días de prórroga	11		8		10		10		10		11		11		3		10		10		

INFORME: En las:
Esc. Bás. Nº 60 "Fray Luis Bolaños" Dpto. Caazapá - Viskaino Kue — LOTE Nº 2
Esc. Bás. Nº 52 "Félix Pérez Cardozo" Dpto. Guairá - Centro — LOTE Nº 2
Se encuentran en trámite de ejecución de la Orden de Servicio Nº 2 y a la Fecha no se considera la contabilización de las prórrogas por lluvias

Arq. Catalina Rojas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Catherine Larrieu
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Se adjuntan copias de:

- Informe Fiscal Nº /20 CPI UEPP, y Documentos
- Registro de Precipitación Diaria → DINAC
- Cuadro de Incidencias relacionadas a las condiciones climáticas – Febrero/2020
- Libro de obras
- Registro fotográfico

Nos despedimos atentamente, no sin antes desearle una maravillosa jornada.

Arq. Catherine Larrieur,
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Arq. Catalina Rojas Pukall
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Arq. Guillermo Godoy
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Arq. Graciela Acosta
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Ing. Jorge Augusto Paganetti
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2
www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,3										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,0										
16		2,2										
17		0,0										
18		3,4										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		61,4										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29		0,0										
30												
31												
Total		67										
Máx,24h		61,4										
Día Máx.		25										

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Consructora Chaco S.A.

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CAAZAPÁ	26° 10' 31,70"	56° 21' 16,92"	142 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		4,0										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,3										
13		0,0										
14		0,0										
15		8,9										
16		12,2										
17		0,0										
18		4,5										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		5,5										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29		0,0										
30												
31												
Total		35										
Máx. 24h		12,2										
Día Máx.		16										

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		1,0										
2		30,5										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,0										
16		64,5										
17		T										
18		8,4										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		18,0										
25		25,4										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29		0,0										
30												
31												
Total		148										
Máx.24h		64,5										
Día Máx.		16										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		5,9										
6		0,3										
7		0,0										
8		0,0										
9		3,6										
10		0,0										
11		0,0										
12		1,4										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,9										
16		0,0										
17		0,0										
18		1,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		18,8										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29		0,0										
30												
31												
Total		32										
Máx. 24h		18,8										
Día Máx.		25										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
PARAGUARÍ	25° 37' 36,51"	57° 08' 44,99"	116 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		5,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		22,0										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29		0,0										
30												
31												
Total		27										
Máx. 24h		22										
Día Máx.		25										

Lic. María Lourdes Aveiro C.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

26/2/2020	Se suspenden las actividades en la tarde por lluvias acontencidas	Esc. Bás. N° 1770 Mcal. Francisco Solano López
28/2/2020		

IMÁGENES - ESTADO DE LAS OBRAS DEBIDO A INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Resumen General de Instituciones - Depto. N° X - Alto Parana

Distrito de Santa Rita - Esc. Bás. N° 1770 Mcal Francisco Solano López







Distrito de Hernandarias - Escuela Básica N° 1295 "Virgen del Rosario"

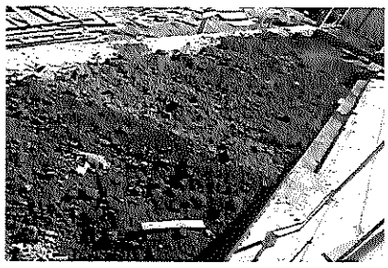





Arq. Catalina Rojas :
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. BAS. 1770 - M - F.S. Lopez
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACION:	CPI UEPP MEC
SUPERVISOR:	JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC
DÍA: 17 - Enero - 2020	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS: Se inicia la preparación de parilla p/ la zapata y también armadura del tronco delos pilares	TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:	Se suspenden las Actividades a la Hora 11:45 Horas.		
	FIN:	por los intensas lluvias acontecidos en el Sitio de Obras.		
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Ing. Rojas Pukall
Jefe de Obras
CPI UEPP - MEC

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISION

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2010 "CONSTRUCCIÓN DE EDUCACIÓN DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - IDN: 360.047

LIBRO DE OBRAS	0000009

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Dist. No. 2[illegible] "General Ramírez"

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACIÓN: CFI UEPP-MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CFI UEPP-MEC

DÍA: Lunes [illegible] de [illegible] 2010

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS
[illegible]	

CASO DE LLUVIAS

DÍA: Lunes [illegible] de [illegible]		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: [illegible] FIN: [illegible]			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
[illegible]				

INCIDENCIAS

DÍA	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA		MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 10.395
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Carolina Rojas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP-MEC
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2010 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - ID N° 154.937

LIBRO DE OBRAS	0000010

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. Nc. 1233 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACION: DPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION DPI UEPP MEC

DIA

CONTRATISTA	FISCAL
TRABAJOS EJECUTADOS	TRABAJOS VERIFICADOS
Ver [illegible]	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DIA	Martes 11 de [illegible]	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO [illegible]			
	FIN [illegible]			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				
Torrencial lluvia				

INCIDENCIAS

DIA	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Juan P. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. N° 10.295
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Catalina Rojas Pukoll
Fiscal de Obras
UEPP MEC
FISCALIZADOR

SUPERVISION

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS NO TRADICIONALES" – PLURIANUAL – IDN 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000014

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Miércoles 3 de Octubre de 2024

CONTRATISTA	FISCAL
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Cimiento de Estructura PI-P3	
1.3.2 PA-P5-P6-P7-P8-P9-P10	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Domingo 4		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

No trabaja la empresa

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. N° 10.395

Arq. Catalina Rojas Pukoll
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000008

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. Nº 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S/A

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Viernes 1 de Febrero del 2026

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS
Se procede la continuación de los trabajos a ejecutarse en la obra del Proyecto	
Se coloca el cerrojo de	
Urinales (P22, 24, 20, 12, 11, 18, 4, 17)	
Se coloca los Pilares de H°A°	
Se coloca el hormigón elite	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Sabado 01 de Febrero		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: 7:40			
	FIN: Todo el Dia			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Se suspende todos los actividades por torrencial lluvia				
Domingo 2 de Febrero Se suspende por lluvia				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. Nº 10.395
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Catalino Rojas Pukoll
Fiscal de Obras
UEPP – MEC
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° [illegible] "CONSTRUCCIÓN DE [illegible] DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - ID N° [illegible]

LIBRO DE OBRAS

0000009

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: [illegible]
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora [illegible] S.A.
FISCALIZACIÓN DEL DEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN OFICINA [illegible] DEPP MEC
DÍA [illegible]
CONTRATISTA

TRABAJOS EJECUTADOS	FISCAL TRABAJOS VERIFICADOS

CASO DE PASO DE LLUVIAS

DÍA	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA COMIENZO / TERMINO			
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

INCIDENCIAS

DÍA	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Pcia. Prof. N° 10 395
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Catalina Rojas [illegible]
Fiscal de Obras
UEP MEC
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 01/2018 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – ID Nº 336 937

LIBRO DE OBRAS 0000010

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1294 Vecinal Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DIA: [illegible]

CONTRATISTA

TRABAJOS EJECUTADOS

FISCAL

TRABAJOS VERIFICADOS

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DIA: Martes 4 de febrero

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
	COMIENZO: 17:10			
	FIN: Tarde el día			

TRABAJOS SUSPENDIDOS

Comercial Nueva

INCIDENCIAS

DIA	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Mat. Prof. Nº 10.395

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Gráfica Bienvenido - A. del Bim. Godoy Amor 3 B° San Isidro - Tel. (0361) 451-[illegible] - Resistencia Chaco - Tel. 3543-[illegible] - Cel. 3624-[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000014

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1395 Virgen del Rosario
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: Lunes 5 de Noviembre 2018

CONTRATISTA	FISCAL
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Inicio de Obras	
Cimientos	
R-RM-PR-10-DZ-08-02-P21	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Domingo 9		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
No trabaja la empresa				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. N° 10.395
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Carolina Rojas Fukui
Fiscal de Obras
UEPP MEC
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Gráfica Blanqueada - Avda. Blas Garay Km. 0 c/ San Pedro - Tel. (021) 527.376 - Ciudad del Este
e-mail: graficablanqueada@hotmail.com

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000012

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 05/02/2020 - Miercoles

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
-Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Lluvia 5.90 mm.		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - ELENA FUNES
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371.630 / 0981 665.920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

arquitecta

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000013

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 06/02/2020 - Jueves

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA: Lunes 03				
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - CIUDAD DEL ESTE - Saure N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020
arquitecta

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000018

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 12/02/2020 - Miercoles

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Lluvia 1 4 2mm

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 638 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

arquitecta

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000021

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 15/02/2020 - Sabado

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Lluvia 0,90 mm

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL E.A.S.A. N° C-1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

arquitecta

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - IDN 356.937

N° 0000023

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. DAS 1710 - Ca! Francisco S. Lopez
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACION:	CPI UEPP MEC
SUPERVISOR:	JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC
DÍA:	10 - Febrero - 2020

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Se suspenden actividades p/ lluvia.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Juan Artemio Roa Delgado
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZACION

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - IDN 356.937

N° 0000028

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. DES. 1+10 - "C" - Francisco S. Lopez
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACION:	CPI UEPP MEC
SUPERVISOR:	JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC
DÍA:	24 - Febrero - 2020

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Se registra lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Juan Artemio Roa Delgado
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC Nº 1118

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISION

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - IDN 356.937

N° 0000029

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. DES. INFO - Nal F.S. Lopez
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACION:	CPI UEPP MEC
SUPERVISOR:	JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC
DÍA:	28 - Enero - 2020

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Se suspendió lluvia.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Antonio Noa Delgado

FISCALIZADOR

SUPERVISION

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN: 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000025

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 18/02/2020 → Martes

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Colocación de encofrados para fustes de pilares	
- Preparación de armaduras para viga de fundación	
- Suspensión de actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Martes / lluvias 5 mm		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

Arq. Olga Sanabria

IMPRENTA CONTINENTAL - C.A.I. N°: [illegible] Saucedo 1494 (c/ Recoleta) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 [illegible] 98 - [illegible] - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000031

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 25/02/2020- Martes

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Cercamiento de muro de predios - Base de vigas de fundación	
- Suspención de actividad por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Nublado/ lluvias 22.0mm		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 9:00hs			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRAFICA ... - Nº ... - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel/ 021 ... Talonario 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000015

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DÍA: 08/02/2020 - Sabado

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Lluvia

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: (021) 371 [illegible] - 0981 [illegible] - 02 Tel. 5x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

Ana. Clara Panabria

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000015

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 08/02/2020 - Sabado

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Lluvia		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Ing. Olga Sanabria

IMPRENTA CONTINENTAL CH... 1039 - Pauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 - 663 - 098 ... Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000024

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 19/02/2020 - Miercoles

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Excavación para muro de piedra brita colocada	
- Muro de piedra brita col.	
- Cargamento de postes de pilares	
- Preparación para viga de fundación - armaduras	
- Suspención de actividades por inicio de lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: Lluvioso		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 13:00hs			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1:039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 (0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO
