DC INGENIERIA S.A.

Llamado MOPC Nº 65/2020 Licitación Pública Nacional para la "Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental. 1ra tanda. Financiación CAF-FONPLATA. ID 367.387 – CONTRATO SG MINISTERIO 471/2020 – Lote 2

CURVA DE AVANCE GENERAL

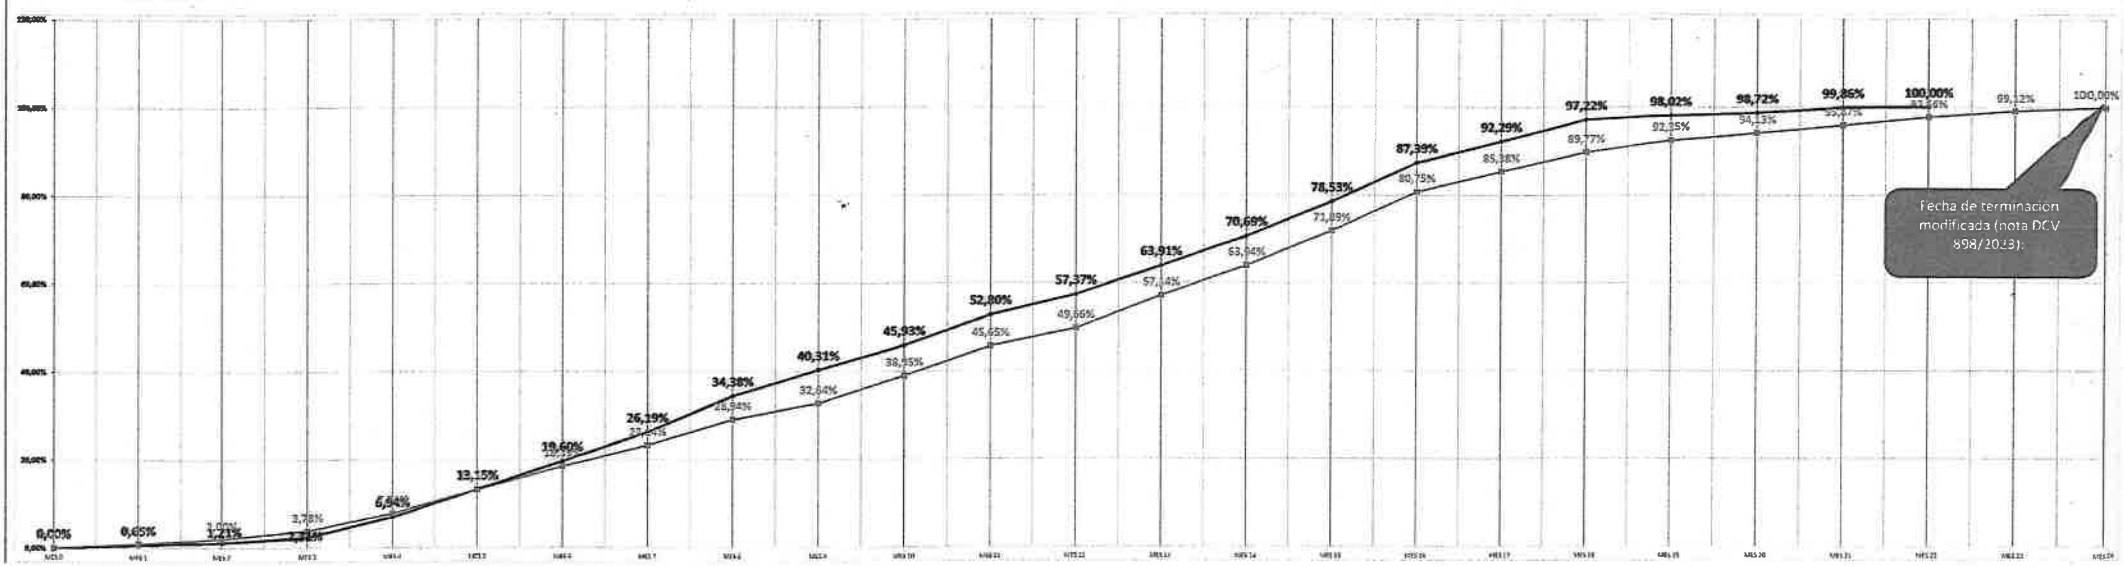

	INICIO	Feb. 2021	Mar. 2021	Abr. 2021	May. 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Ag. 2021	Sept. 2021	Oct. 2021	Nov. 2021	Dic. 2021	En. 2022	Feb. 2022	Mar. 2022	Abr. 2022	May. 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Ag. 2022	Sept. 2022	Oct. 2022	Nov. 2022	Dic.2022	Ene.2023
	MES 0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
Descripción	1/02/2021	01/02/2021 a 28/02/2021	01/03/2021 a 31/03/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	01/07/2021 a 31/07/2021	01/08/2021 a 30/08/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	01/10/2021 a 31/10/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	01/12/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	01/12/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 16/01/2023
PROGRAMADO CONTRACTUAL	0	1,92%	1,49%	2,68%	4,37%	5,67%	5,85%	6,48%	7,13%	5,44%	6,78%	6,91%	4,85%	7,81%	6,81%	7,98%	8,69%	4,62%	4,36%	0,67%	0,40%	0,02%	0,83%		
AVANCE ACUMULADO CONTRACTUAL	0	1,92%	2,61%	5,19%	9,48%	15,15%	20,99%	27,60%	34,72%	40,16%	46,92%	53,73%	58,38%	66,19%	73,01%	80,96%	89,65%	94,28%	98,67%	99,35%	99,75%	99,77%	100,00%		
AVANCE MENSUAL REPROGRAMADO	0,00%	0,65%	0,35%	1,10%	4,83%	6,21%	6,45%	6,59%	8,03%	5,23%	5,63%	6,87%	4,57%	6,58%	6,35%	7,84%	8,60%	4,90%	4,59%	0,89%	0,78%	1,18%	0,14%		
AVANCE MENSUAL ACUMULADO REPROGRAMADO	0,00%	0,65%	1,21%	2,31%	6,94%	13,15%	19,60%	26,19%	34,38%	40,31%	45,93%	52,60%	57,17%	63,91%	70,69%	78,53%	87,39%	92,29%	97,22%	98,02%	98,72%	99,85%	100,00%		
AVANCE MENSUAL REPROGRAMADO POR LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS	0,00%	0,93%	1,07%	1,78%	3,56%	5,36%	5,20%	4,75%	5,80%	3,70%	6,31%	6,70%	4,01%	7,44%	6,80%	7,95%	8,60%	4,59%	4,59%	2,56%	1,78%	1,74%	1,79%	1,46%	0,88%
AVANCE ACUMULADO REPROGRAMADO POR LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS	0,00%	0,93%	2,00%	3,78%	7,34%	13,10%	18,29%	23,14%	28,94%	32,64%	38,95%	45,65%	49,66%	57,14%	63,94%	71,89%	80,75%	85,38%	89,77%	92,35%	94,13%	95,87%	97,65%	99,12%	100,00%

Representante Legal
DC INGENIERIA S.A.

Ing. Felicia Cañete
Representante Legal

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

ING. ANTONIO PAMPLIEGA
Director de Fiscalización
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES

Ing. César Núñez Yeger
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

70 (setenta)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

69 (sesenta y nueve)

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 17861/2023

TITULAR:
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES

NOMBRE Y APELLIDO:
Oscar Benítez Schulze

TELEFONO:
(0984) 587-173

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
3F. LLAMADO MOPC Nº 54/2019.
SOLICITA PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS.

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 4617
Fecha 17 ABR 2023 Hora 9:20
Firma

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 10/04/2023 15:54:24

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. G.V.M.O.P. 12 ABR 2023
VMOP ☐ VMAF ☐ VMT ☐ VMME ☐
C. RR. II. ☐ D.P.P. ☐ D.B.I. ☐
COMUNICACIONES ☐ DAPSAN ☐ DGESA ☐ DTyA ☐ UEPE ☐
CAPRI ☐ D.R.H. ☐ D.F. ☐ D.A.J. ☐
UOC ☐ D.C. ☐ D.A.I. ☐ D.B.S. ☐

Ing. Rubén Andino Lezcano
Encargado de Despacho
Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

11 ABR 2023
11:00

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.04.10 17:02:55 -04'00'

MOPC
17 ABR 2023
VMOP ☐ VMAF ☐ VMT ☐ DEPOA ☐
DGESA ☐ DDH ☐ DPP ☐ UGP/CAF ☑
DOP ☐ DByS ☐ DAC ☐ CA ☐
DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO ☐
UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/DDD ☐

Ing. Oscar Núñez Yeger
Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.
