Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

COPIA

Asunción, 09 de mayo de 2021.

DCV N° 1317/2021

Señores:

CONSORCIO RIO TEMBEY

Avda. Defensores del Chaco N° 524 casi Arturo Alsina, Asunción

Ref.: LLAMADO MOPC N.° 188/2019. Obras de Pavimentación tipo Asfáltico de tramos de Caminos Vecinales en los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguarí y Ñeembucú. – Ad Referéndum al PGN 2020. ID 373116

Contrato SG Ministro N.° 112/2020

Asunto: Aprobación de Prórroga de plazo por lluvia y sus consecuencias.

Me dirijo a ustedes, en respuesta a la nota con MEU EXPEDIENTE N° 19299/2021 de fecha 6 de mayo de 2021, presentada por el Consorcio Rio Tembey, a través de la cual solicitaron prórroga de la fecha de terminación de las obras por días de lluvias y sus consecuencias, en el periodo comprendido a partir de la fecha 18/05/2020 al 28/02/2021.

Considerando las verificaciones realizadas por el Supervisor, en Memorándum de fecha 07 de mayo de 2021, y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC Clausula N° 22.1 (Inclemencias Climáticas) Sección I – Datos de la Licitación, corresponde una prórroga de 30 (treinta) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo mencionado.

En atención a dichos informes, esta dirección aprueba la prórroga solicitada, y otorga 30 (treinta) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo del 18/05/2020 al 28/02/2021, a contar a partir de la fecha de finalización de plazo de ejecución aprobado (18/01/2022), siendo la nueva fecha de terminación de obras **el 17 de febrero de 2022**.

Se adjunta el cronograma y curva de avance aprobados.

Atentamente.

MOPC Dirección de Caminos Vecinales

Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director
Dirección de Caminos Vecinales

RECIBIDO
Fecha 21/05/2021 Hora 11:30
Firma

6(seis)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

A	:	**Ing. Rubén Andino**, Jefe **Departamento de Ejecución – DCV**
DE	:	**Ing. Arturo Bracho,** Supervisor de Obra
FECHA	:	07 de mayo de 2021
REFERENCIA	:	Llamado MOPC N° 188/2019 Licitación Pública Nacional Obras de Pavimentación Tipo Asfaltico de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguarí y Ñeembucú – Ad Referéndum al PGN 2020 – ID 373.116 **Contrato SG Ministro N° 112/2020 – Lote 3.** **Asunto:** Informe sobre prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias

Me dirijo a usted en relación a la Nota de fecha 06 de mayo de 2021 remitida por el CONSORCIO RIO TEMBEY, referente a la solicitud de prórroga por lluvia y sus consecuencias del contrato de la referencia.

Al respecto del pedido de prórroga solicitado, la contratista presenta el Registro de lluvias y humedad excesiva, ocurridos en el periodo comprendido entre los meses de mayo 2020 a febrero 2021 y en base a éstos solicita una ampliación adicional de 30 (treinta) días del plazo contractual.

Esta Supervisión luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC clausula N° 22.1 Sección I – Datos de la Licitación, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 30 (treinta) días por lluvias y humedad excesiva.

5(cinco)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gent

Lluvias Ocurridas

Mes	Cantidad de días de lluvia y sus consecuencias	Prórroga por mes
Mayo/2020	4	0
Junio/2020	10	2
Julio/2020	5	0
Agosto/2020	4	0
Septiembre/2020	3	0
Octubre/2020	11	3
Noviembre/2020	11	3
Diciembre/2020	17	9
Enero/2021	21	13
Febrero/2021	2	0
Total, días de prórroga		30 días

En atención a lo señalado más arriba, esta supervisión sugiere otorgar prórroga por 30 (treinta) días a partir del 18/01/2022, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es **el 17 de febrero de 2022**.

Ing. Arturo Bracho
Supervisor

4(cuatro)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 19299/2021

TITULAR:
CONSORCIO RIO TEMBEY

NOMBRE Y APELLIDO:
CARLOS OLAZAR

TELEFONO:
(021) 513.313

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
CONTRATO SG MINISTRO Nº 112/2020, LLAMADO MOPC Nº 188/2019, SOLICITA PRORROGA AL PLAZO DE TERMINACION DE LA BORA DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 06/05/2021 10:06:02

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 5198
Fecha 06 MAY 2021 Hora 13:13
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 7-5-21
☐ VMAF ☐ DV ☒ DCV ☐ DOP
☐ C. TÉC. ☐ DPV ☐ DPI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/BTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ UEP IP ☐ CAC ☐ CAPE ☐ DAJ
☐ DAPSAN ☐ CRI ☐ UOC ☐ J G M
Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha: 10 MAY 2021 11:30
Firma: DGEA

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2021.05.06 11:19:03 -04'00'

MOPC DCV Fecha: 10 MAY 2021
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ CRI ☐ DPP ☐ UEP-DAP
☐ DOP ☐ DB y S ☐ DPO ☐ UOC
☐ DV ☒ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐

DPTO. EJECUCION
D. C. V.
MESA DE ENTRADA
Nº. 535
As. 11 de 05 de 2021
Firma:

→ Con. llamado 188/19
Al sub Juan Pintos
Ing. Rubén Aquino
Jefe Dpto. Ejecución DCV MOPC
Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

3(tres)

CONSORCIO RIO TEMBEY

SOTEC S.A. - CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.

Defensores del Chaco N° 524 c/ Arturo Alsina email:sotecsa@sotecsa.com.py Tel/Fax: 021-506.653

CRTM.0505/21.01

Asunción, mayo 5 de 2021.-

Señor
Ing. Rodolfo Segovia, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REFERENCIA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 112/2020. LLAMADO MOPC Nº 188/2019. "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO. CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU". ID 373.116. LOTE N° 3, TRAMO: SAN VICENTE-MARACANA.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por Su digno intermedio al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con el fin de solicitar una prórroga al plazo de terminación de la obra del Contrato de la referencia.

Según la cláusula 22.1 de las Condiciones del Contrato corresponde una prórroga de 30 (treinta) días debido a las lluvias y sus consecuencias registradas entre el 18 de mayo de 2020 y el 28 de febrero de 2021

Adjuntamos la planilla de lluvias registrada en obra con la nueva curva de Avance Físico – Financiero reprogramada a los días solicitado.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

05 MAY 2021

MOPyC * DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES *

Ing. Jorge Reguero
Director de Obra
CONSORCIO
Río Tembey

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU.

CUADRO DE DIAS DE LLUVIA

	MES	DIAS																															PRECIPITACIONES		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	REGISTRO MENSUAL (mm)	DIAS	DIAS MENOS 8
1	mayo-2020																						90	10	H	H							100	4	0
2	junio-2020				25	55	H	H			15	H		10													12	H	H				117	10	2
3	julio-2020						10	10	25	H	H																						45	5	0
4	agosto-2020																20	25	H	H													45	4	0
5	septiembre-2020																	14	H									15					29	3	0
6	octubre-2020													70	2	26	H	H	H								74	H	H	12	H		184	11	3
7	noviembre-2020									20	35	H	H			45	5	H	47	H	H							5					157	11	3
8	diciembre-2020			8	25	23	H	H							40	H	35	10	20	H	H	25	H							75	H	H	261	17	9
9	enero-2021				20	25	H	10	H	H	10	H		8	H					5	30	H	34	5	40	5	H	45	H			80	317	21	13
10	febrero-2021	H	10																														10	2	0
																																	TOTAL DIAS PRORROGABLES		30

Dias de lluvia
H= EXCESO DE HUMEDAD

Ing. Jorge Regueiro
Representante Legal
CONSORCIO RIO TEMBEY

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obra
D.C.V.- M.O.P.C.

2(dos)

LLAMADO MOPC N° 01/2019. OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS V

LOTE N° 3: San Vicente - M

CURVA DE AVANCE

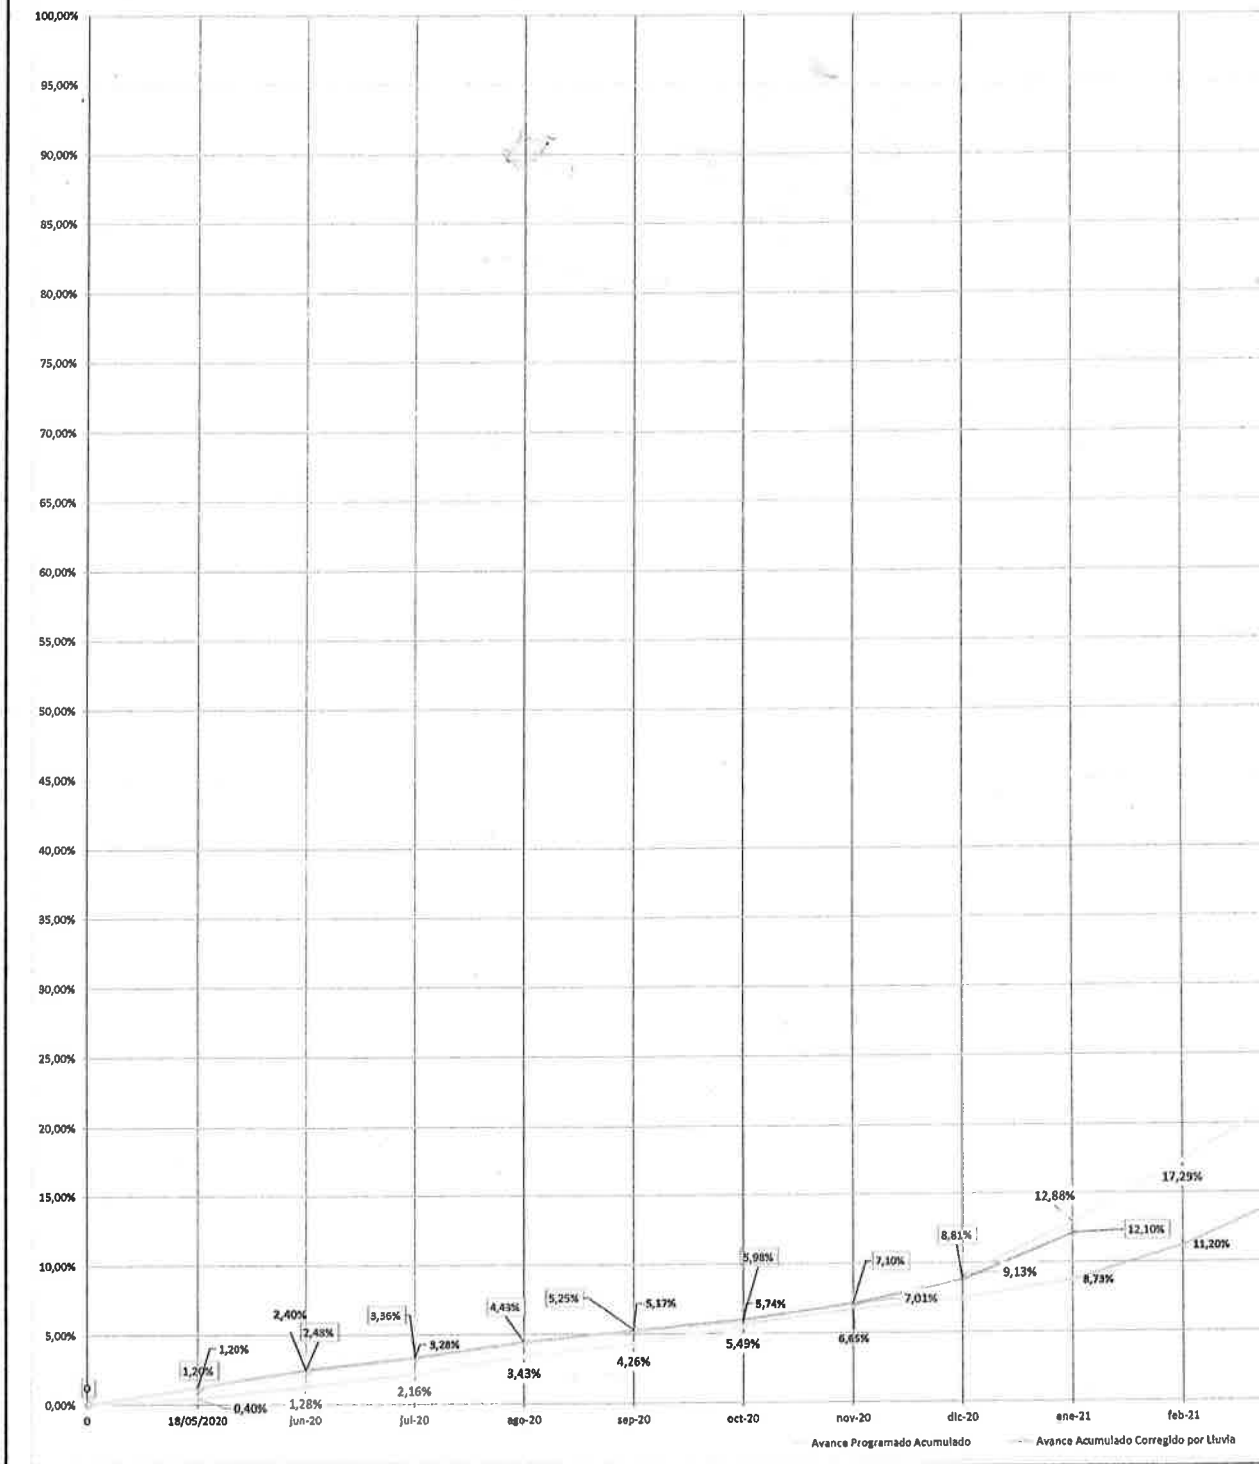

	18/05/2020	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20
Avance Programado Contractual (Apm)	0,40%	0,88%	0,89%	1,27%	0,83%	1,23%	1,52%
Avance Programado Acumulado	0,40%	1,28%	2,16%	3,43%	4,26%	5,49%	7,01%
Avance Teorico Mensual	1,20%	1,28%	0,88%	1,07%	0,82%	0,73%	1,12%
Avance Teorico Acumulado	1,20%	2,48%	3,36%	4,43%	5,25%	5,98%	7,10%
Avance Ejecutado del mes por el contratista (Aemes)	1,20%	1,20%	0,88%	1,07%	0,82%	0,57%	0,91%
Avance Ejecutado Acumulado por el contratista (AEacum)	1,20%	2,40%	3,28%	4,35%	5,17%	5,74%	6,65%
Avance Mensual Corregido por Lluvia	1,20%	1,20%	0,88%	1,07%	0,82%	0,57%	0,91%
Avance Acumulado Corregido por Lluvia	1,20%	2,40%	3,28%	4,35%	5,17%	5,74%	6,65%

Ing. Jorge Reguero
Representante Legal
CONSORCIO RIO TEMBEY

1(uno)

INALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU

caná. Longitud: 23,948 km.

ICO - FINANCIERO

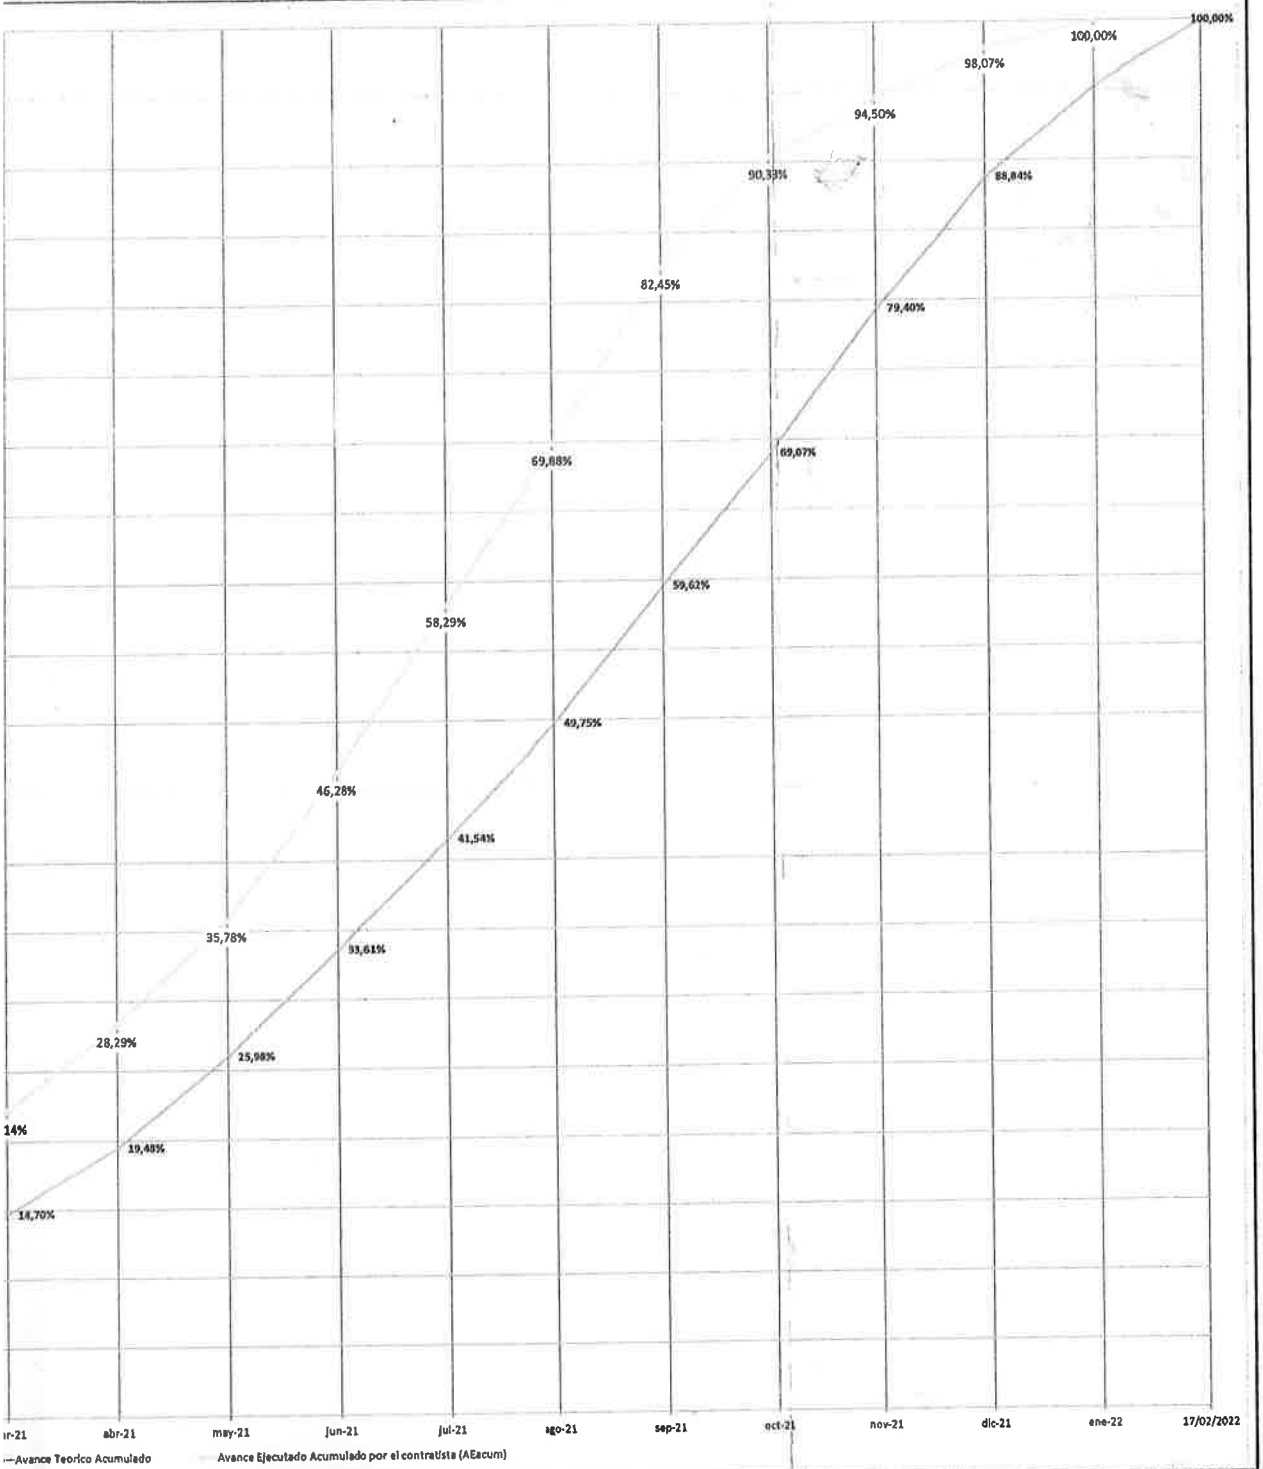

0	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	17/02/2022
%	3,75%	4,41%	4,85%	6,15%	7,49%	10,49%	12,01%	11,59%	12,57%	7,88%	4,17%	3,57%	1,93%	
%	12,88%	17,29%	22,14%	28,29%	35,78%	46,28%	58,29%	69,88%	82,45%	90,33%	94,50%	98,07%	100,00%	
%	3,29%													
%	12,10%													
%	1,24%													
%	8,73%													
%	1,24%	2,47%	3,60%	4,78%	6,60%	7,63%	7,03%	8,21%	9,67%	9,45%	10,33%	9,44%	6,44%	4,72%
%	8,73%	11,20%	14,70%	19,48%	28,98%	33,61%	41,64%	49,75%	59,62%	69,07%	79,40%	88,84%	95,28%	100,00%

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obra
D.C.V.- M.O.P.C.
