NOTA DI Nº 108/2022

Asunción, 22 de diciembre de 2022

Señores
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
San Juan N°2270 e/ Tte. Julio Trifón Flores y FFCC Carlos A. López
Asunción - Paraguay

1

Ref.: CONTRATO N° 72/2021 - CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO.
Obj.: Exp. 9965/22 - Prórroga de plazo de ejecución.

Me dirijo a usted, en relación a los plazos de ejecución del contrato de referencia y teniendo en consideración lo expuesto mediante Exp. 9965/22 en relación a las inclemencias climáticas registradas entre los meses de octubre y noviembre de 2022 en la zona de obras cuyos respaldos avalados por la fiscalización se anexan.

Teniendo en consideración lo expuesto en su nota del 06 de diciembre del corriente dirigida a esta Institución, e ingresada mediante Exp. 9965/22, y dado que dicho acontecimiento se encuentra contemplado en la cláusula de *Inclemencias climáticas* dentro de las normativas legales vigentes, corresponde conceder la prórroga al plazo de ejecución por inclemencias climáticas y sus consecuencias por el término de veintisiete (27) días.

No obstante, se deja constancia que no se concederá ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el Precio del Contrato.

Por lo expuesto, el plazo de ejecución establecido para el 23 de diciembre del presente año, a partir de éste documento, es prorrogado para el 19 de enero del 2023.

Atentamente,

Ritter Construcciones S.R.L.
Ramón David Araujo
C.I. 3.878.244
22-12-22

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Arq. CRISTINA SCHIAVONE
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes

Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

AÑO: 2022

EXPEDIENTE Nº 9965

FECHA: 06/12/2022

RESOLUCIÓN Nº __

NOTA N° __

PROCEDENCIA: Ritter Construcciones S.R.L.

ASUNTO: Presentan solicitud de ampliación de plazos por lluvias "Construcción de un Polideportivo en la ciudad de Itacurubi del Rosario"

Ritter
CONSTRUCCIONES SRL

San Juan N° 2.270 e/ Tte. Julio Trifón Flores y FF. CC. Carlos A. López – ritter.co@ritter.com.py - (595 21) 281.496 / 292.988

Asunción, 06 de diciembre de 2022
NP. SND-Polid.Itacbi. 43/22

Señores
Dirección de Infraestructura
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
CC: Arq. Silvia Arhens
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

REF: LPN SBE N° 48 / 2021 "CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO" – ID. N° 403.356.

Asunto: SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZOS POR LLUVIAS
De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a la Institución, para presentar la planilla de lluvia como así también adjuntos de libro de obra y el cronograma físico financiero.
Por lo cual se solicita una prórroga de la fecha de plazo.

- Ultima fecha finalización aprobada: 23/12/2022
- Fecha de culminación por ampliación de plazo por lluvias: 19/01/2023

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar nuestros más respetuosos saludos.

Atentamente,

ING. VICTOR J. RITTER SIMON
Representante Legal

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Mesa de Entrada Nº 476
Fecha 7/12/2022 Hora 10:00
Firma
Aclaración Alberto Alfredo Alvarez Ayala
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- MESA DE ENTRADA -
Exp. Nº: 9965 Fojas: 38
Fecha: 06 DIC 2022 Hora: 13:43
Firma:
Aclaración: Renato R. Román
Téc. Administrativo
Secretaría General - SND

CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

ESTADISTICA DE LLUVIA

Dias / Meses	Año 2022																															Precipitaciones Registradas (mm)	Dias de lluvia
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
oct-22		B	B	B	24,0	33,0		B	B	14,0		B	15,0	20,0		B	21,0		B	85,0	75,0		B	B	B	B	61,0		30,0	66,0	110,0	554,00	19
nov-22		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25,0	30,0			B	B	B	B	B	14,0	12,0		B	B	B	B	B	B	B	B	81,00	8
																																TOTALES	27

Referencias

- Terreno Humedo
- B Bueno
- Sin actividad por lluvia

Representante Legal
Contratista

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

CRONOGRAMA AVANCE - PRORROGA POR LLUVIAS

Ritter CONSTRUCCIONES

ID 403.356 /N° de Contrato: 72/2021 Nombre del Llamado: LICITACION PUBLICA NACIONAL - SBE N° 48/2021 "CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO"

06/12/2022

Actividades	Monto total	Mes 01 FBRERO	Mes 02 MARZO	Mes 03 ABRIL	Mes 04 MAYO	Mes 05 JUNIO	Mes 06 JULIO	Mes 07 AGOSTO	Mes 08 SEPTIEMBRE	Mes 09 OCTUBRE	Mes 10 NOVIEMBRE	Mes 11 DICIEMBRE	Mes 12 ENERO
Trabajos Preliminares	164.671.716												
Cimientos	275.623.659												
Estrucutura de Hormigon	555.497.687												
Mamposteria	159.633.839												
Revoques	33.728.842												
Cerramientos en seco	13.400.006												
Revestidos ceramicos	10.246.609												
Piso de Hormigon espesor 10cm con malla de alisado con helicoptero	190.339.448												
Piso de Hormigon espesor 9cm	63.551.291												
Piso baldosa en general con contrapiso	31.476.169												
Instalaciones sanitarias (Artefactos y griferia)	30.304.533												
Instal. Sanit.: cañerias, pozo, camara septica, humedal artificial	53.478.587												
Insta. Elect. Tablero pirncipal y secundarios	20.797.228												
Insta. Elect. Basica, artefactos, transformador	120.742.764												
Aberturas	62.852.570												
Pinturas	24.642.109												
Techo	1.140.001.609												
Varios	29.710.326												
TOTAL CONTRACTUAL	**2.980.698.992**												
Excavación no clasificada con retiro de material	10.625.000												
Aislación horizonral	10.863.492												
Mamposteria Convoco	17.174.775												
TOTAL ADICIONAL	**38.663.267**												
TOTAL GENERAL CONTRACTUAL + ADENDA N°1	**3.019.362.259**												
	AVANCE PARCIAL (%)	0,27%	0,30%	2,15%	1,21%	5,01%	10,11%	5,38%	14,78%	15,15%	29,69%	5,91%	10,04%
	AVANCE ACUMULADO (%)	0,27%	0,57%	2,72%	3,93%	8,94%	19,05%	24,43%	39,21%	54,36%	84,05%	89,96%	100,00%
	Cert. Mensual	8.159.347	9.069.555	64.940.907	36.572.629	151.271.408	305.323.725	162.321.072	446.353.187	457.314.969	896.340.753	178.639.915	303.054.792
	Cert. Acumulada	8.159.347	17.228.902	82.169.809	118.742.438	270.013.846	575.337.571	737.658.643	1.184.011.830	1.641.326.799	2.537.667.552	2.716.307.467	3.019.362.259

1188

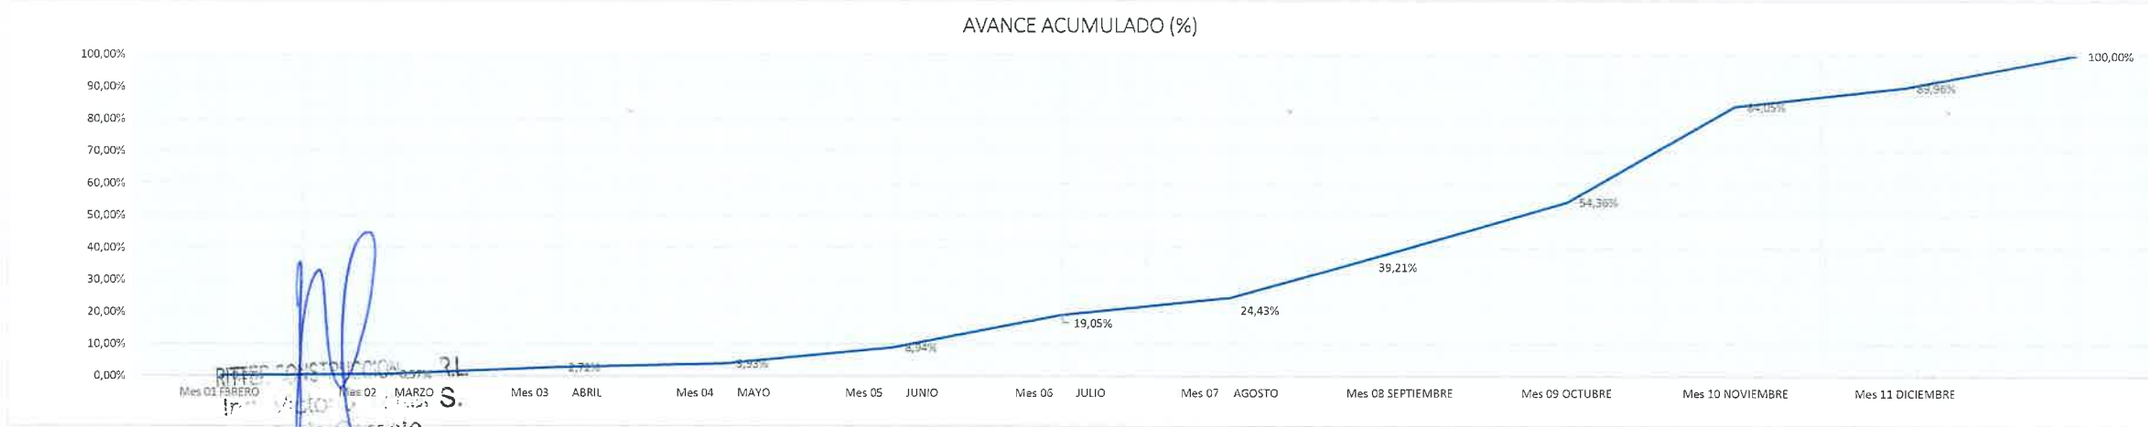

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor Hugo Ritter
Socio Gerente

tres

3

Ritter CONSTRUCCIONES

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO - PRORROGA POR LLUVIAS

dic-22

ID 403.356 /N° de Contrato: 72/2021 Nombre del Llamado: LICITACION PUBLICA NACIONAL - SBE N° 48/2021 "CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO"

		Mes 01 FEBRERO	Mes 02 MARZO	Mes 03 ABRIL	Mes 04 MAYO	Mes 05 JUNIO	Mes 06 JULIO	Mes 07 AGOSTO	Mes 08 SEPTIEMBRE	Mes 09 OCTUBRE	Mes 10 NOVIEMBRE	Mes 11 DICIEMBRE	Mes 12 ENERO 23
2	TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1	Replanteo y Limpieza durante el proceso												
2.2	Excavacion para zapatas y encadenado												
2.3	Relleno y compactacion												
3	CIMIENTOS												
3.1	Cabezal de pilote												
3.2	Pilotes												
3.3	Vigas de arriostre entre cabezal y pilotes												
3.4	Bloque muerto de H°C°												
3.5	Arriostre entre pilotes y bloque muerto												
3.6	Zapata de H°C° - Murallas												
3.7	Cimiento de P.B.C. : baños, vestuarios, murallas												
3.8	Encadenado sobre P.B.C. 0,13 x 0,20												
4	ESTRUCTURA DE HORMIGON												
4.1	Viga superior 20x40												
4.2	Rampa y escaleras de acceso a graderias												
4.3	Viga transversal de H°A° - Gradeia												
4.4	Columnas de H°A° de 0,40 x 0,50												
4.5	Pilar de H°A° de 0,25 x 0,35												
4.6	Pilar de H°A° de 0,20 x 0,20 - muralla												
4.7	Losa de Hormigon: cabina, voladizo, acceso												
4.8	Graderias - Losa de H°A° de 0,10cm												
5	ALBAÑILERIA Y REVESTIDOS												
5.1	Mamposteria ladrillos a la vista												
5.2	Revoques												
5.3	[illegible]rramientos en seco												
5.4	[illegible]idos ceramicos												
5.5	[illegible] Hormigon espesor 10cm. Con malla alisado con helicoptero												
5.6	Piso de Hormigone= 9cm												
5.7	Piso baldosa en general con contrapiso												
6	ABERTURAS												
6.1	Abertura de madera												
6.2	Aberturas metalicas y barandas												
6.3	Balancines con vidrio												
6.4	Barandas												
7	INSTALACIONES												
7.1	Baños y vestuarios. Artefactos, griferias												
7.2	Instal. Sanit.: cañerias, pozo, camara septica, humedal artificial												
7.3	Insta. Elect. Tablero pirncipal y secundarios												
7.4	Insta. Elect. Basica, artefactos												
7.5	Insta. Elect. Basica (BOCAS)												
7.6	Transformador de 200 Kva												
8	PINTURA												
8.1	Paredes												
8.2	Aberturas												
9	TECHO												
9.1	Techo de chapa zinc N° 26 con estructura de perfileria metalica												
9.2	Canaletas y bajadas												
10	VARIOS												
10.1	Acondicionamiento de acceso: paso sobre canal, camineros y vereda												
10.2	Limpieza final de obra												
	AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL EJECUTADO	0,27%	0,30%	2,15%	1,21%	5,01%	10,11%	5,38%	14,78%	15,15%	29,69%	5,91%	
	AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL ACUMULADO EJECUTADO	0,27%	0,57%	2,72%	3,93%	8,94%	19,05%	24,43%	39,21%	54,36%	84,05%	89,96%	

CONTRACTUAL- AJUSTADO	0,27%	0,30%	2,15%	1,21%	5,01%	10,11%	5,38%	14,78%	15,15%	29,69%	5,91%	10,04%
CONTRACTUAL ACUMULADO	0,27%	0,57%	2,72%	3,93%	8,94%	19,05%	24,43%	39,21%	54,36%	84,05%	89,96%	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	0,27%	0,57%	2,72%	3,93%	8,94%	19,05%	24,43%	39,21%	54,36%	84,05%	89,96%	

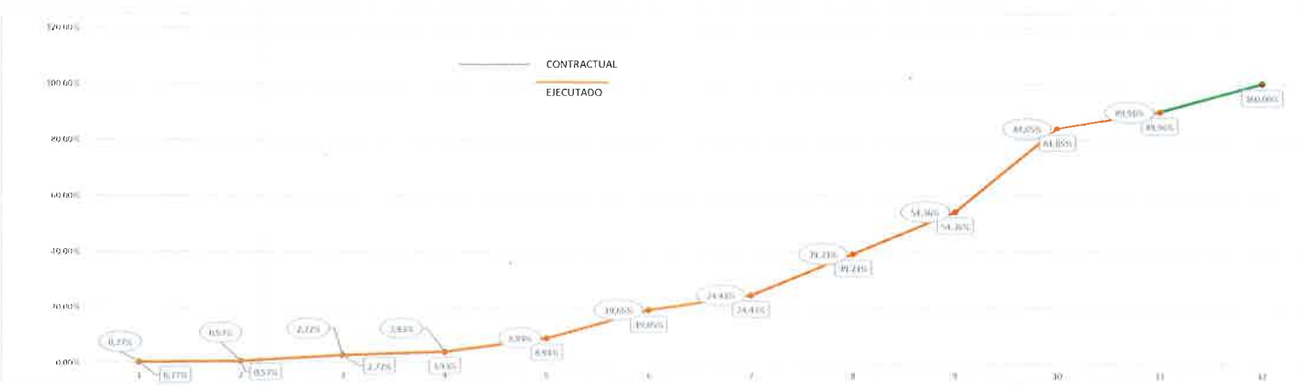

Representante legal
Contratista

Fiscal de Obras

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000080

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 01/octubre/2022

TIEMPO: Humedo

Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Por la presente se deja constancia que en el dia de la fecha no se registra trabajo en Obra, que es a consecuencia de tiempo humedo

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000081

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 48/2021

CONTRATO Nº 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 05/octubre/2022

TIEMPO: Lluvia

Precipit. Mm: 24

ACTIVIDADES DE LA FECHA

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Por la presente se registra la precipitación (lluvia) en el día de la fecha, que fue de 24mm.

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000082

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021	CONTRATO Nº: 72/2021
PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO	SUPERVISOR:
LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO	FISCAL 1:
DPTO.: SAN PEDRO	FISCAL 2:
FECHA: 06/octubre/2022	TIEMPO: Lluvia Precipit. Mm: 33

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se Registra la precipitación (Lluvia) en Zona de Obras el dia de la fecha, que fue de 33mm.	

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA Nº 000083

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 48/2021

CONTRATO Nº 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 07 / octubre / 2022

TIEMPO: Humedo

Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se deja constancia que el dia de la fecha no se realizo actividad en Obra debido a tiempo Humedo.	

Arturo
RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000084

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 8 / octubre / 2022

TIEMPO: Bueno

Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se registran las Actividades realizadas esta semana en Obra: - Encofrado de Vigas del Nivel +6,50m - Cargamento de Hormigon en Vigas del Nivel +6,50 - Encofrado y Cargamento de Hormigon en Losas de bradería - Montaje de Cabriadas de Techo - Aislación horizontal para mampostería	

Arturo Ruiz.

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000085

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 10 / octubre / 2022

TIEMPO: Lluvia

Precipit. Mm: 14 —

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se registra la lluvia en el día de la fecha, que fue de 14 mm.	

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.H.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000086

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 48/2021

CONTRATO Nº 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 11/octubre/2022

TIEMPO: Humedo Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se deja constancia que en el dia de la fecha no se realizo actividad en Obra debido a tiempo Humedo	

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000087

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 48/2021

CONTRATO Nº 12/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR

LOCALIDAD: ITA. ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA 13/octubre/2022

TIEMPO: (Bueno) Lluvia Precipit. Mm: 15

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
-Por la presente se adjunta el Correo Electronico de Solicitud de Aprobación de Azulejos para Obra.	
-Tambien se registra la precipitación (Lluvia) en el dia de la fecha, que fue de 15 mm.	
-Se Selecciona el azulejo imagen 2	

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

s://mail.google.com/mail/u/0/?ik=b83c96eef8&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7170857605746893388&simpl=msg-a%3Ar71659... 1/1

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

NACIONAL DE DEPORTES

RITTER CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000088

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 14 /octubre/ 2022

TIEMPO: Lluvia

Precipit. Mm: 26

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se Registra la Precipitación (Lluvia) en el día de la fecha, que fue de 26mm.	

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRA

Nº 000089

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 15/octubre/2022

TIEMPO: Humedo

Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA

- Por la presente se registran las Actividades realizadas en Obra en esta semana

  - Cargamento de Hormigon para Vigas del Nivel +6,5m
  - Mampostería de Ladrillos a la vista

- Tambien se registra que el dia de la fecha no se registro actividad alguna en Obra, debido a tiempo Humedo

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRA

Nº 000090

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 17/octubre/2022

TIEMPO: lluvia

Precipit. Mm: 21

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se registra la Precipitación (Lluvia) en zona de obras, que fue de 21MM.	

Arturo Ruiz.

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000091

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 18/Octubre/2022

TIEMPO: Humedo

Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se deja constancia que el dia de la fecha no se registro Actividad Alguna en Obra, por consecienuia de tiempo Humedo posterior a la Lluvia del dia de ayer: 17/octubre/2022	

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRA

Nº 000092

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 20/Octubre/2022

TIEMPO: Lluvia

Precipit. Mm: 85

ACTIVIDADES DE LA FECHA

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Por la presente se adjunta el Correo de Solicitud de Verificación y aprobación de muestras para:
- Artefactos de Instalación Sanitaria
- Artefactos de Instalación Electrica.

- TaMbien se registra la lluvia caida en zona de obras el dia de la fecha, que fue de 85mm.

* Aprobado los muestras

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

RITTER CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000093

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 21/octubre/2022

TIEMPO: Lluvia

Precipit. Mm: 75 mm

ACTIVIDADES DE LA FECHA

Por la presente se registra la precipitación (Lluvia) en el día de la fecha, que fue de 75 mm

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Arturo Ruiz
RESIDENTE

Fiscal

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

RITTER CONSTRUCCIONES S.A.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRA

Nº 000094

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 22 de octubre 2022

TIEMPO: Humedo

Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se deja constancia que el dia de la fecha no se registro actividad alguna en obra, por consecuencia de tiempo humedo posterior a la lluvia del dia de ayer: 21 de octubre de 2022	

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO. CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCTORA S.R.L.
Ing. Víctor J. [illegible]
Socio Ge[illegible]

NACIONAL DE DEPORTES

RITTER

LIBRO DE OBRA

Nº 000095

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 27 /octubre /2022

TIEMPO: Lluvia Precipit. Mm: 61 mm

ACTIVIDADES DE LA FECHA

Por la presente se registra la precipitación (Lluvia) en el día de la fecha, que fue de 61 mm

Se adjunta el correo de Aprobación de muestras, planos de:
- Cerramiento
- Canaletas.

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Arturo Ruiz
RESIDENTE

Fiscal

ORIGINAL CONTRATISTA
DUPLICADO ARCHIVO TRIBUNARIO
TRIPLICADO CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES
Ing. Víctor J. R
Socio Gere

DEPORTES

LIBRO DE OBRA

Nº 000096

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 28 Octubre 2022

TIEMPO: Humedad

Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se deja constancia que el día de la fecha no se registro actividad alguna en obra, por consecuencia de tiempo humedo posterior a la lluvia del día de ayer: 27 octubre 2022.	

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL CONTRATISTA
DUPLICADO ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES
Ing. Victor J. Ritter
Socio Gerente

LIBRO DE OBRA

Nº 000097

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 48/2021

CONTRATO Nº 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 29 Octubre 2022

TIEMPO: Lluvia

Precipit. Mm: 30mm

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se registra la precipitación (Lluvia) en el día de la fecha, que fue de 30 mm.	
Se registran actividades realizadas en obra en esta semana	
- Mampostería en el nivel +4,40	
- Instalaciones Electricas	
- Cargamento de Hº en vigas de nivel +6,50	

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

RITTER CONSTRUCCIONES
Ing. Víctor J. R
Socio Ger

ORIGINAL CONTRATISTA
DUPLICADO ARCHIVO INSPECTOR
TRIPLICADO CONTABILIDAD

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000098

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 30 Octubre 2022

TIEMPO: Lluvia

Precipit. Mm: 66 m

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se registra la precipitación (Lluvia) en el día de la fecha, que fue de 66 mm.	

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter
Socio Ger

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000099

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 31 octubre 2022

TIEMPO: Lluvia

Precipit. Mm: 110 mm

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se registra la el día de la fecha, que fue	precipitación (Lluvia) en de 110mm

Arturo Ruiz

RESIDENTE

Fiscal

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L
Ing. Víctor J. Ritter S
Socio Gerente

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 000100

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 01/11/22

TIEMPO: Lluvia. Precipit. Mm: 15

ACTIVIDADES DE LA FECHA

Por la presente se registra la precipitación (lluvia) en el día de hoy, que fue de 15 mm

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Arturo Ruiz
RESIDENTE

Fiscal

02 Tal. de 50x3 del 0001 al 0100

ORIGINAL: CONTRATISTA
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S
Socio Gerente

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

Nº 0000101

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA : SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021 | CONTRATO Nº : 72/2021

PROYECTO : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO | SUPERVISOR :

LOCALIDAD : ITACURUBI DEL ROSARIO | FISCAL 1 :

DPTO.: SAN PEDRO | FISCAL 2 :

FECHA : 09 /Noviembre /2022 | TIEMPO : Bueno | Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA | OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Por la presente Se registra las Actividades Llevadas a cabo en la Semana:

- Mampostería de Elevación.
- Relleno de suelo, y compactación
- Ejecución de Ductea do para Instalación Electrica
- Colocación de caños PVC para Desague cloacal.
- Colocación de caños PVC termofusiones.

Arturo Ruiz
RESIDENTE

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

FISCAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter

Nº 0000102

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 12 / Noviembre / 2022

TIEMPO: Lluvia Precipit. Mm: 25

ACTIVIDADES DE LA FECHA

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Por la Presente se Registran.

1) Actividades Realizadas en la Semana:

- Mamposteria de Elevacion
- Relleno y Compactación de Suelo
- Ejecución de Ductado de Instalaciones Electricas
- Excavación de Zanjas para Instalación Electrica
- Ejecución del Techado

2) Lluvia en la fecha que fue de 25mm

Arturo Ruiz

RESIDENTE

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

FISCAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

Nº 0000103

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA : SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021 | CONTRATO Nº : 72/2021

PROYECTO : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO | SUPERVISOR :

LOCALIDAD : ITACURUBI DEL ROSARIO | FISCAL 1

DPTO.: SAN PEDRO | FISCAL 2

FECHA : 13/ Noviembre /2022 | TIEMPO Lluvia | Precipit Mm: 30.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se registra la precipitación (Lluvia) en el día, que fue de 30mm.	

Arturo Ruiz
RESIDENTE

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

FISCAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter

Nº 0000104

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA : SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº : 72/2021

PROYECTO : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR :

LOCALIDAD : ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1 :

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2 :

FECHA : 14/Noviembre/2022

TIEMPO Humedo Precipit. Mm. —

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se Registra que por tiempo Humedo no se registro Actividad en Obra	

Arturo Ruiz
RESIDENTE

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

FISCAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter

Nº 0000105

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA : SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº 72/2021

PROYECTO : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR :

LOCALIDAD : ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1 :

DPTO.: SAN PEDRO

FISCAL 2 :

FECHA : 15 /Noviembre /2022

TIEMPO : Humedo Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se registra que a consecuencia de tiempo humedo no se realizo actividad en Obra.	

Arturo Ruiz

RESIDENTE

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

FISCAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

Nº 0000106

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA : SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021	CONTRATO Nº : 72/2021
PROYECTO : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO	SUPERVISOR :
LOCALIDAD : ITACURUBI DEL ROSARIO	FISCAL 1 :
DPTO.: SAN PEDRO	FISCAL 2 :
FECHA : 19 / Noviembre / 2022	TIEMPO : Bueno Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA

Por la presente se registra las actividades realizadas en la semana.

- Ejecución de Revoques de Muros
- Ejecución de Registros de Instalación Electrica
- Montaje de transformador de Energia Electrica
- Ejecución de Piso de ACM.
- Ejecución de Instalación de Cañeria para Abastecimiento de Agua
- Ejecución de Mamposteria de ladrillos a la vista y Ladrillos Convoco.

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Arturo
RESIDENTE

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

FISCAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter

Nº 0000107

LIBRO DE OBRA

ONTRATISTA : SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº : 48/2021	CONTRATO Nº : 72/2021
PROYECTO : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO	SUPERVISOR :
LOCALIDAD : ITACURUBI DEL ROSARIO	FISCAL 1 :
DPTO.: SAN PEDRO	FISCAL 2 :
FECHA : 21 /Noviembre /2022	TIEMPO : Lluvia, Precipit. Mm. 14

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se registra la precipitación (Lluvia) que fue de 14MM.-	

Arturo Ruiz.
RESIDENTE

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

FISCAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter

Nº 0000108

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021

CONTRATO Nº: 72/2021

PROYECTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO

SUPERVISOR:

LOCALIDAD: ITACURUBI DEL ROSARIO

FISCAL 1:

DPTO: SAN PEDRO

FISCAL 2:

FECHA: 22 / Noviembre / 2022

TIEMPO: Lluvia Precipit. Mm: 12

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se registra la Precipitación Lluvia El día de la fecha, que fue de 12mm	

Arturo Ruiz
RESIDENTE

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

FISCAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter

Nº 0000109

LIBRO DE OBRA

ITRATISTA : SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

CITACION PUBLICA NACIONAL Nº : 48/2021	CONTRATO Nº : 72/2021
ROYECTO : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI EL ROSARIO	SUPERVISOR :
OCALIDAD : ITACURUBI DEL ROSARIO	FISCAL 1 :
PTO : SAN PEDRO	FISCAL 2 :
ECHA : 23/ Noviembre / 2022	TIEMPO : Humedo Precipit. Mm: —
ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Por la presente se registran

1) Aprobación de la pintura para Aberturas metalicas : color grafito en esmalte sintetico

2) La Humedad en Obra que imposibilito los trabajos el dia de hoy

Arturo Ruiz
RESIDENTE

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

FISCAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

Nº 0000113

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA : SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021 | CONTRATO Nº 72/2021

PROYECTO : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO | SUPERVISOR :

LOCALIDAD : ITACURUBI DEL ROSARIO | FISCAL 1 :

DPTO.: SAN PEDRO | FISCAL 2 :

FECHA : 30/11/22 | TIEMPO : Bueno | Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Por la presente se adjuna la copia del correo de solicitud de revisión y aprobación de Muestras para pintura de paredes Interiores	

Arturo Ruiz
RESIDENTE

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

FISCAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

Nº 0000110

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA : SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 43/2021	CONTRATO Nº : 72/2021
PROYECTO : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO	SUPERVISOR :
LOCALIDAD : ITACURUBI DEL ROSARIO	FISCAL 1 :
DPTO.: SAN PEDRO	FISCAL 2 :
FECHA : 25/Noviembre/2022	TIEMPO : Bueno Precipit. Mm:

ACTIVIDADES DE LA FECHA — OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Asunto: Extensión de Linea de Media Tensión y Seguimiento de Obra.

-Por la presente se trascribe la consulta sobre el estado de la Extensión de Linea de Media Tensión hasta la Ubicación del Trasformador de Obra.
-Por parte de la Contratista Ritter Construcciones S.R.L. fue hecha la consulta a la Fiscal de Obra se trascribe a continuacion:

De: Ing. Maria F. Castro < fernanda.castro@ritter.com.py
Enviado el: Lunes, 21 de Noviembre de 2022 19:27
Para: Silvia Arhens < sarhens@gmail.com >
CC: Aldo Marcos Moscarda < aldo.marcos@ritter.com.py,
Martis Nuñez < aplanificacion14@ritter.com.py
Asunto: Seguimiento de Obra Polideportivo Itacurubi
Buenas tardes Arq. Silvia
Saludos Cordiales,
El Presente es para comentarle algunos puntos.
1- Consultarle por el estatus de la conexión de media Tension para nuestra Obra, que habiamos hablado que el Intendente estaria haciendo esas gestiones con ANDE
2. Tenemos más actividades que no están en nuestra planilla, y queremos preparar borrador para la segunda adenda. esto sería por la construcción de Carpetas en pisos, el aumento de los cerramientos en seco y la pintura de los ladrillos vistos.
3- Solicitaremos prorroga por lluvias, lo que nos llevaría en teoria del 23/12/22 al 20/02/23. Adjunto la imagen de la propuesta del calendario de lluvias.

Estadistica de Lluvia (Octubre)

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Lluvia				3	9	11	H	H		2	7,5		6						35	52	H	H					

Dia	28	29	30	31	Precipitaciones Registradas	Dias de Lluvia
Lluvia	2	55	71	H	324,5	14

RESIDENTE
Arturo Ruiz

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

FISCAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter CONSTRUCCIONES

Nº 0000111

LIBRO DE OBRA

NTRATISTA : SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

ITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021	CONTRATO Nº : 72/2021
OYECTO : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI L ROSARIO	SUPERVISOR :
CALIDAD : ITACURUBI DEL ROSARIO	FISCAL 1 :
TO.: SAN PEDRO	FISCAL 2 :
CHA : 25 / Noviembre / 2022	TIEMPO : Bueno Precipit. Mm: —

ACTIVIDADES DE LA FECHA

Por la Presente se transcribe El correo de Respuesta al correspondiente del Libro de Obras Nº 0000110

Para: Ing. Maria F. Castro.
De: Silvia Arhenz <sarhensg@gmail.com>
CC: Aldo Marcos Moscarda; Marlis Nuñez

Buen Dia,

-o ultimo Conversado con el intendente él ya había conversado con la ANDE para hacer esos trabajos, me gustaria que coordine con su electricista para tener claro la ubicación y los tiempos.

Me podrias por favor las planillas e indicar los Lugares que se dan estos adicionales

Con respecto a los dias de lluvia, segun las EETT solo lluvia mayor a 100mm son las que se consideran y los dia de humedad solo consideramos 1dia, tambien eliminar los dias de domingo del calendario

Desde ya muchas gracias

Saludos.

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Arturo Ruiz
RESIDENTE

FISCAL

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ritter

Nº 0000112

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA : SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 48/2021	CONTRATO Nº : 72/2021
PROYECTO : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ITACURUBI DEL ROSARIO	SUPERVISOR :
LOCALIDAD : ITACURUBI DEL ROSARIO	FISCAL 1 :
DPTO.: SAN PEDRO	FISCAL 2 :
FECHA : 26-11-2022	TIEMPO : Bueno Precipit. Mm:

ACTIVIDADES DE LA FECHA

Por la presente se registran las actividades realizadas en la semana:

- Revoque de muros.
- Revestimiento ceramico
- Piso de Hormigon de 10cm y 9cm.
- Barandas en Graderias.
- Instalacion Electrica (Bocas.
- Montaje de Chapas.
- Relleno y compactación de suelo

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Arturo Ruiz
RESIDENTE

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

FISCAL
