Punto ***3.1.4 Impedancia de secuencia Cero:....=0,8189 Ω/fase***

Consultamos:

<u>Punto 3.1.2 Corriente de neutro</u>

3.1.2 Corriente de neutro: a tensión y frecuencia nominal, en condiciones de cortocircuito efectivo fase-tierra en los terminales, sin sobrepasar las temperaturas indicadas en las recomendaciones IEC-60076 para una elevación media de temperatura del arrollamiento de 65 ºC.:

Corriente de Corta Duración: ..... Fase(lado 23 kV): 3100 A
Neutro(lado 23 kV):: 9300 A
Duración máxima ..... 10 seg.

De acuerdo a estos valores la distribución de corriente para fallo fase – tierra es :

<u>Circuito para determinar Secuencia Cero</u>

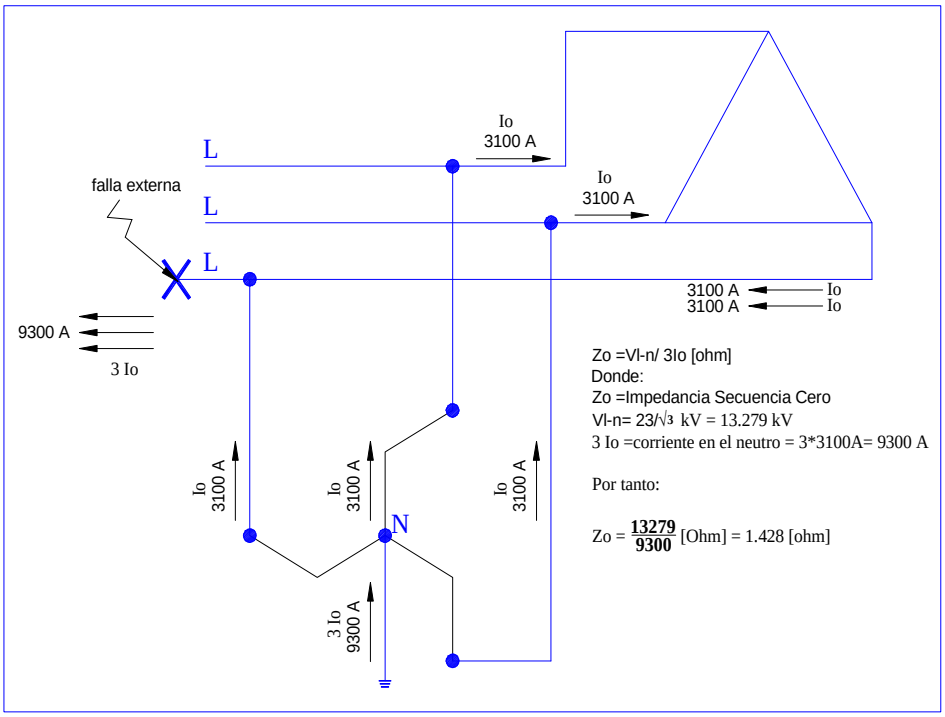

Favor confirmar en base a todo lo indicado que el valor de la Impedancia de Secuencia Cero es de 1,428 Ω.?
