ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000057671 creado correctamente el 09/01/2024 a las 15:10h (código interno de expediente 60605112-1000057671-60606627). Creado por: JULIO ESTEBAN MENDOZA ORTEGA, documento de identificación 2040407 (Cédula de identidad).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR INFORMES

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
presentacion del informe correspondiente al mes de diciembre 2023. consorcio electrointec.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'scan_20240109104119.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000057671 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=60605112-1000057671-60606627

electrointec

Asunción, 09 ENERO de 2024
NOTA_CEI_112 2024

Señores
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
Presente:

Ref.: LPN 1647/2021 Contratación de Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución. ID Nº 398.415
Contrato N° 8767/2022

Asunto: Presentación de informe mensual.

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda a los efectos de presentar el:

INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **2023**, del contrato de referencia;

La versión digital y las copias impresas, como descrito en los Términos de Referencia, serán entregados al Administrador del Contrato.

Sin otro particular, nos despedimos.

.....
Lic. Julio Esteban Mendoza Ortega, MBA
Representante Legal

electrointec

INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSULTOR

INFORME N.° 016/2022

“SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN” CONVENIO ANDE - ITAIPU

Contrato N.° 8767/2022

Referencia: Mes de diciembre de 2023

electrointec

ÍNDICE

1 PRESENTACIÓN 3
2 INFORMACIONES GENERALES DE LA FISCALIZACION 4
2.1. Personal de la Fiscalización 4
2.2. Equipamientos de la Fiscalización 5
2.3. Certificaciones de la fiscalización 5
2.4. ACTIVIDADES CONFORME EL ALCANCE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 6
2.4.1 Gerenciamiento y planeamiento 6
2.4.2 Fiscalización de obras 8
2.4.3 Actividades complementarias 11
3. COMUNICACIONES RECIBIDAS Y REMITIDAS 18
3.1. Notas Recibidas 18
3.2. Notas remitidas 19
4. CONCLUSIONES 20
5. ANEXOS 21

1 PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo relatar el avance de las actividades realizadas por el Consorcio ElectroIntec responsable por los Servicios Profesionales de Supervisión Técnica, correspondiente a las obras para mejoramiento y refuerzo del sistema de distribución, durante el mes de diciembre de 2023.

2 INFORMACIONES GENERALES DE LA FISCALIZACION

2.1. Personal de la Fiscalización

El personal afectado durante el mes de referencia se presenta en el siguiente cuadro:

N.º	CARGO	NOMBRE	INCORPORACION	CTO. / LICITACIÓN
1	Ingeniero	Fernando Alegre	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPI 1207/17
2	Ingeniero	Fernando Fretes	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPI 1207/17
3	Ingeniero	Walter Noldin	Incorporado	N.º 8767/2022 – LPN 1647/21
4	Ingeniero	Eduardo Juvinel	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
5	Ingeniero	Richard Arroyo	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
6	Ingeniero	Guillermo Vera	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
7	Ingeniero	Félix Fernández	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
8	Fiscal de obras	María Inés Torres	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPI 1207/17
9	Fiscal de obras	Santiago Joel Benítez	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPI 1207/17
10	Fiscal de obras	Catalino Chaparro	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPI 1207/17
11	Fiscal de obras	Patrocinio Diaz	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
12	Fiscal de obras	Diego Zalazar	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
13	Fiscal de obras	Cristhian Delgado	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
14	Fiscal de obras	Claudio Martínez	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
15	Fiscal de obras	Derlis Acosta	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
16	Fiscal de obras	Gloria Riveros	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
17	Fiscal de obras	Saulo Cano	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
18	Fiscal de obras	Wilson Espínola	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
19	Fiscal de obras	Guillermo Arce	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
20	Fiscal de obras	Federico Maldonado	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
21	Operador de PC	José Jara Recalde	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
22	Operador de PC	Pedro Ferreira	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
23	Operador de PC	José Acosta	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
24	Especialista en Sistemas Informáticos	Iván Samudio	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21
25	Especialista en Sistemas Informáticos	Alcides Fernández	Incorporado	N.º 8767/2022 - LPN 1647/21

Se produjo la vinculación de 3 (tres) fiscales al plantel del personal de la consultora. Los mismos son el Sr. Guillermo Arce, el Sr. Federico Maldonado y la Señorita. Gloria Riveros y 1 (un) operador de PC. El mismo es el Sr. José Acosta. En adjunto al informe las Órdenes de Ejecución.

2.2. Equipamientos de la Fiscalización

A continuación, se presenta un listado que contiene los equipamientos, inmuebles y la movilidad que se empleará por la fiscalización.

Nro.	DESCRIPCION	CANTIDAD	INCORPORACIÓN
1	Vehículo doble cabina 4x4 con previsión de combustible	08	Incorporado

2.3. Certificaciones de la fiscalización

Mes	Certificado	Monto Certificado Mensual	Monto Total del Contrato	Monto Certificado Acumulado	Monto Neto
	[Nro.]	[Gs]	[Gs]	[Gs]	[Gs]
			18.726.468.600		
Set/22	1	108.007.831	18.618.460.769	108.007.831	108.007.831
Oct/22	2	258.251.015	18.360.209.754	366.258.846	366.258.846
Nov/22	3	264.927.933	18.095.281.821	631.186.779	631.186.779
Dic/22	4	255.820.311	17.838.461.510	888.007.090	888.007.090
Ene/23	5	302.976.315	17.535.485.195	1.190.983.405	1.190.983.405
Feb/23	6	318.460.242	17.217.024.953	1.509.443.647	1.509.443.647
Mar/23	7	358.857.644	16.858.167.309	1.868.301.291	1.868.301.291
Abr/23	8	399.689.089	16.458.444.795	2.268.023.805	2.268.023.805
May/23	9	429.431.388	16.029.013.407	2.697.455.193	2.697.455.193
Jun/23	10	429.431.388	15.599.582.019	3.126.886.581	3.126.886.581
Jul/23	11	429.431.388	15.170.150.631	3.556.317.969	3.556.317.969
Agos/23	12	429.431.388	14.740.719.243	3.985.749.357	3.985.749.357
Set/23	13	336.570.379	14.404.148.864	4.322.319.736	4.322.319.736
Oct/23	14	284.378.366	14.119.770.498	4.606.698.102	4.606.698.102
Nov/23	15	324.538.404	13.795.232.094	4.931.236.506	4.931.236.506
Dic/23	16	214.153.386	13.581.078.708	5.145.389.892	5.145.389.892

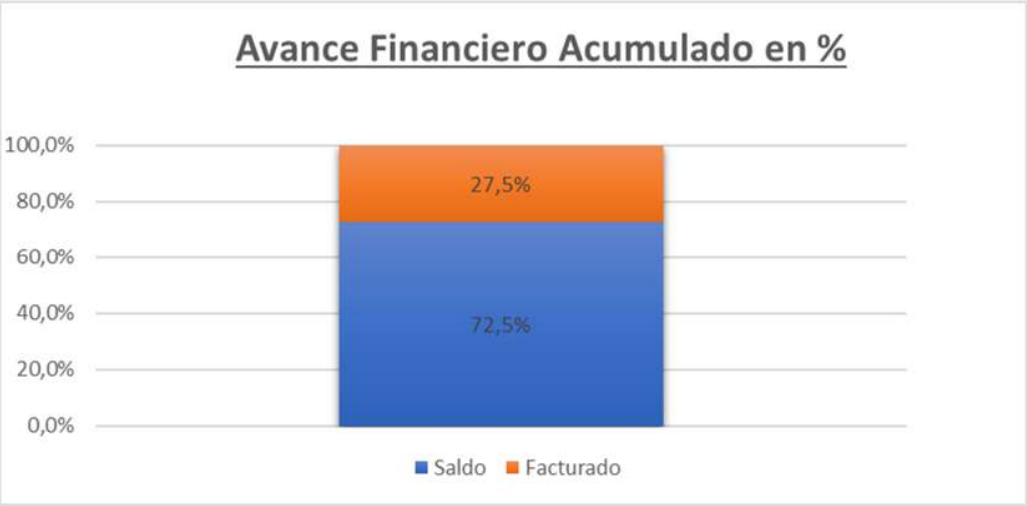

2.4. ACTIVIDADES CONFORME EL ALCANCE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

2.4.1 Gerenciamiento y planeamiento

Las principales actividades realizadas durante el mes se detallan a continuación:

- Elaboración de Informe Mensual de las Actividades del Consultor correspondientes al mes de noviembre de 2023.

- Recibir, procesar, remitir y seguimiento de documentos correspondientes a las obras de mejoramiento del sistema de distribución de energía eléctrica.
- Reuniones periódicas con la Unidad Administradora de Contrato.

- Elaboración de Registro diario con el planeamiento de las actividades de todas las contratistas de los lotes de la licitación 1207/2017.

- Evaluación de Ajustes de Precios enviados por los Consorcios a esta fiscalización.

- Verificación del listado de trabajos pendientes de calidad de cada Lote de la LPI 1207/17

- Gestión de solicitudes de cortes de tensión y estados de precaución presentadas por las contratistas.

- Control de vales de devolución de materiales nuevos sobrantes de los Consorcios.

- Elaboración de Informes de Medición Final de los alimentadores del Lote 2 de la L.P.I. 1207/17.

- Comunicación continua a través de los grupos de WhatsApp con las operadoras de Telecomunicaciones respecto a los retiros de postes comprometidos por fibras, así como avisos en caso de tener incidentes por avería de algunos puntos por motivos accidentales de manera a tener una pronta respuesta para minimizar el tiempo de fueras de servicios de los abonados.

2.4.2 Fiscalización de obras

A continuación, se detallan los trabajos en los distintos lotes que componen la LPI 1207/17:

Lote 02 – San Lorenzo – Consorcio San Lorenzo

CERTIFICADOS DE REAJUSTES.

Durante el mes se presentaron 3 (tres) certificados de Reajustes, de los cuales 2 (dos) fueron devueltos al Consorcio para realizar las correcciones observadas.

TRABAJOS PENDIENTES

Se resolvieron 260 pendientes, quedan 3.457 trabajos pendientes a realizarse.

CUADRILLAS

El Consorcio actualmente con una cuadrilla para trabajos menores.

Lote 03 – Puerto Botánico – Consorcio Metropolitano

TRABAJOS PENDIENTES.

- La cantidad de trabajos pendientes en total son de **3.369 unidades**.

- Se resolvieron: **1.498 unidades.**

- Quedando la cantidad de **1.800** trabajos pendientes a resolver. Esta cantidad refleja los trabajos que siguen pendientes y otros trabajos que se han resuelto de forma parcial.

CUADRILLAS

Solamente la cuadrilla de la empresa 14 de Julio realizó los trabajos pendientes y las cuadrillas de las empresas TyC y Tecnoplus Ingeniería se presentarán recién el mes que viene para dar continuidad a la resolución de los trabajos pendientes.

DEVOLUCIÓN DE MATERIALES NUEVOS SOBRANTES.

En cuanto a la devolución de materiales nuevos sobrantes importados, aún queda por devolver

- Cable protegido de 185mm2, la cantidad de 9.640 metros.

Lote 06 – Lambaré – Consorcio Los Nogales

TRABAJOS PENDIENTES.

Durante el mes se realizó el acompañamiento de la resolución de trabajos pendientes, quedando de la siguiente manera:

- Cantidad total de trabajos pendientes: **936 unidades.**
- Trabajos pendientes resueltos: **806 unidades**
- Quedan por resolver **130 unidades.**

CUADRILLAS

La cuadrilla de la empresa Saguan estuvo encargado de realizar los trabajos pendientes.

DEVOLUCIÓN DE MATERIALES NUEVOS SOBRANTES.

Con respecto a los materiales nuevos sobrantes importados, aún no fueron devueltos y se espera que en la brevedad se realicen las devoluciones.

- Cable protegido de 70mm2: 13.027 metros
- Perchas espaciadoras: 765 unidades

2.4.3 Actividades complementarias.

Departamento de Normalización de Equipos y Materiales de Distribución (DD/NEM). ANDE-Sede Central

Trabajos realizados por:

- **Ing. Eduardo Juvinel**

- Consultas previas pertenecientes al Grupo de Consumo Intensivo Especial.

- Análisis y elaboración de informe de factibilidad técnica.

- Tareas asignadas por los superiores (reuniones, fiscalizaciones, etc.)

Trabajos realizados por:

- **Ing. Gloria Riveros**

- Inducción a consultas previas pertenecientes al Grupo de Consumo intensivo Especial.

- Análisis y elaboración de informe de factibilidad técnica.

- Tareas asignadas por los superiores (reuniones, fiscalizaciones, etc.)

Sección de Normalización de Operación (DD/DNO). ANDE-Sede Central.

Trabajos realizados por:

- **Ing. Richard Arroyo**

- Validación de ajustes de protección, análisis de los Registros de fallas y descarga de datos de carga en campo, de los equipos de protección (reconectadores trifásicos) instalados sobre los alimentadores PAR 03, QUI 03, CAE 03, ELA 01, ELA 03, ELA 04, a cargo del Sistema de Distribución Regional Central (DR/DOC).

- Validación de ajustes de protección, análisis de los Registros de fallas y descarga de datos de carga en campo, de los equipos de protección (reconectadores trifásicos) instalados sobre los alimentadores ITG 03 y ITG 11, a cargo del Sistema de Distribución Regional Central (DR/DOC).

- Elaboración de informe de las implementaciones efectuadas en los equipos de protección instalados los Alimentadores MES 02 y MES 05, que atienden al departamento de Boquerón, a cargo del Sistema de Distribución Regional Chaco DR/CH, y recomendación de los calibres de fusibles a ser instalados en los arranques de las troncales de los mencionados alimentadores.

Trabajos realizados por:

- **Ing. Félix Fernández**

- Estudio de datos estadísticos de transformadores de distribución averiados de la ANDE.
- Elaboración de presentación titulada "ANÁLISIS DE DATOS DE AVERÍAS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA ANDE, PERÍODO 2012-2016", con el siguiente contenido: Datos históricos de transformadores de distribución

averiados. Procedimiento para sacar fuera de servicio a un transformador de distribución según la literatura. Diagnósticos de fallas según la literatura. Diagnóstico técnico de avería de transformadores de distribución según ANDE. Datos estadísticos de transformadores averiados por potencia nominal ANDE. Comparativo anual de transformadores averiados de todas las zonas (MET. CAPITAL, MET. CENTRAL, MET. CORDILLERA, MET PARAGUARÍ, NORTE, SUR, ESTE, CENTRO, CHACO). Comparativo anual de transformadores averiados de todas las zonas para el periodo de estudio. Comparativo de transformadores averiados de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016

Trabajos realizados por:

- **Wilson Espínola**

- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 10335, 10336,10550, del alimentador ELA 01.
- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 10437, 10439, 10444, del alimentador ELA 03.
- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 10331, 10334,10460, SN50 del alimentador ELA 04.
- Informe de propuesta de ajustes de los reconectadores instalados en la zona de Influencia del alimentador ELA 01, ELA 03, ELA 04 en la zona de Eusebio Ayala.
- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 10321, 10322,10357, 10358 del alimentador CAE 03.
- Informe del proyecto piloto detectores de ausencia de media tensión TS200MT, de la marca TECSYS.

- Instructivo de configuración de alarmas TS200MT de la marca TECSYS.
- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 29087, 29091, del alimentador MES 02.
- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 29081, 29082, 29083, 29100 del alimentador MES 03.
- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 29084, 29085, del alimentador MES 04.
- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 29088, 29089, 29090, del alimentador MES 05.
- Informe de propuesta de ajustes de los reconectadores instalados sobre los alimentadores MES 02, MES 03, MES 04, MES 05 en la zona de Mcal. Estigarribia.

Trabajos realizados por:

- **Saulo Cano**

- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 10335, 10336,10550, del alimentador ELA 01.
- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 10437, 10439, 10444, del alimentador ELA 03.
- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 10331, 10334,10460, SN50 del alimentador ELA 04.

- Informe de propuesta de ajustes de los reconectadores instalados en la zona de Influencia del alimentador ELA 01, ELA 03, ELA 04 en la zona de Eusebio Ayala.

- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 10321, 10322,10357, 10358 del alimentador CAE 03.

- Informe del proyecto piloto detectores de ausencia de media tensión TS200MT, de la marca TECSYS.

- Instructivo de configuración de alarmas TS200MT de la marca TECSYS.

- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 29087, 29091, del alimentador MES 02.

- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 29081, 29082, 29083, 29100 del alimentador MES 03.

- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 29084, 29085, del alimentador MES 04.

- Informe de ajustes formato tavrida de los reconectadores 29088, 29089, 29090, del alimentador MES 05.

- Informe de propuesta de ajustes de los reconectadores instalados sobre los alimentadores MES 02, MES 03, MES 04, MES 05 en la zona de Mcal. Estigarribia.

Sección de Normalización de Equipos de Distribución (DD/NEM1). ANDE-Sede Central.

Trabajos realizados por:

- **Ing. Walter Noldin**

- Consultas previas pertenecientes al Grupo de Consumo Intensivo Especial.
- Análisis y elaboración de informe de factibilidad técnica.
- Tareas asignadas por los superiores (reuniones, fiscalizaciones, etc.)

Trabajos realizados por:

- **Ing. Claudio Martínez**

- Revisión de EETT de lámpara de vapor de sodio de alta presión.
- Revisión de EETT de artefacto para lámpara de vapor de sodio de alta presión.
- Revisión de EETT de Espaciador Polimérico para líneas aéreas de Baja Tensión

Departamento de Desarrollo del Sistema de Redes de Distribución (DD/ADS). ANDE-Sede Boggiani.

Trabajos realizados por:

- **Lic. Alcides Fernández**

a. Control, Implementación e Investigación

i. Creación de aplicación con la herramienta Oracle APEX para registrar metadatos de tablas como diccionario de datos.

ii. Investigación de funcionalidades de Oracle APEX para realización de aplicaciones más complejas.

iii. Preparación de tablas, vistas e importación en Oracle APEX para su posterior utilización en gráficos.

Trabajos realizados por:

- **Ing. Ivan Samudio.**

a. Control, Implementación e Investigación

i. Creación de aplicación con la herramienta Oracle APEX para registrar metadatos de tablas como diccionario de datos.

ii. Investigación de funcionalidades de Oracle APEX para realización de aplicaciones más complejas.

iii. Preparación de tablas, vistas e importación en Oracle APEX para su posterior utilización en gráficos.

3. COMUNICACIONES RECIBIDAS Y REMITIDAS

3.1. Notas Recibidas

UAC ANDE a Consorcio ELECTROINTEC

En el mes de referencia se tuvieron ordenes de ejecución emitidas por la UAC ANDE.

N°	FECHA	DE	PARA	ASUNTO
31	03/11/23	UAC- ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°31_2023. Aprobación para la contratación de personal para cargo de fiscal de obras.
32	10/11/23	UAC- ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°32_2023. Aprobación para la contratación de personal para cargo de Operador de PC.
33	29/11/23	UAC- ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°33_2023. Aprobación para la contratación de personal para cargo de fiscal de obras.
34	10/11/23	UAC- ANDE	Consorcio ELECTROINTEC	Recepción de Nota Orden de Ejecución N°34_2023. Aprobación para la contratación de personal para cargo de fiscal de obras.

3.2. Notas remitidas

Consorcio ELECTROINTEC a UAC ANDE

N°	FECHA	DE	PARA	ASUNTO
CEI_101-2023	30/11/2023	CONSORCIO ELECTROINTEC	UAC- ANDE	Presentación del Personal.
CEI_106_2023	26/12/2023	CONSORCIO ELECTROINTEC	UAC- ANDE	Presentación del Personal.
CEI_108_2023	03/01/2024	CONSORCIO ELECTROINTEC	UAC- ANDE	Presentación del Personal.
CEI_109_2023	03/01/2024	CONSORCIO ELECTROINTEC	UAC- ANDE	Presentación del Personal.

*Notas remitidas no hacen parte del legajo.

4. CONCLUSIONES

En cuanto a las actividades desarrolladas por el contratista y a la luz de la supervisión efectuada por el Consorcio ELECTROINTEC se formula los siguientes comentarios:

1. Para el Lote 02, Actualmente se resolvieron 260 pendientes. Quedan pendientes 3.457 trabajos a realizarse.
2. Para el Lote 03, la cantidad de trabajos pendientes en total son de 3.369 unidades. Se resolvieron: 1.498 unidades. Quedando la cantidad de 1.800 trabajos pendientes a resolver. Esta cantidad refleja los trabajos que siguen pendientes y otros trabajos que se han resuelto de forma parcial.
3. En el Lote 06, Durante el mes se realizó el acompañamiento de la resolución de trabajos pendientes, quedando de la siguiente manera:

   Cantidad total de trabajos pendientes: 936 unidades.

   Trabajos pendientes resueltos: 809 unidades

   Quedan por resolver 127 unidades.

5. ANEXOS

ANDE **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

Orden de Ejecución Nº 31

A: Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)

Dirección: Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**

De: Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Referencia: Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.

Fecha: Asunción, 30 de noviembre de 2023 **Hoja N° 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., con relación a su Nota N° CEI 101 – 2023, de fecha 30 de noviembre de 2023, recibida en Mesa de Entradas de ésta ANDE, vía Expediente digital N° 1000055201, en la misma fecha, por la cual proponen la incorporación de la Ing. Gloria Elena Riveros Armoa, para el cargo de Fiscal de Obras, presentando el Currículum de la candidata mencionada.

Al respecto, del análisis realizado al Currículum de la candidata propuesta, cumplimos en informarle que la misma cumple con lo exigido en los Documentos del Contrato, por lo que no tenemos objeciones a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

PIA

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

Ing. Cinthia Prendeski
Jefe - Área de Fiscalización y Control Final - ANDE

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 32

A:	Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)
Dirección:	Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**
De:	Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.
Referencia:	Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.
Fecha:	Asunción, 26 de diciembre de 2023 **Hoja N° 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., con relación a su Nota N° CEI 106 – 2023, de fecha 12 de diciembre de 2023, recibida en Mesa de Entradas de ésta ANDE, vía Expediente digital N° 1000056139, en la misma fecha, por la cual proponen la incorporación del Sr. José Luis Acosta González, para el cargo de Operador de PC, presentando el Currículum del candidato mencionado.

Al respecto, del análisis realizado al Currículum del candidato propuesto, cumplimos en informarle que el mismo cumple con lo exigido en los Documentos del Contrato, por lo que no tenemos objeciones a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 33

A:	Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)
Dirección:	Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**
De:	Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.
Referencia:	Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.
Fecha:	Asunción, 03 de enero de 2024 **Hoja Nº 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., con relación a su Nota N° CEI 108 – 2023, de fecha 27 de diciembre de 2023, recibida en Mesa de Entradas de ésta ANDE, vía Expediente digital N° 1000057020, en la misma fecha, por la cual proponen la incorporación del Sr. Guillermo Rubén Arguello Arce, para el cargo de Fiscal, presentando el Currículum del candidato mencionado.

Al respecto, del análisis realizado al Currículum del candidato propuesto, cumplimos en informarle que el mismo cumple con lo exigido en los Documentos del Contrato, por lo que no tenemos objeciones a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 34

A: Consorcio ELECTROINTEC (ELC – Electroconsult del Paraguay S.A. – INTEC S.A)

Dirección: Calle Conrado Ríos Gallardo N°1398 casi Cnel. Moreno, Asunción **Telefax:**

De: Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Referencia: Licitación Pública Nacional N°1647/2021 – Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución.

Fecha: Asunción, 03 de enero de 2024 **Hoja N° 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., con relación a su Nota N° CEI 109 – 2023, de fecha 27 de diciembre de 2023, recibida en Mesa de Entradas de ésta ANDE, vía Expediente digital N° 1000057019, en la misma fecha, por la cual proponen la incorporación del Sr. Federico Javier Maldonado Acevedo, para el cargo de Fiscal, presentando el Currículum del candidato mencionado.

Al respecto, del análisis realizado al Currículum del candidato propuesto, cumplimos en informarle que el mismo cumple con lo exigido en los Documentos del Contrato, por lo que no tenemos objeciones a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Christian Achón Fs
Jefe UAC

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

electrointec

CERTIFICADO

Por el presente documento, se deja constancia que dicho informe fue estudiado, corroborado y avalado por los responsables más abajo citados, dando fe y veracidad a este documento.

CONSORCIO ELECTROINTEC
Fernando Alegre
Ingeniero
