INFORME D.O P.M N° 134 /2023.

Corresponde al expediente N°6900/23 presentada en fecha 27 de Junio del 2023, presentado por el Sr. Leopoldo Benítez, en representación de la firma LBB CONSTRUCCIONES, referente al pedido de certificación N°1 por avance de Obra: "**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTANDER Y PARA LA CALLE HIPOLITO INANUE DE LA CIUDAD DE LUQUE.**", adjudicada según contrato N° 21/2023.

A: INTENDENCIA MUNICIPAL

La firma recurrente adjudicataria de la mencionada obra según el contrato mencionado más arriba solicita la certificación N° 1 por avance de obra contractual del 100% de obras por trabajos de "**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTANDER Y PARA LA CALLE HIPOLITO INANUE DE LA CIUDAD DE LUQUE.**"

Cabe mencionar que se encuentra en proceso una Addenda Ampliatoria y Modificatoria del mencionado contrato.

Se adjuntan los planos de relevamiento, certificado N°1, las tomas fotográficas.

Salvo mejor parecer.

Luque, 28 de Junio del 2023.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS
Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González.

Director de Obras Públicas Municipales.

PROCESADO

PLANO DE MEDICION

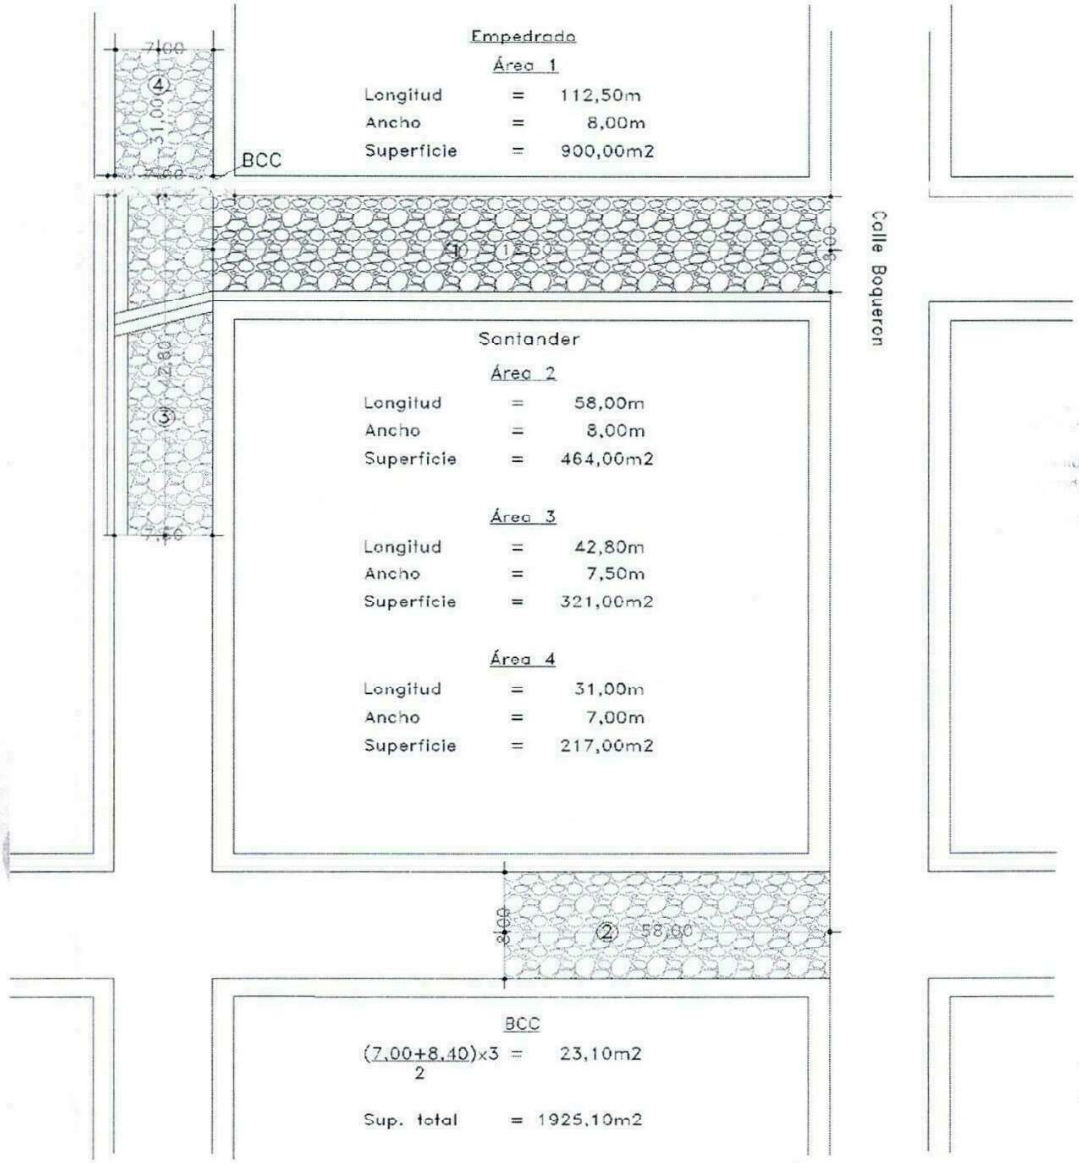

Ing. Benigno D. Ramírez L.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

PROCESADO

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Luque a los Veintiocho días del mes de Junio del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte el Ing. Benigno Ramírez, Fiscal de Obra, en representación de la Municipalidad de la Ciudad de Luque, y por otra parte el Sr. Leopoldo Benítez en representación de la firma LBB CONSTRUCCIONES, a los efectos de labrar el Acta de Medición que corresponde a los Rubros de la **"Obras: "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTANDER Y PARA LA CALLE HIPOLITO INANUE DE LA CIUDAD DE LUQUE."** Adjudicataria según **Contrato N° 21/2023** Suscripto con la Municipalidad de la Ciudad de Luque, se ha procedido a la medición y verificación de los trabajos realizados hasta el 27 de Junio del 2023 correspondiente al Certificado de Obra N° 1 en proceso.

Las Mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

Especificaciones Técnicas

Empedrado

Area 1

Longitud	=	112,50m
Ancho	=	8,00m
Superficie	**=**	**900,00m2**

Area 2

Longitud	=	58,00m
Ancho	=	8,00m
Superficie	**=**	**464,00m2**

Area 3

Longitud	=	42,80m
Ancho	=	7,50m
Superficie	**=**	**321,00m2**

Area 4

Longitud	=	31,00m
Ancho	=	7,00m
Superficie	**=**	**217,00m2**

BCC

$(\frac{7,00+8,40}{2})$x3,00	=	**23,10m2**
SUP. Total	**=**	**1925,10m2**

Cordones (Santander)

Long. Total	=	327,10m
Parte Sin Cordón	=	16,60m
Longitud	**=**	**310,50m**
Cord. Bajos	=	25,90m/2
Cordones Neto	**=**	**297,55m**

Cordones (Unanue)

Long. Total	=	116,00m
Cord. Bajos	=	6,00m/2
Cordones Neto	**=**	**113,00m**

Total, Cordones

297,55 + 113,00 = 410,55ml

PROCESADO

Se da Acta de avance de los trabajos culminados, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

Contratista.

LBB CONSTRUCCIONES De Leopoldo Benitez Bareiro RUC 948.027-8

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Fiscalización de Obras.

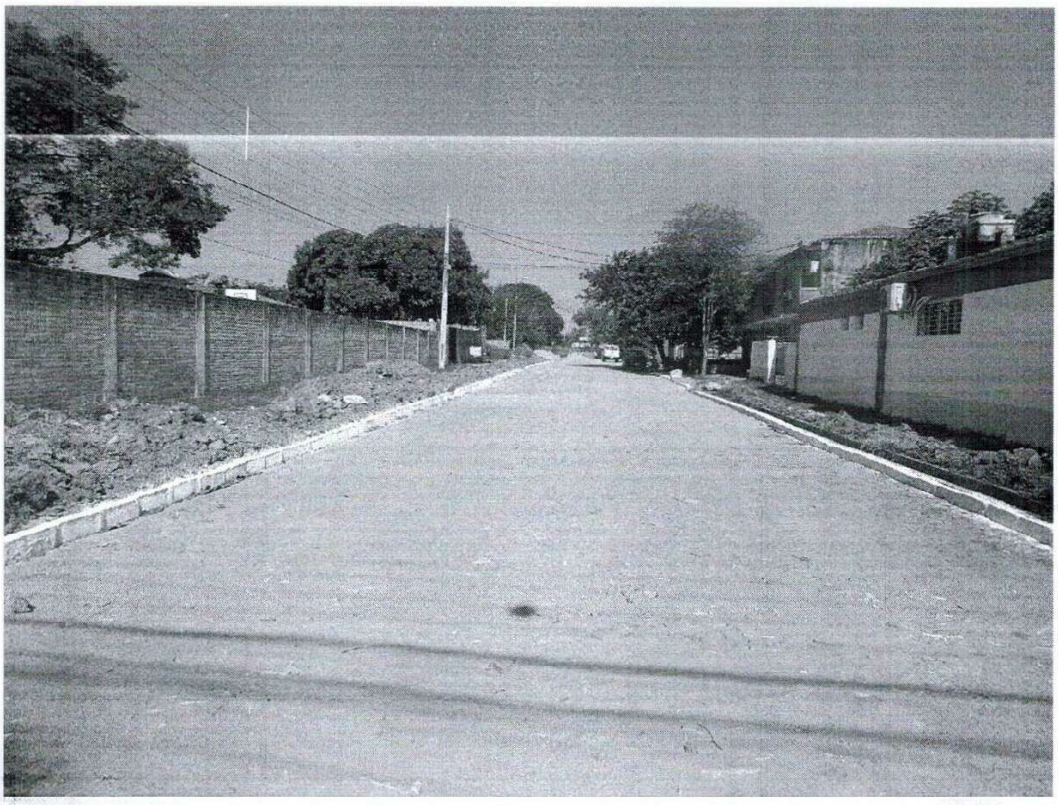

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Benigno D. Ramírez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

TOMAS FOTOGRAFICAS

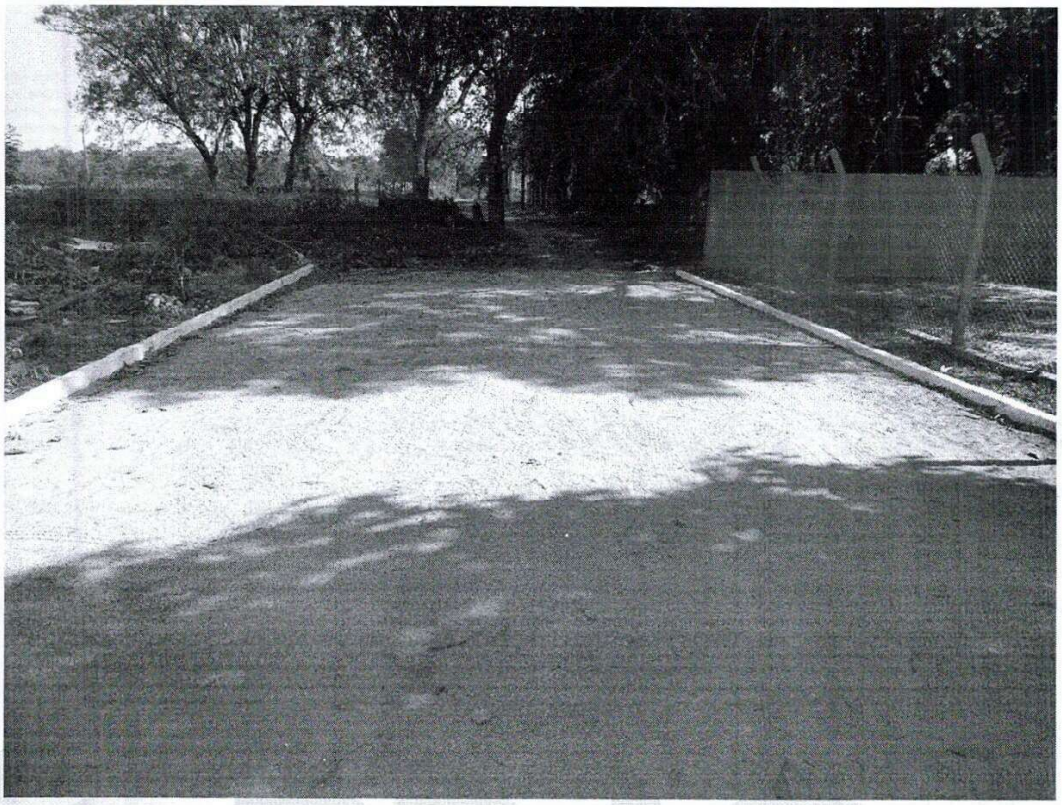

PROCESADO

Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
