GOBERNACION DE ITAPÚA
Resúmen del Certificado Básico Nº 01
Mes: agosto y setiembre

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1 - I. D. N° 416.272.-

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1**	100,00%	350.135.856			13,05%	45.682.076	13,05%	45.682.076
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**350.135.856**			13,05%	**45.682.076**	**13,05%**	**45.682.076**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	70.027.171		9.136.415	9.136.416
B.II	Para Fondo de Reparo	*5,00%*				
B	**Total Deducciones**		**70.027.171**		**9.136.415**	**9.136.416**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**36.545.661**	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**36.545.661**	

Certificado Básico Nº 1
Mes: noviembre
Contrato: 24/2022
Monto básico: 350.135.856 gs
Contratista: Metalúrgica Núñez
Fecha de inicio: 14/noviembre/2022
Plazo de ejecución: 120 días
Fecha de terminación: 14/marzo/2023
Ampliacion:

SON GUARANIES: Treinta y seis millones, quinientos cuarenta y cinco mil, seiscientos sesenta y uno.-

Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Dario Nuñez
R.U.C.: 2172215 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapúa - Py

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa
María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa
Ing. Nelson Tyrakowski
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

000003

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1 - I. D. N° 416.272.-

Contrato N°: 24/2022	
Monto del Contrato: 350.135.856 gs.	**Term. Prevista:** 14/marzo/2023
Plazo Contractual: 120 dias	**Ampliaciones:**
Inicio de Obra: 14/noviembre/2022	**Mes: noviembre**

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	0	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
1	**72153507-003**	**Servicio de Retiro de Vallado - Vallado de chapa N°27, h=2m con portón corredizo, servicios complementarios.**	Unidad de Medida Global	1	2.932.500	2.932.500		1.466.250			0	1.466.250	2.932.500
2	**72131601-002**	**Preparación de obra - Limpieza de obra**	Unidad	1	-	-		0			0	0	-
2,1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	230	3.797	873.310		873.310			0	0	873.310
2,2		Replanteo	Metros cuadrados	221,64	5.355	1.186.882		1.186.882			0	0	1.186.882
2,3		Nivelación de suelo para implantación de obra	Metros cúbicos	55,41	36.550	2.025.236		2.025.236			0	0	2.025.236
3	**72131604-004**	**Estructuras de H°A°**	Unidad de Medida Global	1	-	-		0			0	0	-
3,1		Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	11,48	1.853.850	21.282.198		21.282.198			0	0	21.282.198
3,2		Pilares de H° A°	Metros cúbicos	2,38	1.867.167	4.443.857		0	2.666.314	1.777.543		0	4.443.857
3,3		Vigas de H° A°	Metros cúbicos	4,88	1.833.167	8.945.855		0	4.472.927	4.472.927	0	0	8.945.855
3,4		Losa de H° A°	Metros cúbicos	1,21	1.753.833	2.122.138		0			2.122.138	0	2.122.138
4	**72131601-009**	**Colocación de Pisos - Contrapisos - Entrepiso de madera eucalipto. Luz de 4 mts tirantes de 2 x 5" cada 80 cms. Piso tabla mach de 1/2" x 3". Incluye MDO cornisa**	Metros cuadrados	202,85	206.833	41.956.074		0			41.956.074	0	41.956.074
5	**72131601-005**	**Mampostería - Muro de Nivelación de 0.30 ml**	Metros cuadrados	42,68	136.567	5.828.680		0	5.828.680	0	0	0	5.828.680
6	**72102905-001**	**Relleno y compactación de terreno - Relleno y apisonado de interiores**	Metros cuadrados	84,7	67.717	5.735.630		0	4.588.504	1.147.126	0	0	5.735.630
7	**72131601-006**	**Aislación - Aislación asfáltica horizontal de paredes**	Metros cuadrados	60,98	21.973	1.339.914		0	1.339.914		0	0	1.339.914
8	**72131601-005**	**Mampostería - Construcción de muro de elevación**	Unidad	1	-	-		0			0	0	-
8,1		De 0.15 de ladrillos huecos de 6 agujeros	Metros cuadrados	249,12	68.538	17.074.187		0		10.244.512	6.829.675	0	17.074.187
8,2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	11,8	28.447	335.675		0			335.675	0	335.675
9	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cubierta metálica de chapa trapezoidal n° 27 con perfilería metálica (perfil C de 75x40x15x2,55 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas) con aislación termoacústica de 10mm aluminizada una cara sobre malla de alambre n°16**	Metros cuadrados	314,65	259.533	81.662.058		0	0		81.662.058	0	81.662.058
10	**72101601-002**	**Montaje / Desmontaje de cielorraso - Colocación de cielorraso de madera de pino machiembrado adosado a superficie de cubierta**	Metros cuadrados	303,54	82.875	25.155.878		0			0	25.155.878	25.155.878
11	**72131601-008**	**Revoque**	Unidad	1	-	-		0			0	0	-
11,1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	154,13	45.050	6.943.557		0			3.471.778	3.471.778	6.943.557
11,2		De pilares 0.20 x 0.20 ml	Metros cuadrados	40,8	47.883	1.953.626		0			976.813	976.813	1.953.626
11,3		De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	73,17	51.567	3.773.157		0			1.886.579	1.886.579	3.773.157
12	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	Unidad	1	-	-		0			0	0	-
12,1		de H° de cascotes	Metros cuadrados	233,76	38.335	8.961.190		0	8.961.190			0	8.961.190
12,2		Carpeta de regularización	Metros cuadrados	233,76	35.077	8.199.600		0	8.199.600			0	8.199.600

"Metalúrgica NUÑEZ"
de: Rubén Darío Nuñez
R.U.C.: 2172215 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapúa - Py.

Fiscalización de Obras
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernación de Itapúa

13	**72131601-009**	**Colocación de Pisos - Contrapisos - Piso tipo Cerámico PEI4 alto tránsito**	Metros cuadrados	233,76	83.272	19.465.663		0			9.732.831	9.732.831	19.465.663
14	**72131601-009**	**Zócalo tipo Cerámico**	Metro lineal	32	24.083	770.656		0			770.656		770.656
15	**72131601-010**	**Aberturas**	Unidad	1	-	-		0			0	0	-
15,1		Puerta metálica de 1.55 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.385.500	1.385.500		0			0	1.385.500	1.385.500
15,2		Puerta mettálica de 0.70 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	3	923.667	2.771.001		0			0	2.771.001	2.771.001
15,3		Ventanas de vidrio de seguridad templado con marcos metálicos	Metros cuadrados	6,75	442.000	2.983.500		0			0	2.983.500	2.983.500
16	**72131601-012**	**Servicio de Pinturas**	Unidad	1	-	-		0			0	0	-
16,1		De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	194,93	39.525	7.704.608		0			0	7.704.608	7.704.608
16,2		De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	73,17	33.150	2.425.586		0			0	2.425.586	2.425.586
16,3		Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	1	34.085	34.085		0			0	34.085	34.085
16,3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	344,11	24.877	8.560.424		0			0	8.560.424	8.560.424
16,4		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	66	32.583	2.150.478		0			0	2.150.478	2.150.478
17	**72101510-005**	**Construcción de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.**	Metro lineal	66	97.693	6.447.738		0			0	6.447.738	6.447.738
18	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	Unidad de Medida Global	1	15.410.500	15.410.500		0			7.705.250	7.705.250	15.410.500
19	**72131601-011**	**Instalación sanitarias - Construcción e instalación sanitaria, y quincho**	Unidad de Medida Global	2	12.721.667	25.443.334		0		25.443.334		0	25.443.334
20	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	Unidad de Medida Global	1	1.851.583	1.851.583		0			0	1.851.583	1.851.583
						350.135.856		0	0		0	0	0
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO							0	**26.833.876**	**36.057.128**	**43.085.442**	**157.449.528**	**86.709.882**	**350.135.856**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO							0%	7,66%	10,30%	12,31%	44,97%	24,76%	**100,00%**
EJECUTADO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO							0	45.682.076	0	0	0	0	**45.682.076**
EJECUTADO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO							0%	13,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**13,05%**

Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Dario Nuñez
R.U.C.: 2172215 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapúa - Py

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1 - I. D. N° 416.272.-

Contrato N°: 24/2022	
Monto del Contrato: 350.135.856 gs.	**Term. Prevista:** 14/marzo/2023
Plazo Contractual: 120 dias	**Ampliaciones:**
Inicio de Obra: 14/noviembre/2022	**Mes:** noviembre

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 38/2021

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NOVIEMBRE	26.833.876	26.833.876	45.682.076	45.682.076	7,66%	7,66%	13,05%	13,05%
DICIEMBRE	36.057.128	62.891.004	0	45.682.076	10,30%	17,96%	0,00%	13,05%
ENERO	43.085.442	105.976.446	0	45.682.076	12,31%	30,27%	0,00%	13,05%
FEBRERO	157.449.528	263.425.974	0	45.682.076	44,97%	75,24%	0,00%	13,05%
MARZO	86.709.882	350.135.856	0	45.682.076	24,76%	100,00%	0,00%	13,05%

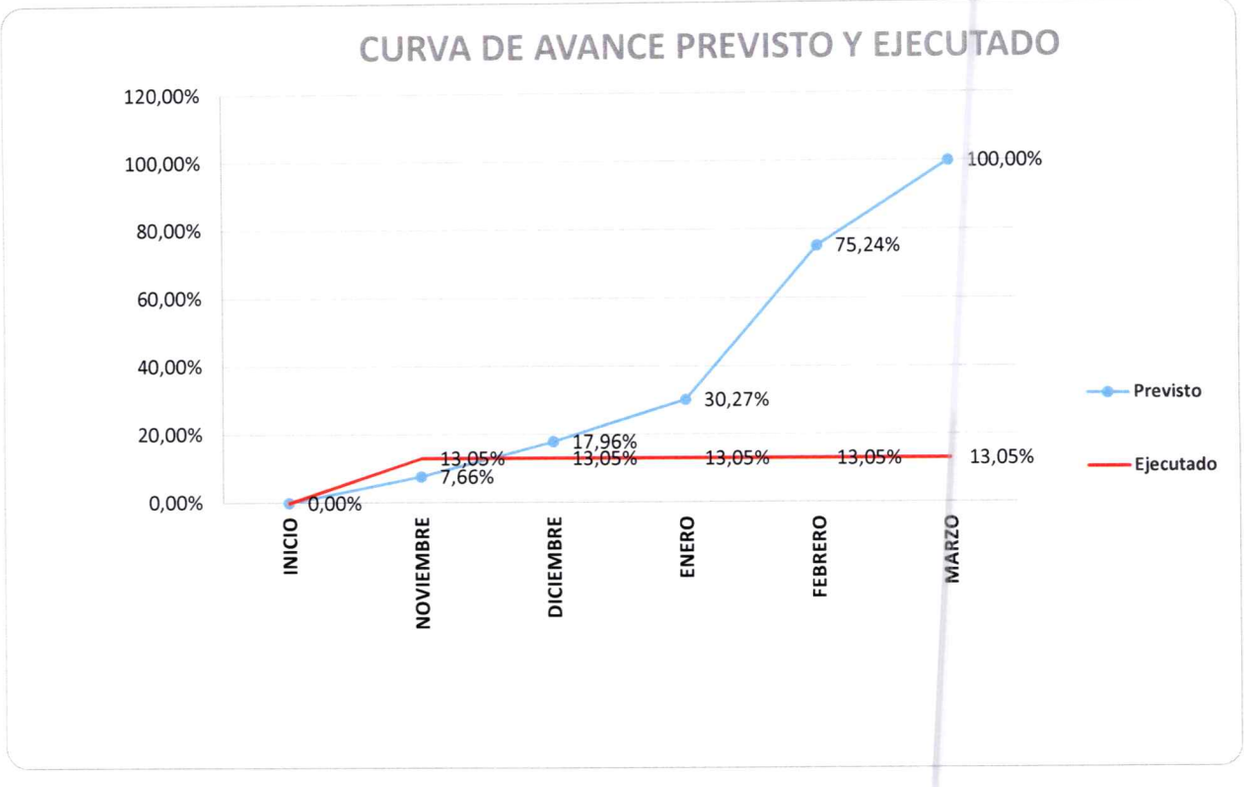

.....

Metalúrgica Núñez
CONTRATISTA

Metalúrgica "Nu...
de: Rubén Dario Nuñez
R.U.C.: 2172215 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.c...
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapú...

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalizacion de Obras

.....

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa
