Municipalidad de Minga Guazú
Departamento de Obras

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero - km 16 Minga Guazú
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: (0644) 20334

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 01

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado - Km 20 Monday / Camino al Vertedero - CONTRATO N.º 32/23 - ID N.º 422.716

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CERTIFICADO ACTUAL		
						CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
	Lote N.° 05 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado - Km 20 Monday / Camino al Vertedero							
1	Cartel de Obra: (2,00 x 1,80 mts)	m2	3,60	495.000	1.782.000	3,60	100%	1.782.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.577,50	2.400	3.786.000	1.577,50	100%	3.786.000
4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.577,50	3.160	4.984.900	1.577,50	100%	4.984.900
5	Pavimento tipo empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	189,30	26.000	4.921.800	189,30	100%	4.921.800
6	Pavimento tipo empedrado - Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.577,50	36.500	57.578.750	1.577,50	100%	57.578.750
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 m/m²)	m2	1.577,50	3.800	5.994.500	1.577,50	100%	5.994.500
8	Cordón prefabricado de Ho. 10x 50 X 30 [cm] c/ protección lateral	ml	355,00	39.000	13.845.000	355,00	100%	13.845.000
9	Cordón Cuneta	ml	45,00	109.000	4.905.000	45,00	100%	4.905.000
10	Compactación preliminar	m2	1.577,50	2.950	4.653.625	1.577,50	100%	4.653.625
11	Compactación Final	m2	1.577,50	3.100	4.890.250	1.577,50	100%	4.890.250
12	Limpieza final de obra	m2	1.577,50	1.500	2.366.250	1.577,50	100%	2.366.250
	Monto Total Lote N.° 5				109.708.075			
	TOTAL SEGÚN CONTRATO				**109.708.075**	**TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**109.708.075**

Monto de Certificado	109.708.075
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	5.485.404
Total a pagar por Certificado	104.222.671

Arq. Diego Franco Vargas
Constructora 2 Hermanos
Contratista

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2026

Arq. Miguel Caceres
Director de Obras

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 32 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. DIEGO GULLERMO FRANCO – CONSTRUCTORA DOS HERMANOS -RUC: 4013685-0

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 32 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 05 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 20 Monday-Camino al Vertedero "** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. DIEGO GULLERMO FRANCO – CONSTRUCTORA DOS HERMANOS -RUC: 4013685-0 .**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS

De: Diego Guillermo Franco Vargas

Construcción de edificios - Construcción de proyectos de servicios públicos
Actividades de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones
Fabricación de productos metálicos para uso estructural - Instalación de calefacción y aire acondicionado
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles

Km. 9 Acaray A 400 Metros De La Ruta Internacional N°7
Tel.:(0986) 301 007 - Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay

FACTURA

Número de Timbrado: 16653929
Fecha Inicio Vigencia: 05/09/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2024

RUC: 4013685 - 0

001-002- 0000879

Fecha de Emisión: 12/ Setiembre /2023 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: Municipalidad Minga Guazu R.U.C. C/I.: 80010478-1

Dirección: Nota de Remisión Nº: Tel.:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Pago por 1er Certificado Construcción de Pavimento Tipo Empedrado para el distrito de Minga Guazu ID Nº 422716 Lote Nº 5 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Km 20 Monday/Camino al Verdeco Segun Contrato 32/2023	104.222.672			104.222.672
SUB - TOTALES					

TOTAL A PAGAR Gs ☑ U$ ☐ (En letras): Ciento cuatro millones doscientos veinte y dos mil, seiscientos setenta y dos — 104.222.672

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 9.474.788 TOTAL IVA: 9.474.788

Gráfica Caracol DE FELICIANO LÓPEZ ROMERO - Av. Cruz del Chaco c/ Arturo Garcete (al Costado de la Terminal) Barrio Obrero
R.U.C.: 2620787- 7 - Nº HAB. 1457 - Tel.: (061) 509387 | 01 Tls. 50x3 - 876 al 925 | Septiembre / 2023

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tribut.
TRIPLICADO: No valido c/ Comp. Fiscal

Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 40136850 DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS

Teléfono/s : (0986)301007 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** diegofrancosoy@hotmail.com

Dirección : CALLE, KM. 9 ACARAY A 400 METROS DE LA RUTA INTERNACIONAL N?7 //CASA - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 013191

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 11/11/2023

Otorgado en Asunción, el 11/07/2017

Renovado el 21/09/2021

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

40136850

12122022 1351 40136850 40136850

013191

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS

RUC

4013685-0

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 422716 / LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

Monto del contrato

485.080.828

Año: 2023 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BERNARDA	GAONA DE SOSA	Cumplio	2550307	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 6678965-1143

Fecha Impresión: 13/10/2023

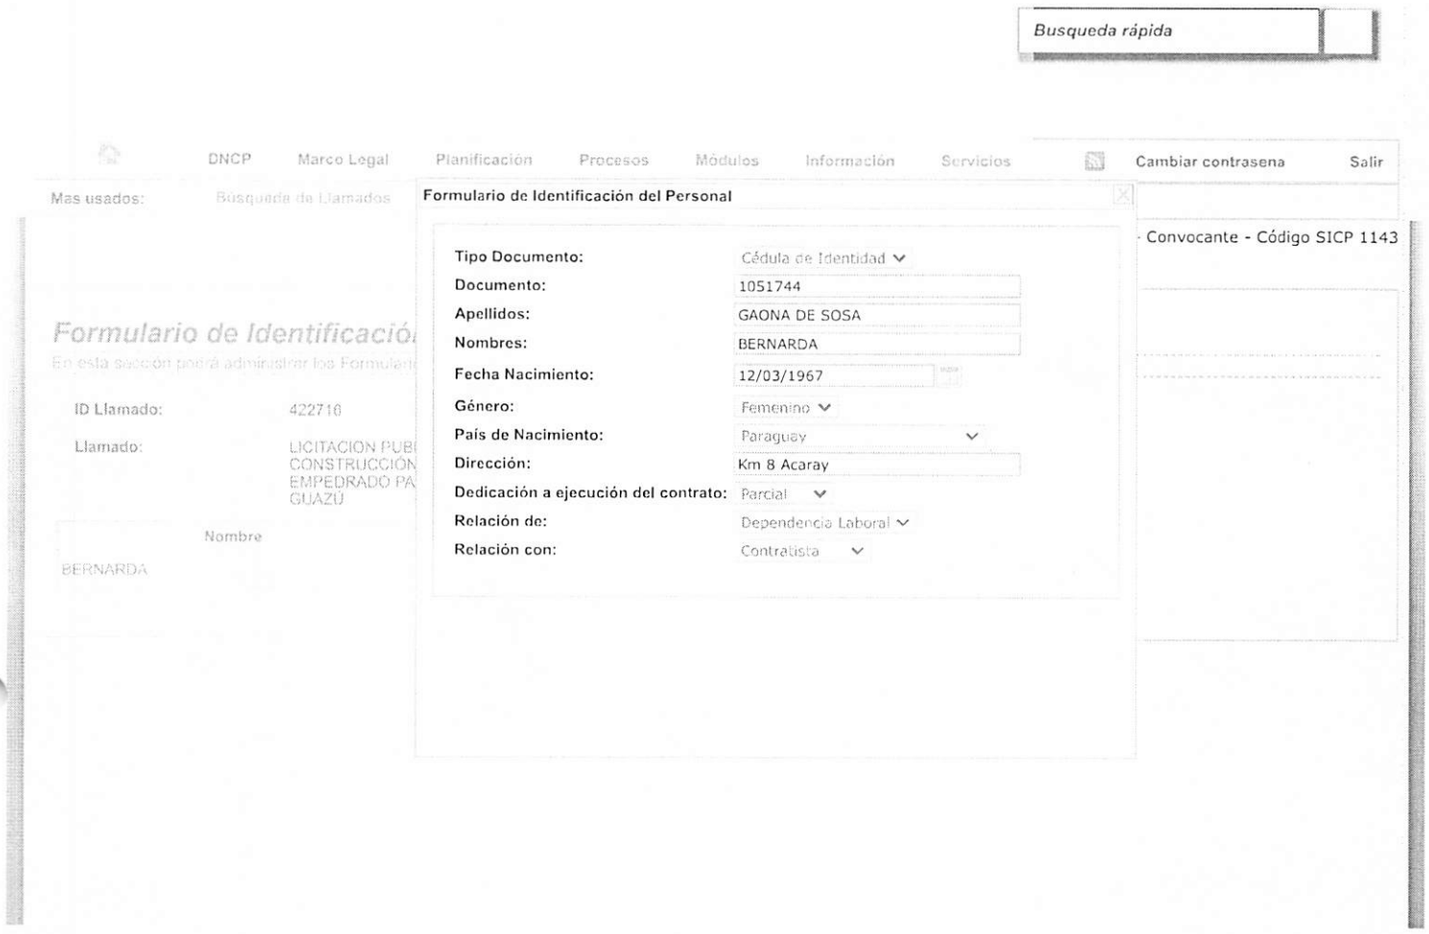
Busqueda rápida
DNCP
Marco Legal
Planificación
Procesos
Módulos
Información
Servicios
Cambiar contrasena
Salir
Mas usados:
Búsqueda de Llamados
Formulario de Identificación del Personal
Tipo Documento:
Cédula de Identidad
Documento:
1051744
Apellidos:
GAONA DE SOSA
Nombres:
BERNARDA
Fecha Nacimiento:
12/03/1967
Género:
Femenino
País de Nacimiento:
Paraguay
Dirección:
Km 8 Acaray
Dedicación a ejecución del contrato:
Parcial
Relación de:
Dependencia Laboral
Relación con:
Contratista
Convocante - Código SICP 1143
Formulario de Identificació
ID Llamado:
422716
Llamado:
LICITACION PUB
CONSTRUCCIÓN
EMPEDRADO PA
GUAZÚ
Nombre
BERNARDA

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ
AVANCEMOS
OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
TIPO EMPEDRADO
LOTE 5
Km 20 Monday / Camino al vertedero
CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA
2 HERMANOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
ROYALTIES
COSTO DE OBRA:
Gs. 109.708.075
ORDEN DE INICIO
16 DE AGOSTO 2023
PLAZO DE ENTREGA:
16 DE OCTUBRE 2023
ADMINISTRACIÓN
DIEGORIOS
MINGA GUAZÚ

MINGA GUAZÚ
AVANCEMOS
OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMI
TIPO EMPEDRADO
LOTE 5
Km 20 Monday / Camino al vertec
CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA
2 HERMANOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
ROYALTIES
DIEGORIOS

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
TIPO EMPEDRADO
LOTE 5
CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA
2 HERMANOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REGALÍAS
COSTO DE OBRA:
ORDEN DE INICIO:
PLAZO DE ENTREGA:
DEGOIROS

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 1

CONTRATO DE OBRAS Nº:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE 5
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 20 MONDAY - CAMINO ALVERTEDERO

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 16/08/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

A los efectos de realizar un control de la obra se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del Contratista cuyas páginas serán Enumeradas y cada una de ellas Firmadas por el Fiscal designado por la Municipalidad.
En dicho libro de obra se dejara constancia del control de todas los trabajos desde preparación de la obra hasta la recepción definitiva.
Por lo tanto en el día de la fecha nos constatamos en el lugar de la obra correspondiente al contrato N° 32/2023, adjudicado a la empresa constructora Dos Hermanos.
Así habiendo realizado la apertura del libro de obra, se ha iniciado los trabajos de preparación de la obra.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021 - 2026

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista
CONSTRUCTORA 2 HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 2

CONTRATO DE OBRAS Nº:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE 5
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 20 MONDAY - CAMINO ALVERTEDERO

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 16/08/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

- Colocación del Cartel de Obra, 2 x 1,80
- Trabajos de replanteo, levantamiento plani-altimetrico y marcación
- Preparación de suelo con motoniveladora.

* Fecha: 17/08/2023
- Preparación de suelo con motoniveladora
- Acopio de materiales

* Fecha: 18/08/2023
- Se realizo trabajos de preparación de tierra colorado para Colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, Colocación de cordón de H° y cargamento de cordón cuneta.
- Fiscal de obra verifica los trabajos realizados y Captura varias Fotografias

* Fecha: 19/08/2023
- Preparación de tierra colorado para colocación de cordón de H°, preparación para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista
CONSTRUCTORA 2 HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 3

CONTRATO DE OBRAS Nº:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE 5
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 20 MONDAY - CAMINO ALVERTEDERO

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 21/08/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 22/08/2023
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 23/08/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 24/08/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado

* Fecha: 25/08/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
- Fiscal de obra verifica los trabajos y captura varias fotografías.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista
CONSTRUCTORA 2 HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 4

CONTRATO DE OBRAS Nº:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE 5
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 20 MONDAY - CAMINO ALVERTEDERO

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 28/08/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

- Preparación de tierra Colorada para colocación de Cordón de H°, preparación de tierra Colorada para colchón, colocación de Cordón de H° y Colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 29/08/2023
- Preparación de tierra Colorada para colocación de Cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y Colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 30/08/2023
- Preparación de tierra Colorada para colchón, Colocación de cordón de H° y Colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 31/08/2023
- Preparación de tierra Colorada para colchón, colocación de Cordón de H° y Colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 01/09/2023
- Preparación de tierra Colorada para colchón, Colocación de cordón de H° y Colocación de piedra a mano y martillo
- Fiscal de obra verifica los trabajos realizados y captura varias fotografías

* Fecha: 02/09/2023
- Preparación de tierra Colorada para colchón, Colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para llenar los espacios entres piedras.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista
CONSTRUCTORA 2 HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 5

CONTRATO DE OBRAS Nº:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE 5
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 20 MONDAY - CAMINO ALVERTEDERO

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 04/09/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorado para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 05/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorado para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 06/09/2023
- Preparación de tierra colorado para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado.

* Fecha: 07/09/2023
- Preparación de tierra colorado para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado.

* Fecha: 08/09/2023
- Se realizo trabajos de compactación preliminar y Final
- Trabajos de enripiado con triturado 6
- Trabajo de limpieza y retiro de desechos
- Fiscal de obra verifica la conclusión de la obra y captura varias Fotografías
- Se realizo trabajos de medición para la certificación.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista
CONSTRUCTORA 2 HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante
