INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz N° 1210 - B° Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 09/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

Trabajos ejecutados son:

LOTE 4 – CAPITAN BADO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE PUBLICA CAPITAN GENES RCA. DE CHILE

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad Total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	3623	1848	51%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	3623	1848	51%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	725	312	43%
5	Movimiento de suelo	M3	272	139	51%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	145	74	51%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	3623	1190	33%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	3623	1025	28%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	672	343	51%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	181	77	43%
11	Limpieza final	M2	3623	0	0%
				TOTAL	46%

LOTE 8 – KARAPA'I – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE 20 DE JULIO

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad Total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	2400	1920	80%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2400	1920	80%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	480	384	80%
5	Movimiento de suelo	M3	180	144	80%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	96	77	80%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2400	1440	60%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	2400	864	36%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	600	408	68%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	120	82	68%
11	Limpieza final	M2	2400	0	0%
				TOTAL	67%

Es mi informe,

Fecha: 11/09/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 09/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

Trabajos ejecutados son:

LOTE 4 – CAPITAN BADO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE PUBLICA CAPITAN GENES RCA. DE CHILE				
N°	**Descripción**	**Cantidad Total**	**Avance M2**	**Avance%**
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	3623	3623	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	3623	3623	100%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	725	612	84%
5	Movimiento de suelo	272	272	100%
6	Relleno y compactación de terreno	145	145	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	3623	2334	64%
8	Compactación y apisonado mecánico	3623	2010	55%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	672	672	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	181	151	84%
11	Limpieza final	3623	0	0%
			TOTAL	**81%**

LOTE 8 – KARAPA'I – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE 20 DE JULIO				
N°	**Descripción**	**Cantidad Total**	**Avance M2**	**Avance%**
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	2400	2400	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	2400	2400	100%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	480	480	100%
5	Movimiento de suelo	180	180	100%
6	Relleno y compactación de terreno	96	96	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	2400	1800	75%
8	Compactación y apisonado mecánico	2400	1080	45%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	600	510	85%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	120	102	85%
11	Limpieza final	2400	0	0%
			TOTAL	**81%**

Es mi informe,

Fecha: 26/09/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 8 – KARAPA'I – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE 20 DE JULIO

LOTE 4 – CAPITAN BADO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE PUBLICA CAPITAN GENES RCA. DE CHILE

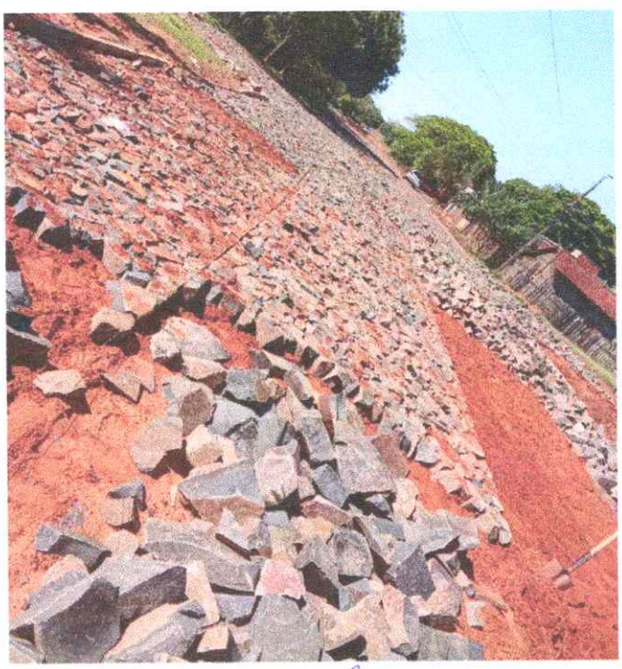

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 08/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: HR INGENIERIA

Trabajos ejecutados son:

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA ALBERTINA VILLA JARA ESQ. CAVUREI

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	244	0	0%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	0	0%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	244	0	0%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	49	0	0%
5	Movimiento de suelo	M3	18	0	0%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	10	0	0%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	244	0	0%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	244	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	64	0	0%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	12	0	0%
11	Limpieza final	M2	244	0	0%
				TOTAL	0%

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA RIO YPANE

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	1060	1060	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	1060	1060	100%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	212	212	100%
5	Movimiento de suelo	M3	80	80	100%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	42	42	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	1060	1060	100%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	1060	1060	100%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	246	246	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	53	53	100%
11	Limpieza final	M2	1060	1060	100%
				TOTAL	100%

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EDITH ELFRIDA WINKLER

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	4007	1082	27%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	4007	1082	27%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	801	216	27%
5	Movimiento de suelo	M3	301	81	27%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	160	43	27%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	4007	1082	27%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	4007	1082	27%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	934	252	27%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	200	54	27%
11	Limpieza final	M2	4007	0	0%
				TOTAL	31%

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA APOLONIO GIMENEZ

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	3339	0	0%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	0	0%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	3339	0	0%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	668	0	0%
5	Movimiento de suelo	M3	250	0	0%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	134	0	0%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	3339	0	0%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	3339	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	825	0	0%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	167	0	0%
11	Limpieza final	M2	3339	0	0%
				TOTAL	0%

LOTE 2 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA SIN NOMBRE VILLA SAN PEDRO

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	*MarcaciÃ³n y Replanteo*	M2	5697	5697	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	5697	3988	65%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	1139	797	65%
5	Movimiento de suelo	M3	427	299	65%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	228	160	65%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	5697	3988	65%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	5697	3988	65%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1362	953	65%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	285	200	65%
11	Limpieza final	M2	5697	0	0%
				TOTAL	65%

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 2 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA DR. RONALD ROLON MORINIGO

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	2521	0	0%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	0	0%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2521	0	0%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	504	0	0%
5	Movimiento de suelo	M3	189	0	0%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	101	0	0%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2521	0	0%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	2521	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	614	0	0%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	126	0	0%
11	Limpieza final	M2	2521	0	0%
				TOTAL	0%

LOTE 2 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA FILOMENO RODRIGUEZ

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	1315	0	0%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	0	0%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	1315	0	0%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	263	0	0%
5	Movimiento de suelo	M3	99	0	0%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	53	0	0%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	1315	0	0%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	1315	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	364	0	0%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	66	0	0%
11	Limpieza final	M2	1315	0	0%
				TOTAL	0%

LOTE 3 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA SIN NOMBRE ASENTAMIENTO ROMERO KUE

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	2735	0	0%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	0	0%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2735	0	0%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	547	0	0%
5	Movimiento de suelo	M3	205	0	0%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	109	0	0%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2735	0	0%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	2735	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1004	0	0%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	137	0	0%
11	Limpieza final	M2	2735	0	0%
				TOTAL	0%

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 3 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA PAULO WINKLER

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	2525	2525	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2525	2525	100%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	505	505	100%
5	Movimiento de suelo	M3	189	189	100%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	101	101	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2525	2525	100%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	2525	2525	100%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	615	615	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	126	126	100%
11	Limpieza final	M2	2525	2525	100%
				TOTAL	100%

Es mi informe,

Fecha: 04/09/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA RIO YPANE

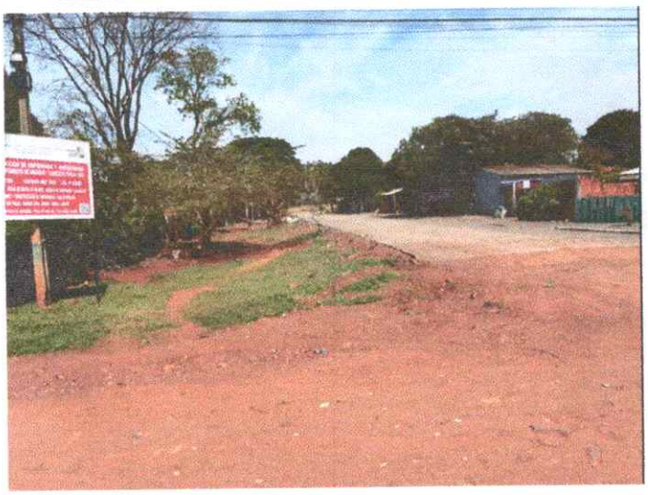

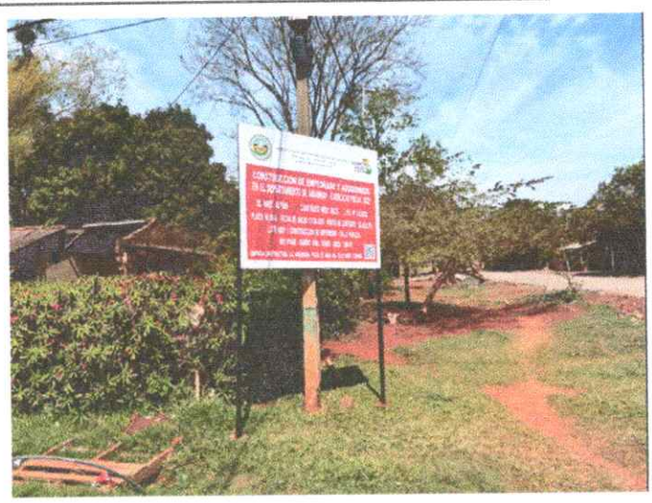

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EDITH ELFRIDA WINKLER

LOTE 2 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA SIN NOMBRE VILLA SAN PEDRO

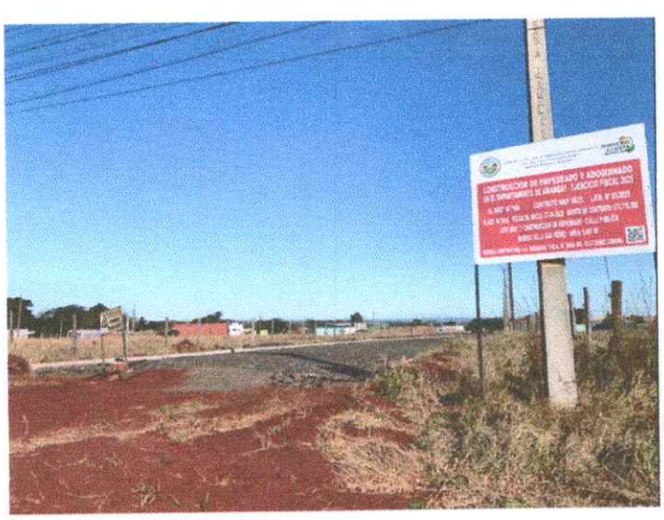

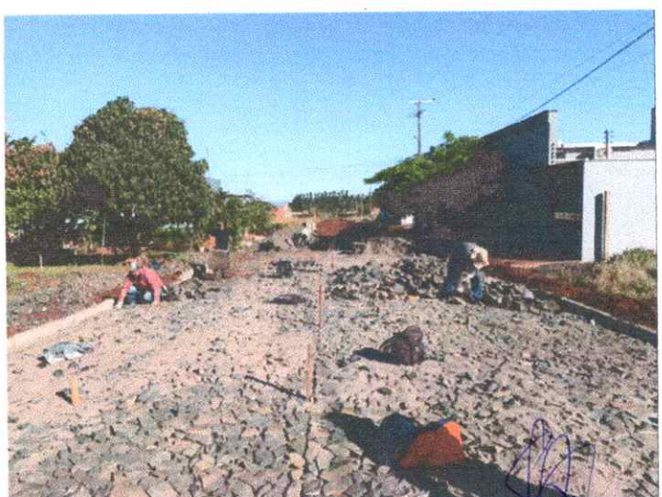

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 3 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA PAULO WINKLER

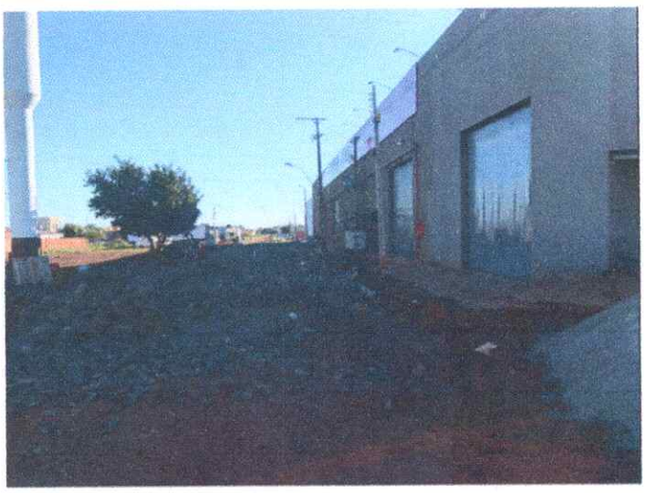

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 08/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: HR INGENIERIA

Trabajos ejecutados son:

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA ALBERTINA VILLA JARA ESQ. CAVUREI

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	244	181	74%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	244	181	74%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	49	36	74%
5	Movimiento de suelo	M3	18	13	74%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	10	7	74%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	244	181	74%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	244	181	74%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	64	47	74%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	12	9	74%
11	Limpieza final	M2	244	0	0%
				TOTAL	100%

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA RIO YPANE

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	1060	1060	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	1060	1060	100%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	212	212	100%
5	Movimiento de suelo	M3	80	80	100%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	42	42	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	1060	1060	100%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	1060	1060	100%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	246	246	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	53	53	100%
11	Limpieza final	M2	1060	1060	100%
				TOTAL	100%

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EDITH ELFRIDA WINKLER

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	4007	2925	73%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	4007	2925	73%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	801	585	73%
5	Movimiento de suelo	M3	301	220	73%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	160	117	73%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	4007	2925	73%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	4007	2925	73%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	934	682	73%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	200	146	73%
11	Limpieza final	M2	4007	0	0%
				TOTAL	69%

LOTE 1 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA APOLONIO GIMENEZ

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	3339	0	0%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	0	0%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	3339	0	0%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	668	0	0%
5	Movimiento de suelo	M3	250	0	0%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	134	0	0%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	3339	0	0%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	3339	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	825	0	0%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	167	0	0%
11	Limpieza final	M2	3339	0	0%
				TOTAL	0%

LOTE 2 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA SIN NOMBRE VILLA SAN PEDRO

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	5697	4899	86%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	5697	4899	86%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	1139	980	86%
5	Movimiento de suelo	M3	427	367	86%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	228	196	86%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	5697	4899	86%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	5697	4899	86%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1362	1171	86%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	285	245	86%
11	Limpieza final	M2	5697	4899	0%
				TOTAL	79%

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 2 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA DR. RONALD ROLON MORINIGO

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	2521	821	33%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2521	821	33%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	504	164	33%
5	Movimiento de suelo	M3	189	62	33%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	101	33	33%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2521	821	33%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	2521	821	33%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	614	200	33%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	126	41	33%
11	Limpieza final	M2	2521	0	0%
				TOTAL	36%

LOTE 2 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA FILOMENO RODRIGUEZ

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	1315	383	29%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	1315	383	29%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	263	77	29%
5	Movimiento de suelo	M3	99	29	29%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	53	15	29%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	1315	383	29%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	1315	383	29%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	364	106	29%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	66	19	29%
11	Limpieza final	M2	1315	0	0%
				TOTAL	33%

LOTE 3 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA SIN NOMBRE ASENTAMIENTO ROMERO KUE

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	2735	0	0%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	0	0%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2735	0	0%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	547	0	0%
5	Movimiento de suelo	M3	205	0	0%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	109	0	0%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2735	0	0%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	2735	0	0%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1004	0	0%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	137	0	0%
11	Limpieza final	M2	2735	0	0%
				TOTAL	0%

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 3 – PEDRO JUAN CABALLERO – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA PAULO WINKLER

N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	2525	2525	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2525	2525	100%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	505	505	100%
5	Movimiento de suelo	M3	189	189	100%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	101	101	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2525	2525	100%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	2525	2525	100%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	615	615	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	126	126	100%
11	Limpieza final	M2	2525	2525	100%
				TOTAL	100%

Es mi informe,

Fecha: 19/09/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 10/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: TAPERA CONSTRUCCIONES

Trabajos ejecutados son:

LOTE 5 – BELLA VISTA – CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE PUBLICA GRAL. DIAZ					
N°	Descripción	**UNIDAD**	Cantidad total	Avance	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	816	816	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	816	816	100%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	163	163	100%
5	Movimiento de suelo	M3	61	61	100%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	33	33	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	816	816	100%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	816	816	100%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	215	215	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	41	41	100%
11	Limpieza final	M2	800	800	100%
				TOTAL	100%

LOTE 6 – ZANJA PYTA – EXCOMBATIENTE MAGGI REMBI					
N°	Descripción	**UNIDAD**	Cantidad total	Avance	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	6671	1500	22%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	6671	1500	22%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	1334	300	22%
5	Movimiento de suelo	M3	500	110	22%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	267	60	22%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	6671	1500	22%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	6671	1500	22%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	798	400	50%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	334	167	50%
11	Limpieza final	M2	6671	1500	22%
				TOTAL	34%

Es mi informe,

Fecha: 01/09/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 5 – BELLA VISTA – CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE PUBLICA GRAL. DIAZ

LOTE 6 – ZANJA PYTA – EXCOMBATIENTE MAGGI REMBI

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 10/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: TAPERA CONSTRUCCIONES

Trabajos ejecutados son:

LOTE 5 – BELLA VISTA – CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE PUBLICA GRAL. DIAZ					
N°	Descripción	**UNIDAD**	Cantidad total	Avance	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	816	816	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	816	816	100%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	163	163	100%
5	Movimiento de suelo	M3	61	61	100%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	33	33	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	816	816	100%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	816	816	100%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	215	215	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	41	41	100%
11	Limpieza final	M2	800	800	100%
				TOTAL	100%

LOTE 5 – BELLA VISTA – CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE PUBLICA BENJAMIN CONSTANT					
N°	Descripción	**UNIDAD**	Cantidad total	Avance	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	5790	926	16%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	16%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	5790	926	16%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	1158	185	16%
5	Movimiento de suelo	M3	434	69	16%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	232	37	16%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	5790	926	16%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	5790	926	16%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1390	222	16%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	290	46	16%
11	Limpieza final	M2	5790	926	16%
				TOTAL	16%

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 6 – ZANJA PYTA – EMPEDRADO EN CALLE EXCOMBATIENTE MAGGI REMBI					
N°	Descripción	**UNIDAD**	Cantidad total	Avance	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	6671	2668	40%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	6671	2668	40%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	1334	534	40%
5	Movimiento de suelo	M3	500	200	40%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	267	107	40%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	6671	2668	40%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	6671	2668	40%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	798	798	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	334	334	100%
11	Limpieza final	M2	6671	2668	40%
				TOTAL	56%

LOTE 6 – ZANJA PYTA – ADENDA EMPEDRADO EN CALLE EXCOMBATIENTE MAGGI REMBI					
N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	870	870	100%
				TOTAL	100%

Es mi informe,

Fecha: 15/09/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 10/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: TAPERA CONSTRUCCIONES

Trabajos ejecutados son:

LOTE 5 – BELLA VISTA – CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE PUBLICA GRAL. DIAZ					
N°	Descripción	**UNIDAD**	Cantidad total	Avance	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	816	816	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	816	816	100%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	163	163	100%
5	Movimiento de suelo	M3	61	61	100%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	33	33	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	816	816	100%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	816	816	100%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	215	215	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	41	41	100%
11	Limpieza final	M2	800	800	100%
				TOTAL	100%

LOTE 5 – BELLA VISTA – CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE PUBLICA BENJAMIN CONSTANT					
N°	Descripción	**UNIDAD**	Cantidad total	Avance	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	5790	1448	25%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	5790	1448	25%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	1158	290	25%
5	Movimiento de suelo	M3	434	109	25%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	232	58	25%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	5790	1448	25%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	5790	1448	25%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1390	348	25%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	290	73	25%
11	Limpieza final	M2	5790	1448	25%
				TOTAL	32%

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 6 – ZANJA PYTA – EMPEDRADO EN CALLE EXCOMBATIENTE MAGGI REMBI					
N°	Descripción	**UNIDAD**	Cantidad total	Avance	Avance%
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	6671	5804	87%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	6671	5804	87%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	1334	1161	87%
5	Movimiento de suelo	M3	500	435	87%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	267	232	87%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	6671	5804	87%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	6671	5804	87%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	798	798	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	334	334	100%
11	Limpieza final	M2	6671	5804	87%
				TOTAL	91%

LOTE 6 – ZANJA PYTA – ADENDA EMPEDRADO EN CALLE EXCOMBATIENTE MAGGI REMBI					
N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad total	Avance M2	Avance%
1	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	870	870	100%
				TOTAL	100%

Es mi informe,

Fecha: 30/09/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 5 – BELLA VISTA – CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE PUBLICA GRAL. DIAZ

LOTE 5 – BELLA VISTA – CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE PUBLICA BENJAMIN CONSTANT

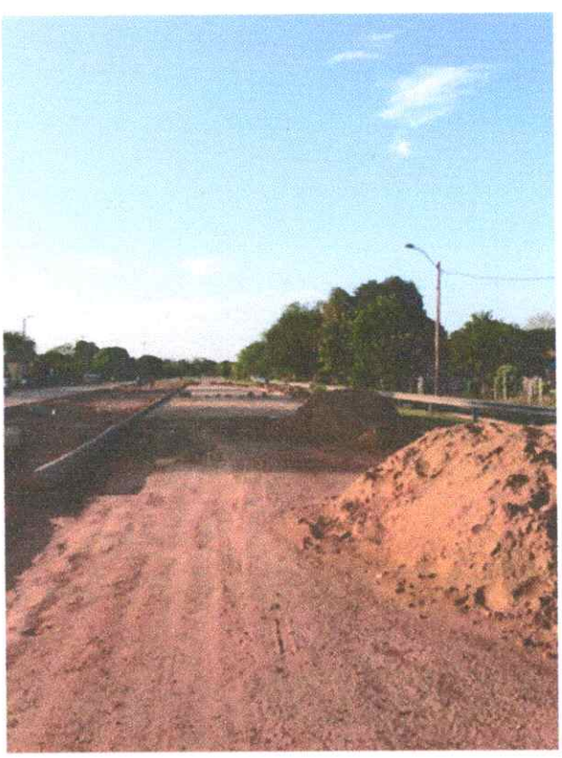

Ing. Civil Félix Gómez Corone:
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amamb:

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 6 – ZANJA PYTA – EMPEDRADO EN CALLE EXCOMBATIENTE MAGGI REMBI

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 11/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: TERRACOM

Trabajos ejecutados son:

LOTE 7 – CERRO CORA – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COLONIA SANTA CLARA					
N°	**Descripción**	**UNIDAD**	**Cantidad total**	**Avance M2**	**Avance%**
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	4800	1776	37%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	4800	1776	37%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	960	355	37%
5	Movimiento de suelo	M3	360	133	37%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	192	71	37%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	4800	1776	37%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	4800	1776	37%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1840	681	37%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	240	89	37%
11	Limpieza final	M2	4800	1776	37%
				TOTAL	**43%**

Es mi informe,

Fecha: 18/09/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY – L.P.N. N° 03/2025

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

Contrato N° 11/2025 – ID N° 467.986

Empresa Adjudicada: TERRACOM

Trabajos ejecutados son:

LOTE 7 – CERRO CORA – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COLONIA SANTA CLARA					
N°	**Descripción**	UNIDAD	**Cantidad total**	**Avance**	**Avance%**
1	MarcaciÃ³n y Replanteo	M2	4800	2688	56%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UNIDAD	1	1	100%
3	Preparación de Caja y Perfilado de Terreno	M2	4800	2688	56%
4	Colchón de Arena e=0,20cm	M3	960	538	56%
5	Movimiento de suelo	M3	360	202	56%
6	Relleno y compactación de terreno	M3	192	108	56%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	4800	2688	56%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	4800	2688	56%
9	Cordón de H°A° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1840	1030	56%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	240	134	56%
11	Limpieza final	M2	4800	2688	56%
				TOTAL	**60%**

Es mi informe,

Fecha: 03/10/2025

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE 7 – CERRO CORA – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COLONIA SANTA CLARA

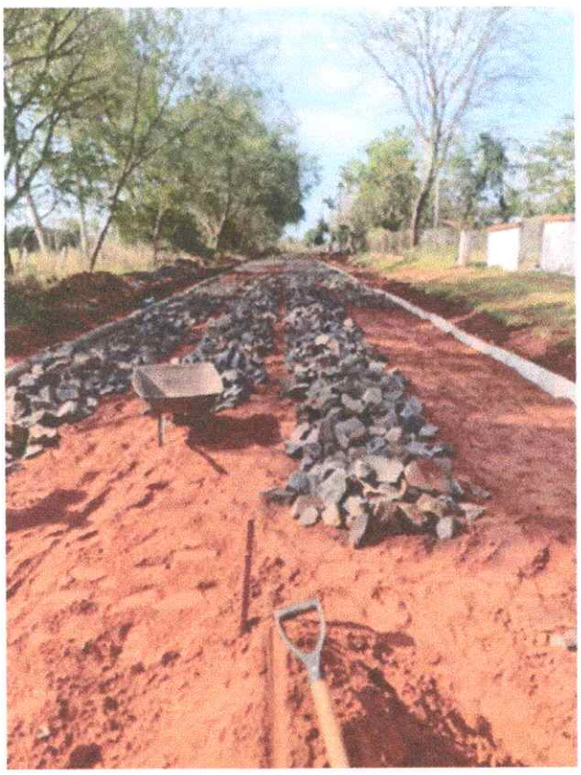

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay
