Resumen del Certificado Básico Nº 3

Mes: SEPTIEMBRE - OCTUBRE

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio Pradera Alta del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 387469

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones por Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio Pradera Alta del Distrito de Encarnación - Plurianual	100,00%	391.401.161	63,53%	248.649.714	23,01%	90.046.088	86,53%	338.695.802
	Total Contrato	**100,00%**	**391.401.161**	**63,53%**	**248.649.714**	**23,01%**	**90.046.088**	**86,53%**	**338.695.802**

B	Deducciones Totales por Contrato			Deducciones Certificado Anterior	Deducción Presente Certificado	Deducciones Total a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	78.280.232	49.729.943	18.009.218	67.739.160
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**78.280.232**	**49.729.943**	**18.009.218**	**67.739.160**
C.I	Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				*72.036.870*	
C.II	Multas				*0*	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				*72.036.870*	

SON GUARANIES: ***Setenta y dos millones treinta y seis mil ochocientos setenta***

Certificado Basico Nº 3

Mes: SEPTIEMBRE - OCTUBRE

Contrato Nº : 54/20

Monto Básico: 391.401.161

Contratista: HABITARE S.R.L

Fecha de Inicio: 24-may-21

Plazo de Ejecución (Dias): 180,00

Fecha de Terminación: 20-nov-21

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretario Departamental

Ing. Jose Luis Gonzalez
Director Departamental de Obras Públicas
GOBERNACION DE ITAPUA

GOBERNACION DE ITAPUA
Fiscal de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Contratista
Representante Legal

00000002

(dos)

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIF. BASICO N°	3
PLANILLA I	
Plazo de Ejecución: (Días)	180,00
Mes: SEPTIEMBRE - OCTUBRE	

Monto Básico: 391.401.161

PLANILLA DE MEDICIÓN PORCENTUAL

Contrato N° : 54/20

Contratista: HABITARE S.R.L

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio Pradera Alta del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 387469

Ítem	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Incidencia	OBRA EJECUTADA EN PORCENTAJE			OBRA EJECUTADA EN INCIDENCIA		
							Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
1	Preparacion de obra- Trabajos preliminares											
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES: Movilización, cartel de obra, carteles de señalizalición y servicios complementarios	Unidad Medida Global	1	4.275.700	4.275.700	0,0109	100,00%	0,00%	100,00%	0,0109	0,0000	0,0109
1.2	TRABAJOS PRELIMINARES:Relevamiento topográfico	Unidad Medida Global	1	5.549.302	5.549.302	0,0142	100,00%	0,00%	100,00%	0,0142	0,0000	0,0142
1.3	MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen)	Metros cuadrados	5.346,4	5.241	28.018.955	0,0716	90,00%	10,00%	100,00%	0,0644	0,0072	0,0716
1.4	MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas	Metros cuadrados	1.304	1.126	1.468.108	0,0038	0,00%	50,00%	50,00%	0,0000	0,0019	0,0019
1.5	Demolición de baden existente	Metros cuadrados	20	16.301	326.025	0,0008	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0008	0,0008
1.6	PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	4.564	28.315	129.229.280	0,3302	64,42%	25,15%	89,57%	0,2127	0,0830	0,2957
1.7	PAVIMENTO:Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	4.564	1.543	7.043.621	0,0180	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
1.8	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA :Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	94,05	1.048.544	98.615.605	0,2520	58,62%	32,29%	90,91%	0,1477	0,0814	0,2291
1.9	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón prefabricado 30x15cm	Metros cúbicos	3,78	1.048.544	3.963.498	0,0101	50,00%	16,67%	66,67%	0,0051	0,0017	0,0068
1.10	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	50,4	2.178.204	109.781.456	0,2805	64,29%	19,29%	83,57%	0,1803	0,0541	0,2344
1.11	Lmipieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	3.129.610	3.129.610	0,0080	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL					391.401.161					63,53%	23,01%	86,54%

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Contratista
Alejandro Paniagua González
Representante Legal

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DE ITAPUA
Fiscal de Obras
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

00000004

4(cuano)

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIF. BASICO Nº	3
PLANILLA I	
Plazo de Ejecución: (Días)	180,00
Mes: SEPTIEMBRE - OCTUBRE	
Contratista: HABITARE S.R.L	

Monto Básico: 391.401.161

PLANILLA DE CERTIFICADO

Contrato Nº : 54/20

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de HºAº en el Barrio Pradera Alta del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 387469

Ítem	Rubros	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	OBRA EJECUTADA EN CANTIDADES			OBRA EJECUTADA EN MONTO		
						Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
1	Construcción de empedrado										
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES: Movilización, cartel de obra, carteles de señalizalición y servicios complementarios	Unidad Medida Global	1	4.275.700	4.275.700	1,00		1,00	4.275.700	0	4.275.700
1.2	TRABAJOS PRELIMINARES:Relevamiento topográfico	Unidad Medida Global	1	5.549.302	5.549.302	1,00		1,00	5.549.302	0	5.549.302
1.3	MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen)	Metros cuadrados	5.346,4	5.241	28.018.955	4.811,76	534,64	5.346,40	25.217.059	2.801.895	28.018.955
1.4	MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas	Metros cuadrados	1.304	1.126	1.468.108	0,00	652,00	652,00	0	734.054	734.054
1.5	Demolición de baden existente	Metros cuadrados	20	16.301	326.025	0,00	20,00	20,00	0	326.025	326.025
1.6	PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	4.564	28.315	129.229.280	2.940,00	1.148,00	4.088,00	83.245.855	32.505.524	115.751.379
1.7	PAVIMENTO:Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	4.564	1.543	7.043.621	0,00		0,00	0	0	0
1.8	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA :Cordón cuneta de hormigón (Hº elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	94,05	1.048.544	98.615.605	55,13	30,37	85,50	57.806.255	31.845.868	89.652.123
1.9	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón prefabricado 30x15cm	Metros cúbicos	3,78	1.048.544	3.963.498	1,89	0,63	2,52	1.981.749	660.583	2.642.332
1.10	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén de HºAº, (Hº elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	50,4	2.178.204	109.781.456	32,40	9,72	42,12	70.573.793	21.172.138	91.745.931
1.11	Lmipieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	3.129.610	3.129.610	0,00		0,00	0	0	0
TOTAL					391.401.161				248.649.714	90.046.088	338.695.802

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Contratista
Alejandro Paniagua González
Representante Legal

GOBERNACION DE ITAPUA
Fiscal de Obras
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

00000005

5(cinco)

6(seis)

00000006

Certificado Basico Nº 3

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de HºAº en el Barrio Pradera Alta del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 387469

Monto del Contrato Gs.:		391.401.161				Term. Prevista:	20-nov-21
Plazo Contractual:		180,00	(Días Calendario)			Ampliaciones:	0 días
Inicio de Obra:		24-may-21				Mes: SEPTIEMBRE - OCTUBRE	

CUADRO DE AVANCE

Contrato Nº : 54/20

MES	PREVISTO Gs		EJECUTADO Gs		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Junio 2021	48.835.921	48.835.921	130.682.470	130.682.470	12,48%	12,48%	33,39%	33,39%
Julio 2021	38.066.382	86.902.304	53.085.260	183.767.730	9,73%	22,20%	13,56%	46,95%
Agosto 2021	71.056.976	157.959.280	64.881.984	248.649.714	18,15%	40,36%	16,58%	63,53%
Septiembre 2021	103.687.501	261.646.781	38.719.818	287.369.532	26,49%	66,85%	9,89%	73,42%
Octubre 2021	91.682.983	353.329.764	51.326.270	338.695.802	23,42%	90,27%	13,11%	86,54%
Noviembre 2021	38.071.396	391.401.161			9,73%	100,00%		

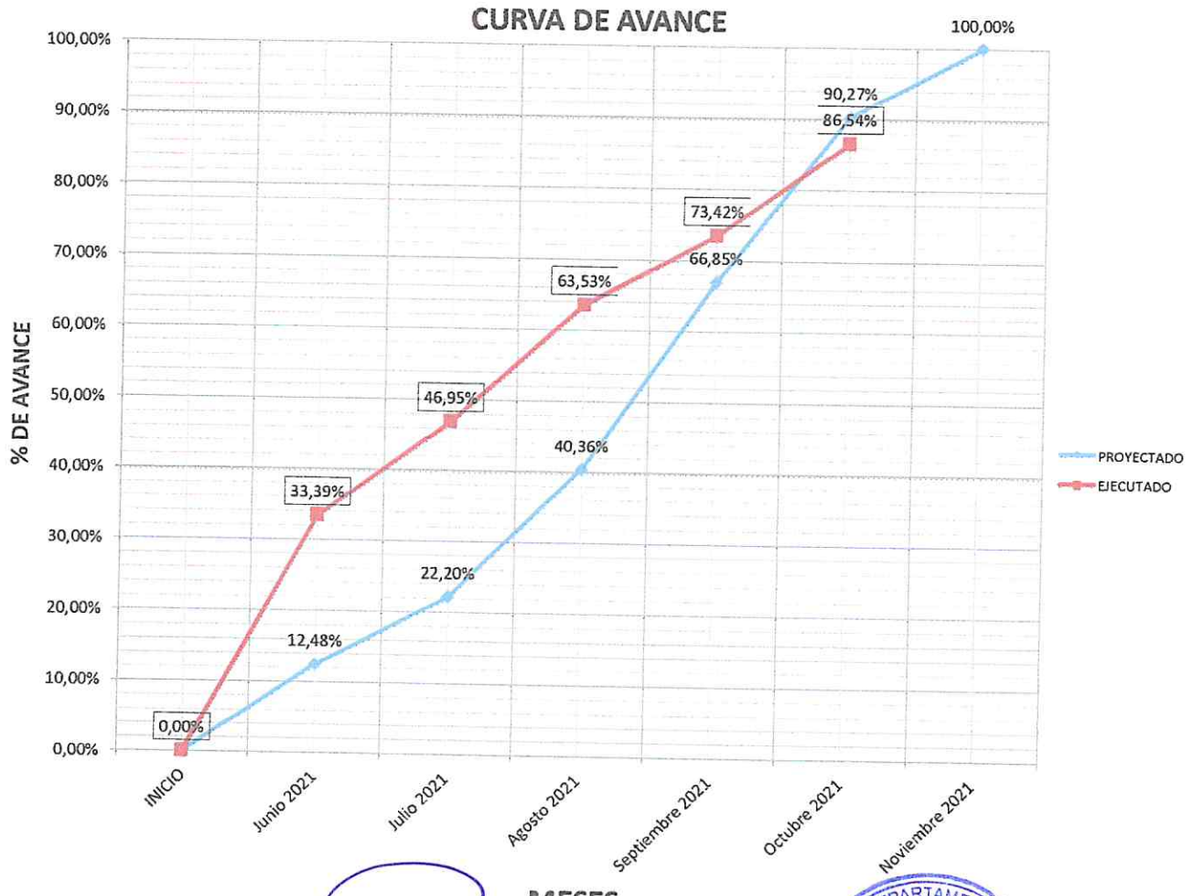

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Contratista
Alejandro Paniagua González
Representante Legal

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Gobernacion de Itapua
Fiscal de Obras
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
