FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 06 - Informe de certificado final

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 47/2023: "CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EN ARROYO PORA" - PLURIANUAL – CONTRATO N° 32/2023 - I. D. N° 437.092

OBRA: Construcción de Empedrado

BENEFICIARIO: Barrio Arroyo Pora - Cambyreta

FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona

FECHA DE VISITA: 4/mayo/2024

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Barrio Arroyo Pora	Cambyreta	98.841.130 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Noelia Ledesma – IMPACTO CONSTRUCTORA	0985-171-856	32/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
90 días	18/12/2023	17/03/2024
PRORROGA OTORGADA	**N° DE RESOLUCION**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
32 días	321/2024	18/04/2024
PRORROGA OTORGADA	**N° DE RESOLUCION**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
15 días	487/2024	03/05/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

Se ha realizado la medición de todos los rubros ejecutados por la contratista, la obra ya se encuentra concluida, faltando realizar la última compactación a cargo de la Gobernación de Itapúa.

En este momento se encuentra una solicitud de compensación de rubros pendiente de aprobación.

Se adjunta a la presente fotografías de la obra donde se observa el avance de la misma en todo su tramo.

.....

Ing. Claudio Gaona

Fiscal de Obras

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3[illegible]

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Claudi[illegible] Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC [illegible]

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 04

Mes: abril

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 47/2023 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 47/2023 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092**	100,00%	98.841.130	87,68%	86.664.512	12,32%	12.176.618	100,00%	98.841.130
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**98.841.130**	**87,68%**	**86.664.512**	12,32%	**12.176.618**	**100,00%**	**98.841.130**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	19.768.226	17.332.902	2.435.324	19.768.226
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**19.768.226**	17.332.902	**2.435.324**	**19.768.226**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				9.741.294	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**9.741.294**	

Certificado Básico Nº	**04**
Mes:	abril
Contrato N°:	32/23
Monto Básico:	₲ 98.841.130
Contratista:	Impacto Constructora -Noelia Ledesma
Fecha de Inicio:	18-dic-23
Plazo de Ejecución:	90 dias
Fecha de Terminación:	17-mar-24
Fecha term. c/ prórroga:	4-may-24

SON GUARANIES: nueve millones setecientos cuarenta y un mil doscientos noventa y cuatro.-

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
Contratista
IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Ing. Claudio Gaona
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3443

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

0985171856
impactoconstructora@gmail.com

IMPACTO CONSTRUCTORA

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO Nº 04

CONTRATO Nº 32/2023

REFERENCIA: Contratación Directa N° 47/23 contrato N° 32/23
Descripción del llamado: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL"
ID: 437.092
CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos

En la Ciudad de Cambyreta, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 4 días del mes de mayo del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Claudio Gaona Valenzuela, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y la Lic. Noelia Ledesma Ocampos, Representante legal de la Empresa Impacto Constructora, para la;

- "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL"

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes abril del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.-

---
Representante Legal

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC [illegible]

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

IMPACTO CONSTRUCTORA

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 47/2023 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 98.841.130	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	32/23	**PRÓRROGA:**	48 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	4/5/2024

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN N° 04						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 04					
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092				IMPACTO CONSTRUCTORA		Incidencia del Rubro sobre el Total	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.196.384	1.196.384	0,012	100	0	100	0,012	0,000	0,012	1	0	1	1.196.384	-	1.196.384
2	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	187,276	8.687	1.626.871	0,016	100	0	100	0,016	0,000	0,016	187,276	0	187,276	1.626.871	-	1.626.871
3	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	1.473,27	30.050	44.271.764	0,448	93,125	6,875	100	0,417	0,031	0,448	1371,98	101,29	1473,27	41.228.091	3.043.672	44.271.763
4	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1.473,27	5.698	8.394.692	0,085	100	0	100	0,085	0,000	0,085	1473,27	0	1473,27	8.394.692	-	8.394.692
5	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,12	968.013	1.084.175	0,011	0	100	100	0,000	0,011	0,011	0	1,12	1,12	-	1.084.175	1.084.175
6	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	364	79.079	28.784.756	0,291	100	0	100	0,291	0,000	0,291	364	0	364	28.784.756	-	28.784.756
7	Colocacion de hormigon armado -Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	6,35	1.711.407	10.867.434	0,110	50	50	100	0,055	0,055	0,110	3,175	3,175	6,35	5.433.717	5.433.717	10.867.434
8	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.473,27	1.775	2.615.054	0,026	0	100	100	0,000	0,026	0,026	0	1473,27	1473,27	-	2.615.054	2.615.054
				Precio Total	98.841.130	100%				87,7%	12,3%	100,0%				86.664.512	12.176.618	98.841.130

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA
IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 8 [illegible]

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

IMPACTO CONSTRUCTORA

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 47/2023 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Llc. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 98.841.130	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	32/23	**PRÓRROGA:**	48 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	4/5/2024

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092				IMPACTO CONSTRUCTORA - Noelia Ledesma		PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días			TOTAL
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.196.384	1.196.384	1.196.384			100%
2	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	183,5	8.687	1.594.065	1.594.065			100%
3	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	1.431,30	30.050	43.010.565		43.010.565		100%
4	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1.431,30	5.698	8.155.547	1.631.109	6.524.438		100%
5	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,05	968.013	1.016.414		1.016.414		100%
6	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	359	79.079	28.389.361	19.872.553	8.516.808		100%
7	Colocacion de hormigon armado - Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	7,56	1.711.407	12.938.237			12.938.237	100%
8	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.431,30	1.775	2.540.558			2.540.558	100%
					98.841.130				

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO	24.294.111	59.068.225	15.478.794	98.841.130
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO	24,58%	59,76%	15,66%	100,00%

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Claudio Osana Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3772

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

IMPACTO CONSTRUCTORA

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 47/2023 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

Contrato N°:	32/23		
Monto del Contrato: 98.841.130 gs		**Term. Prevista:**	17-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Ampliaciones:**	4-may-24
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Mes:**	abril

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 32/23

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
enero	24.294.111	24.294.111	24.294.111	24.294.111	24,58%	24,58%	24,58%	24,58%
febrero	59.068.225	83.362.336	45.166.175	69.460.286	59,76%	84,34%	45,70%	70,27%
marzo	15.478.794	98.841.130	17.204.226	86.664.512	15,66%	100,00%	17,41%	87,68%
abril			12.176.618	98.841.130			12,32%	100,00%
mayo								

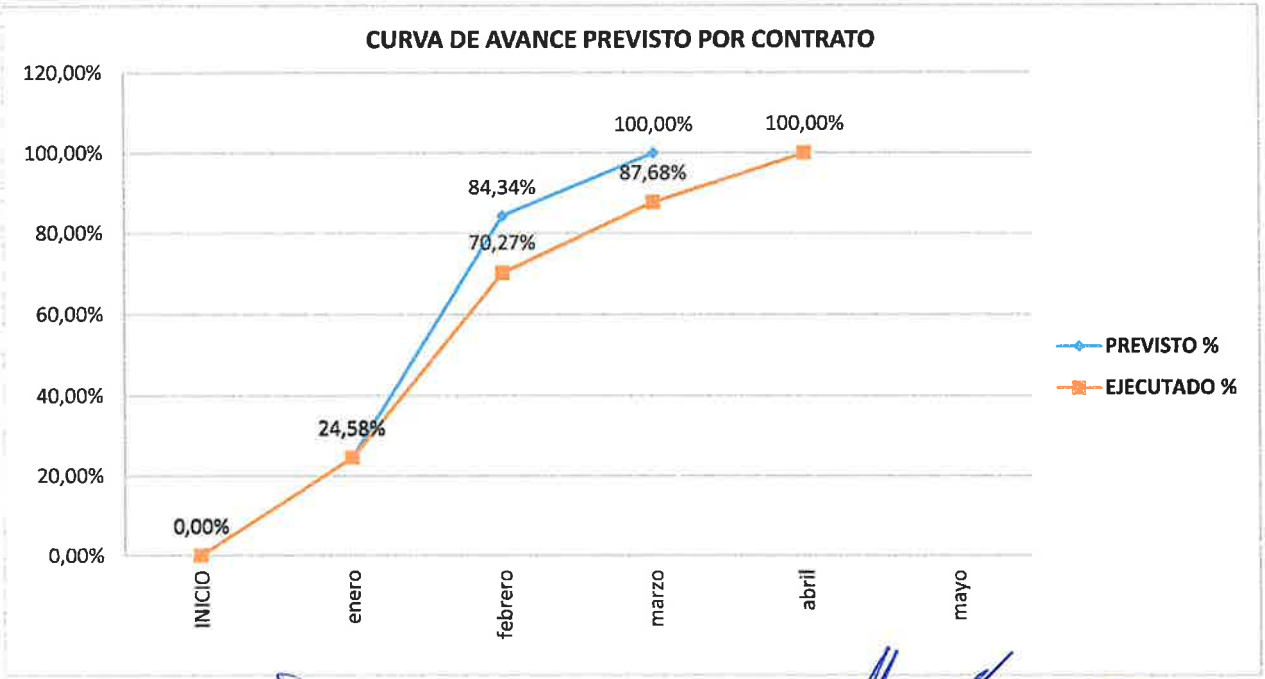

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA
IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Claudio Garcia Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3[illegible]
