GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 3

Mes: Marzo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – SOBRE EL ARROYO KA'YGUANGUE CERRITO - LOTE N° 4 - CON ID:434.738 – CONTRATO N°95/2023

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – SOBRE EL ARROYO KA'YGUANGUE CERRITO - LOTE N° 4 - CON ID:434.738 – CONTRATO N°95/2023	100%	797.778.680	40,00%	319.141.296	17,28%	137.883.072	57,29%	457.024.368
A	**Total por Contrato**	**100%**	**797.778.680**	**40,00%**	**319.141.296**	**17,28%**	**137.883.072**	**57,29%**	**457.024.368**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	159.555.736	63.828.259	27.576.614	91.404.874
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**159.555.736**	**63.828.259**	**27.576.614**	**91.404.874**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				110.306.458	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**110.306.458**	

Certificado Básico Nº	**3**
Mes:	**Marzo**
Contrato N°:	**95/2023**
Monto Básico:	**797.778.680**
Contratista:	**ARQ. JAIME BECZKO GARCIA**
Fecha de Inicio:	**22-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**240 dias**
Fecha de terminación prevista:	**18-ago-24**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

SON GUARANIES: CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03
ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Contratista-Representante Legal

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras
FISCAL DE OBRA
Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Greggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

(3)

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BÁSICO N° 3

CONTRATO N° 95/2023.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ENCARNACIÓN– SOBRE EL ARROYO KA´YGUANGUE CERRITO - LOTE N° 4 – ID: 434.738.

CONTRATISTA: ARQ. JAIME BECZKO GARCIA.

En el distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay a los 25 días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa el Ing. Carlos Amarilla, encargado de la verificación y fiscalización de la obra y el Arq. Jaime Beczko Garcia, representante técnico de la empresa para la CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – SOBRE EL ARROYO KA´YGUANGUE CERRITO - LOTE N° 4. Que suscriben la presente acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados en el mes de marzo 2024.

En la verificación realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscriben la presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicado más arriba.

Contratista

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03

GOBERNACION DE ITAPUA

Ing. Fernando Caggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

Fiscalización de Obras

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Marzo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – SOBRE EL ARROYO KA'YGUANGUE CERRITO - LOTE N° 4 - CON ID:434.738 – CONTRATO N°95/2023			
CONTRATISTA:	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	FECHA DE INICIO:	22-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	797.778.680	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	18-ago-24
CONTRATO N°:	95/2023	PRÓRROGA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	240 dias	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – SOBRE EL ARROYO KA'YGUANGUE CERRITO - LOTE N° 4 - CON ID:434.738 – CONTRATO N°95/2023							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Servicio de construcción y reparación de puentes - TRABAJOS PRELIMINARES -Movilización (Despeje e instalacion de campamento, señalizacion, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1	17.608.000	17.608.000	0,022	100,00%	0,00%	100,00%	0,022	-	0,022	1,00	0,00	1,00	17.608.000	0	17.608.000
2	Servicio de construcción y reparación de puentes - Excavación de Suelo No clasificada	Metros cúbicos	215	37.600	8.084.000	0,010	100,00%	0,00%	100,00%	0,010	-	0,010	215,00	0,00	215,00	8.084.000	0	8.084.000
3	Servicio de construcción y reparación de puentes -Excavación en Roca - Empleo de barrenos si sea necesario	Metros cúbicos	15	361.600	5.424.000	0,007	100,00%	0,00%	100,00%	0,007	-	0,007	15,00	0,00	15,00	5.424.000	0	5.424.000
4	Servicio de construcción y reparación de puentes -Vigas Riostra (VR) (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	1,73	2.653.600	4.590.728	0,006	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Servicio de construcción y reparación de puentes -Zapatas de H°A H: 60 cm - Fundacion directa (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	8,75	1.321.600	11.564.000	0,014	100,00%	0,00%	100,00%	0,014	-	0,014	8,75	0,00	8,75	11.564.000	0	11.564.000
6	Servicio de construcción y reparación de puentes -Columnas de H°A D: 75cm - Fundacion directa (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	3,53	2.586.400	9.129.992	0,011	73,09%	0,00%	73,09%	0,008	-	0,008	2,58	0,00	2,58	6.672.912	0	6.672.912
7	Servicio de construcción y reparación de puentes -Hormigon de anclaje de estribos cerrados con manto rocoso	Metros cúbicos	0,85	1.321.600	1.123.360	0,001	100,00%	0,00%	100,00%	0,001	-	0,001	0,85	0,00	0,85	1.123.360	0	1.123.360
8	Servicio de construcción y reparación de puentes- Vigas de Apoyo VA2 (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	4,46	3.196.000	14.254.160	0,018	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Servicio de construcción y reparación de puentes - Viga de Apoyo de Vigas Longitudinales V.A.	Metros cúbicos	13,86	3.196.000	44.296.560	0,056	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Servicio de construcción y reparación de puentes -Estribos cerrados de H°A (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	99,5	3.062.400	304.708.800	0,382	57,64%	22,00%	79,64%	0,220	0,084	0,304	57,35	21,89	79,24	175.632.288	67.035.936	242.668.224
11	Servicio de construcción y reparación de puentes -Baranda de H° A° - prefabricada	Metro lineal	40	395.505	15.820.200	0,020	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Servicio de construcción y reparación de puentes -Losa de H° A° e: 14 cm. (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	22,68	2.258.400	51.220.512	0,064	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Servicio de construcción y reparación de puentes -Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	29,16	4.859.200	141.694.272	0,178	50,00%	50,00%	100,00%	0,089	0,089	0,178	14,58	14,58	29,16	70.847.136	70.847.136	141.694.272
14	Servicio de construcción y reparación de puentes -Vigas Transversales (VT) in situ (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	7,32	3.832.000	28.050.240	0,035	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Servicio de construcción y reparación de puentes -Losetas de HºAº Prefabricadas 1,55x0,40 (espesor 6 cm)	Unidad	262	79.200	20.750.400	0,026	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	Servicio de construcción y reparación de puentes -Apoyos Neoprenos s/planos	Unidad	24	1.848.800	44.371.200	0,056	50,00%	0,00%	50,00%	0,028	-	0,028	12,00	0,00	12,00	22.185.600	0	22.185.600
17	Servicio de construcción y reparación de puentes -Juntas de dilatacion	Metros	16	968.800	15.500.800	0,019	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	Servicio de construcción y reparación de puentes -Drenaje detrás de muros	Metros cúbicos	31	207.200	6.423.200	0,008	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Servicio de construcción y reparación de puentes - Losa de Aproximación e: 20cm (fck: 240 kg/cm2) -	Metros cúbicos	14,44	2.258.400	32.611.296	0,041	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Servicio de construcción y reparación de puentes -Muros de P.B.C y Proteccion de Taludes	Metros cúbicos	33,44	484.000	16.184.960	0,020	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Servicio de construcción y reparación de puentes -Empastado de Taludes	Metros cuadrados	200	10.400	2.080.000	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	Servicio de construcción y reparación de puentes - Señalización Vertical	Metros cuadrados	4	572.000	2.288.000	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total					797.778.680	100%				80,08%	17,29%	57,29%				79.184.736	137.883.072	457.024.368

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.I. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03
ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Contratista-Representante Legal

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA – Fiscalización de Obras

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
MOPC N° 3.885

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Griggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Marzo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – SOBRE EL ARROYO KA´YGUANGUE CERRITO - LOTE N° 4 - CON ID:434.738 – CONTRATO N°95/2023

Contrato N°: 95/2023			
Monto del Contrato:	797.778.680	**Fecha de terminación prevista:**	18-ago-24
Plazo Contractual:	240 dias	**Prórroga:**	
Inicio de Obra:	22-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enero	32.239.360	32.239.360	49.861.168	49.861.168	4,04%	4,04%	6,25%	6,25%
Febrero	87.741.200	119.980.560	269.280.128	319.141.296	11,00%	15,04%	33,75%	40,00%
Marzo	100.542.632	220.523.192	137.883.072	457.024.368	12,60%	27,64%	17,28%	57,29%
Abril	91.412.640	311.935.832			11,46%	39,10%		
Mayo	102.468.762	414.404.594			12,84%	51,94%		
Junio	105.564.997	519.969.590			13,23%	65,18%		
Julio	121.779.034	641.748.624			15,26%	80,44%		
Agosto	156.030.056	797.778.680			19,56%	100,00%		

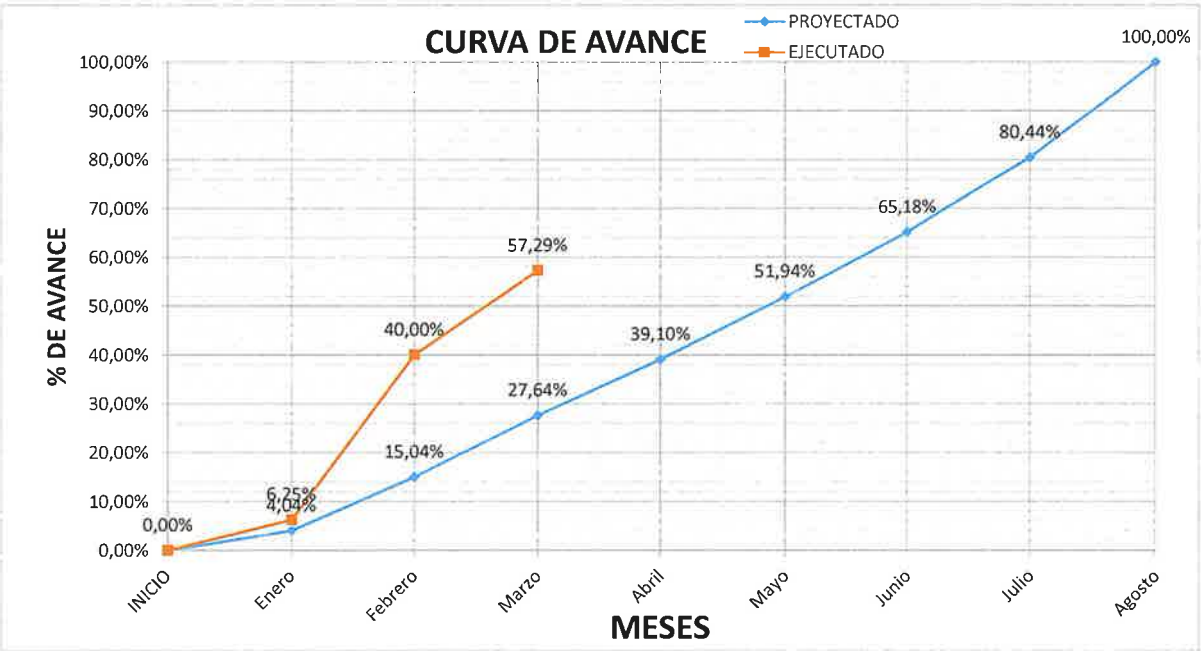

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Contratista-Representante Legal
Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Gobernación de Itapúa
Ing. [illegible]
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.0

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Marzo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – SOBRE EL ARROYO KA´YGUANGUE CERRITO - LOTE N° 4 - CON ID:434.738 – CONTRATO N°95/2023			
CONTRATISTA:	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	FECHA DE INICIO:	22-dic-23
MONTO DE LA OFERTA GS:	797.778.680	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	18-ago-24
CONTRATO N°:	95/2023	PRORROGA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	240 dias	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – SOBRE EL ARROYO KA´YGUANGUE CERRITO - LOTE N° 4 - CON ID:434.738 – CONTRATO N°95/2023						PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
1	Construcción de empedrado													
1	Servicio de construcción y reparación de puentes - TRABAJOS PRELIMINARES -Movillzación (Despeje e instalacion de campamento, señalizacion, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1	17.608.000	17.608.000	17.608.000								2,21%
2	Servicio de construcción y reparación de puentes - Excavación de Suelo No clasificada	Metros cúbicos	215	37.600	8.084.000	8.084.000								1,01%
3	Servicio de construcción y reparación de puentes -Excavación en Roca - Empleo de barrenos si sea necesario	Metros cúbicos	15	361.600	5.424.000	5.424.000								0,68%
4	Servicio de construcción y reparación de puentes -Vigas Riostra (VR) (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	1,73	2.653.600	4.590.728						4.590.728			0,58%
5	Servicio de construcción y reparación de puentes -Zapatas de H°A H: 60 cm - Fundacion directa (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	8,75	1.321.600	11.564.000		11.564.000							1,45%
6	Servicio de construcción y reparación de puentes -Columnas de H°A D: 75cm - Fundacion directa (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	3,53	2.586.400	9.129.992			9.129.992						1,14%
7	Servicio de construcción y reparación de puentes -Hormigon de anclaje de estribos cerrados con manto rocoso	Metros cúbicos	0,85	1.321.600	1.123.360	1.123.360								0,14%
8	Servicio de construcción y reparación de puentes- Vigas de Apoyo VA2 (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	4,46	3.196.000	14.254.160					14.254.160				1,79%
9	Servicio de construcción y reparación de puentes - Viga de Apoyo de Vigas Longitudinales V.A	Metros cúbicos	13,86	3.196.000	44.296.560						44.296.560			5,55%
10	Servicio de construcción y reparación de puentes -Estribos cerrados de H°A (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	99,5	3.062.400	304.708.800		76.177.200	91.412.640	91.412.640	45.706.320				38,19%
11	Servicio de construcción y reparación de puentes -Baranda de H° A° - prefabricada	Metro lineal	40	395.505	15.820.200								15.820.200	1,98%
12	Servicio de construcción y reparación de puentes -Losa de H° A° e: 14 cm. (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	22,68	2.258.400	51.220.512							51.220.512		6,42%
13	Servicio de construcción y reparación de puentes -Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	29,16	4.859.200	141.694.272					42.508.282	56.677.709	42.508.282		17,76%
14	Servicio de construcción y reparación de puentes -Vigas Transversales (VT) in situ (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	7,32	3.832.000	28.050.240							28.050.240		3,52%
15	Servicio de construcción y reparación de puentes -Losetas de HºAº Prefabricadas 1.55x0.40 (espesor 6 cm)	Unidad	262	79.200	20.750.400								20.750.400	2,60%
16	Servicio de construcción y reparación de puentes -Apoyos Neoprenos s/planos	Unidad	24	1.848.800	44.371.200								44.371.200	5,56%
17	Servicio de construcción y reparación de puentes -Juntas de dilatacion	Metros	16	968.800	15.500.800								15.500.800	1,94%
18	Servicio de construcción y reparación de puentes -Drenaje detrás de muros	Metros cúbicos	31	207.200	6.423.200								6.423.200	0,81%
19	Servicio de construcción y reparación de puentes - Losa de Aproximación e: 20cm (fck: 240 kg/cm2) -	Metros cúbicos	14,44	2.258.400	32.611.296								32.611.296	4,09%
20	Servicio de construcción y reparación de puentes -Muros de P.B.C y Proteccion de Taludes	Metros cúbicos	33,44	484.000	16.184.960								16.184.960	2,03%
21	Servicio de construcción y reparación de puentes -Empastado de Taludes	Metros cuadrados	200	10.400	2.080.000								2.080.000	0,26%
22	Servicio de construcción y reparación de puentes -Señalización Vertical	Metros cuadrados	4	572.000	2.288.000								2.288.000	0,29%
Total					797.778.680									100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						32.239.360	87.741.200	100.542.632	91.412.640	102.468.762	105.564.497	121.778.034	156.030.055	797.778.680
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						4,04%	11,00%	12,60%	11,46%	12,84%	13,23%	15,26%	19,56%	100%

Arq. Jaime Beczko Garcia
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.I. 1053
Reg. AB-SG. N°: 164/03
ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Contratista-Representante Legal

Fiscalización de Obras

Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

INFORME DE OBRAS – CERTIFICADO NRO 3

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – SOBRE EL ARROYO KA´YGUANGUE CERRITO - LOTE N° 4

EMPRESA CONTRATISTA:	Nº DE TELÉFONO:	Nº CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	0985 - 777880	95/2023	22-12-2023
MODALIDAD / LOTE:	**PLAZO CONTRACTUAL:**	**MONTO DEL CONTRATO:**	**TERMINACIÓN PREVISTA:**
LPN Nº 05/2023	240DÍAS	797.778.860 Gs.	18-08-2023.

Fiscal a Cargo: Secretaria de Obras Públicas.

Fecha de Visita: 25 marzo del 2024

Avance de Obra: 57.29%

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra posee un buen avance con relación a su cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance previsto.

Cuenta con las materiales in situ y necesarios para su continuidad, además de los equipos y herramientas menores.

Se anexa registro fotográfico de avances.

Fiscalización de Obras

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
RUC: 80009721-1

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
09721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3.885

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
